### 第2回日足地区等フォローアップ部会の開催状況について 資料1-3

1. 開催日

日 時: 令和2年 5 月 28 日(木) 書面開催

2. 部会の出席者

会長:近畿地方整備局 河川部 中川地域河川調整官

委員:三重県 県土整備部 河川課 友田課長

和歌山県 県土整備部 河川・下水道局 河川課 宗課長

3. 議事に対する意見

(1)各機関の取り組み状況の報告

各地区の工事の進捗状況について、前回部会時から遅延することなく完了する予定であることを確認した。

◆日足地区宅地嵩上 : 令和3年出水期までに完了予定

◆田長地区河道掘削 : 令和1年度完了

◆和気地区河道掘削 : 令和2年度完了予定

(2)今後の部会の進め方

次回は令和3年4月頃に開催し、各機関の事業進捗状況(完了および完了目途)を報告する予定。

(3)その他 特になし。

## 日足地区等フォローアップ部会報告

令和2年6月

### 日足地区等フォローアップ部会について

- 〇「熊野川の総合的な治水対策協議会」の部会として、平成31年3月25日に設立、第一回部会開催
- 〇日足地区等の対策を早期に完了させるため、国・三重県・和歌山県が連携を図りながら、事業進捗の確認 や情報共有などのフォローアップを標準年1回の頻度で実施

#### 熊野川の総合的な治水対策協議会

(目的)

熊野川の一環した総合的な治水対策の推進

(構成員)

近畿地方整備局

三重県

• 奈良県

• 和歌山県

• 関西電力(株)

• 電源開発㈱西日本支店

·沿川自治体(11市町村)

河川部長

紀南河川国道事務所長

紀の川ダム統合管理事務所長

紀伊山系砂防事務所長

県土整備部長

県土マネジメント部長

県土整備部長

水力事業本部副事業本部長

支店長

天川村長、五條市長、野迫川村長

十津川村長、田辺市長、新宮市長

熊野市長、紀宝町長、上北山村長

下北山村長、北山村長

#### 日足地区等フォローアップ部会

#### (目的)

近畿地方整備局、三重県、和歌山県が緊密な連携を 図りながら、平成30年台風第20号などの被害を踏ま えた日足地区の輪中堤、田長地区及び和気地区の河 道掘削を推進し、早期に事業完成を図ることを目的 とする。

#### (構成員)

- 近畿地方整備局 河川部 地域河川調整官
- •三重県 県土整備部 河川課長
- •和歌山県 県土整備部 河川・下水道局 河川課長

- 〇第16回熊野川の総合的な治水対策協議会(平成30年11月30日開催)において、 部会の設置を確認。
- 〇平成31年3月25日に第1回フォローアップ部会を開催。
  - ◆部会長 近畿地方整備局 河川部 地域河川調整官
  - ◆委 員 和歌山県 県土整備部 河川・下水道局 河川課長
  - ◆委 員 三重県 県土整備部 河川課長
- 〇第1回部会では、現在までの事業進捗状況や課題を共有・確認し、部会内で引き続き、 進捗状況のフォローアップや課題解消に向けた取組について検討を進めることを確認。
- 〇第1回部会以降、事業者(和歌山県・三重県)において、平成30年度補正予算を踏まえ、工程等の精査を行ったところ、事業の1年程度の前倒しが見込まれる。


ひたり たなご わけ

- 〇日足地区・田長地区(和歌山県)・和気地区(三重県)における今後の予定
  - ◆日足地区宅地嵩上 : 平成33年度(令和3年度)完了 → 令和3年出水期までに完了予定
  - ◆田長地区河道掘削 :平成32年度(令和2年度)完了 → 令和1年度完了
  - ◆和気地区河道掘削 :平成33年度(令和3年度)完了 → 令和2年度完了予定
- 〇引き続き、部会を定期的に開催し、課題の解決に取り組むとともに事業進捗状況の確認を行う。

# 日足地区等における近年の被害状況と対策について

- 〇日足地区ではH26~H30の5ヶ年で、4度の家屋浸水被害が発生



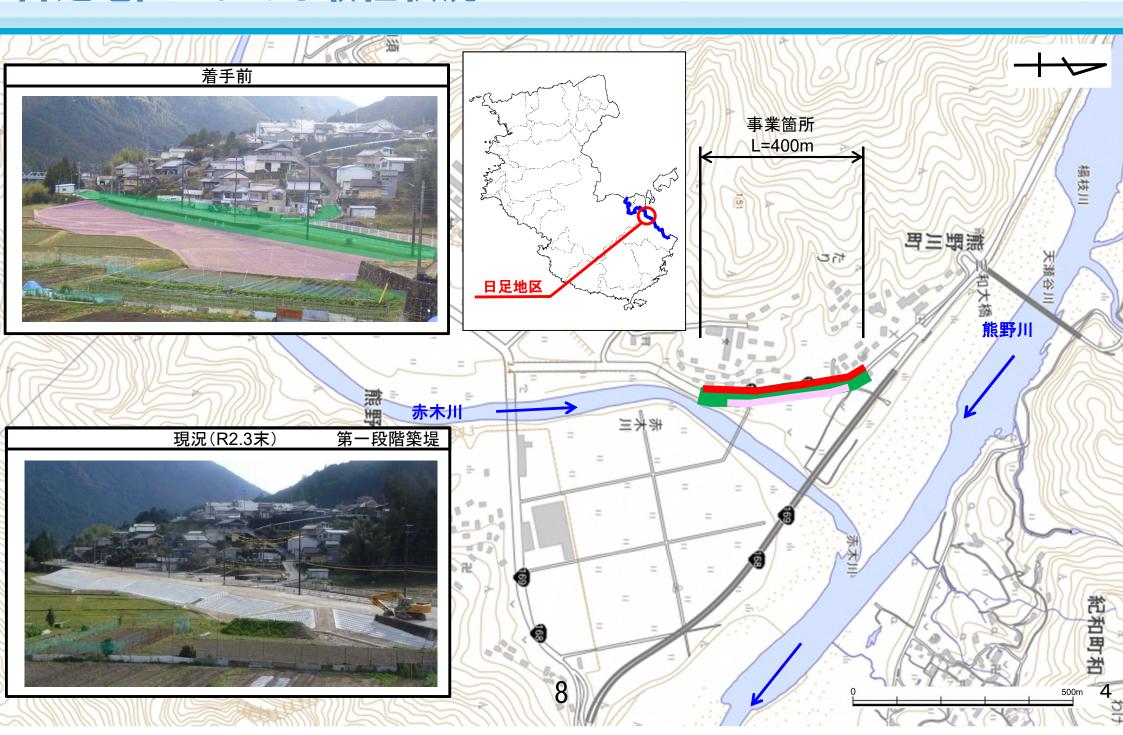

## 日足地区の今後のスケジュール


上段:計画工程(H30補正後)

下段·宝施工程


													下权. 天心工性						
年度		Н30	年度			R14	年度			R24	年度		R3年度						
四半期	第1	第2	第3	第4	第1	第2	第3	第4	第1	第2	第3	第4	第1	第2	第3	第4			
〇用地買収						家	屋撤去完	7											
○家屋移転、支障物件移転						家屋	移転	J		電柱·地 <sup>-</sup>	下埋移設								
○築堤、道路工、仮設工						第1段階 第 <b>1段階</b>	E I		2段階			第3段階 <b>3段階</b>		←前倒し	,期間	<b></b>			
○家屋再建									仮記	设道路切替				$\Rightarrow$					

※スケジュールについては、予算状況及び残土処分地の調整等により変更が生じる場合があります。

標準断面図

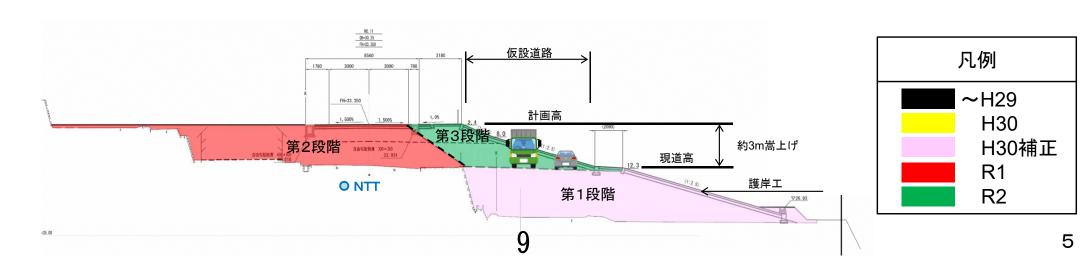

# 世長地区における取組状況

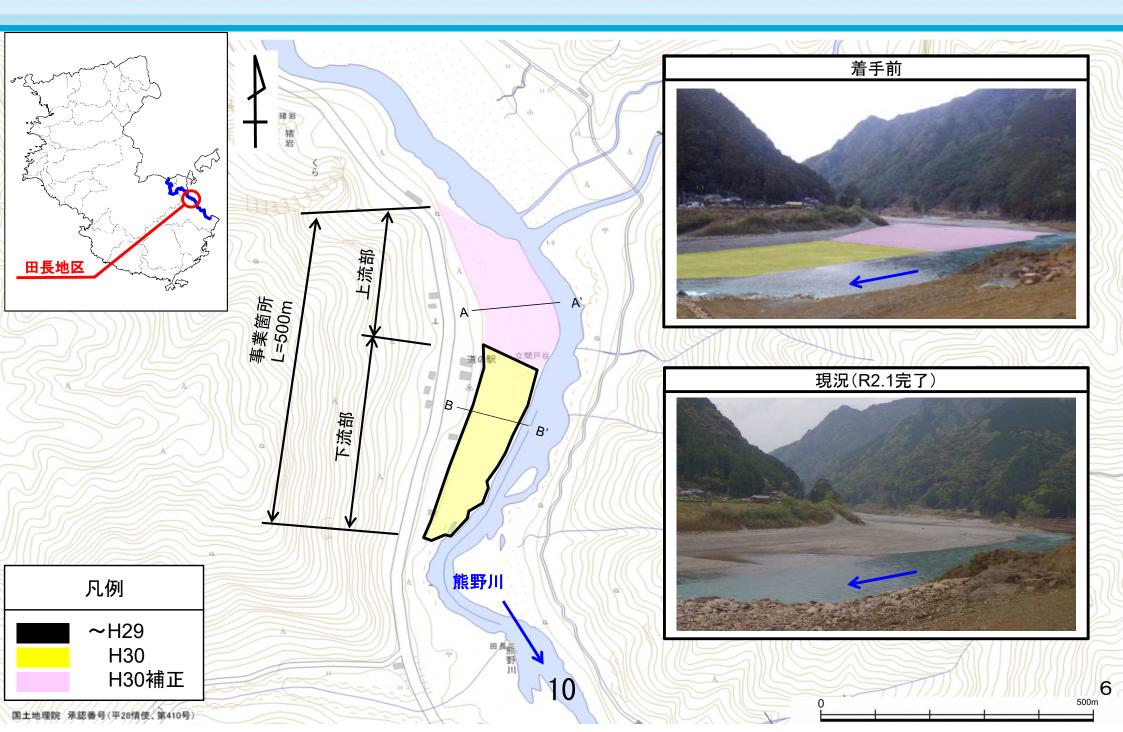


# たなご 田長地区の今後のスケジュール

上段:計画工程(H30補正後)

下段:実施工程

年度	年度 H29年度					Н30	年度			R14	丰度		R2年度			
四半期	第1	第2	第3	第4	第1	第2	第3	第4	第1	第2	第3	第4	第1	第2	第3	第4
	河道掘削		(22	,000m3)		(10	.000m3)			18,000m	3)	<b>—</b>	前個	儿期間		
			(22,000m3)		L	(10,000m				18,000m						
						- 115 500 70	2=1		u = = =							

※スケジュールについては、予算状況及び残土処分地の調整等により変更が生じる場合があります。

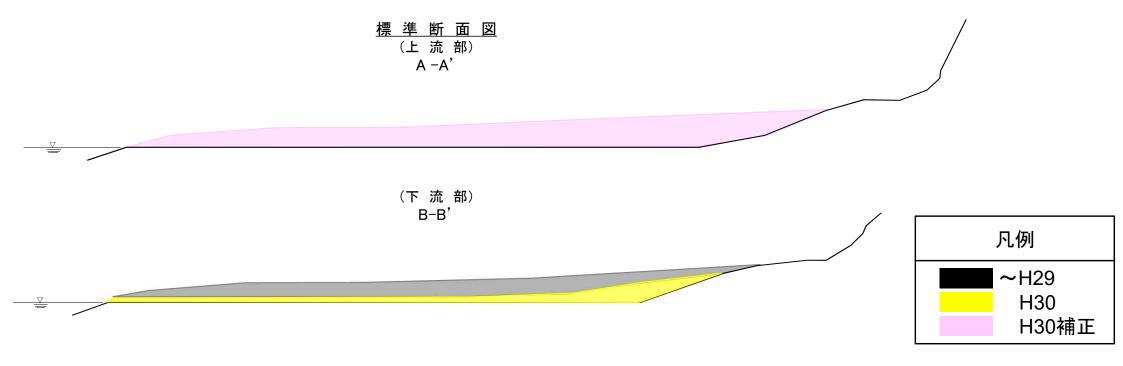

## 三重県(和気地区)における取組状況




## 三重県(和気地区)の今後のスケジュール

上段:計画工程(H30補正後)


													下段:	実施工和	呈	
年度		Н30	年度		R1年度					R24	年度		R3年度			
四半期	第1	第2	第3	第4	第1	第2	第3	第4	第1	第2	第3	第4	第1	第2	第3	第4
〇H29河道掘削工事	(6	,000m3)														
	(V≐	9,000r	m3)													
〇H30河道掘削工事				(1	3,000m3	)										
				(V <i>≒</i> ′	<mark>16,000</mark> r											
〇H30補正河道掘削工事						(10,0	00m3)									
OH30/補正河追掘削工 <del>事</del>					(	V≒28,	000m3	)								
OR1河道掘削工事						ı	(1	5,000m	3)		<u> </u>	、				
○111月 追加的工事								(	V <b>≒</b> 18,							
〇R2河道掘削工事								1			3,000m3					
○12月 垣福州工事								<u> </u>	<u> </u>		(V≒4,0	000m3)				
OR3河道掘削工事													前	<mark>倒し期間</mark> (0m3)		
														(dillo)		

※スケジュールについては、予算状況及び残土処分地の調整等により変更が生じる場合があります。 ※R1R2工事は一括で発注(上記スケジュール破線の囲み)しておりR2年度完成予定です。





①着手前(下流より撮影) 0~+650

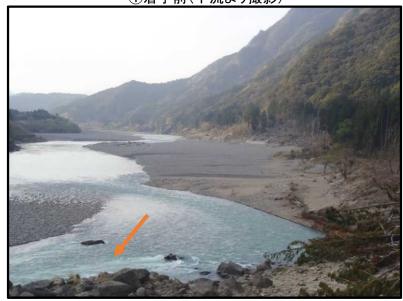

②現在の状況 上流端部(下流側から撮影) +550~+650付近



③現在の状況 下流部(下流側から撮影) +225~+250付近



### 今後の部会の進め方について

- ○第1回 日足地区等フォローアップ部会 (平成31年3月25日)
  - 規約について
  - 各機関の取組状況の報告
  - ・今後の部会の進め方

### 今回



- ○第2回 日足地区等フォローアップ部会 (令和2年5月28日)
  - 各機関の事業進捗状況の報告
  - •その他



- ○第3回 日足地区等フォローアップ部会 (令和3年4月頃)
  - ・各機関の事業進捗状況(完了および完了目途)の報告
  - •その他
