

大津信楽線付替工事ニュース

令和元年12月18日



パソコンは
QRコードを読み
込み大戸川工
事事務所HPへ

工事名：大津信楽線左岸部道路改良その他工事
当初工期：平成30年3月29日～平成31年2月28日
変更工期：～令和元年12月26日



工事進捗

11月は、本工事メイン作業のアーチカルバート設置が完了しました。
220t オールクレーンという大きな建設機械を使用しての設置作業を行いました。



設置状況



設置完了

現場代理人から一言

当工事の残り作業は補強土壁工のみとなりました。
安全に少しでも早く工事が完了できるように努力します！！

現場代理人
森田 圭一



大津信楽線付替工事ニュース

令和元年12月18日



バックナンバーは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津信楽線桐生地区道路改良その他工事
工期：平成30年12月28日～令和元年11月30日

12月



「大津信楽線桐生地区道路改良その他工事」は、工事を完成しました。

関係各所及び同工事沿線各社のおかげと協力をもちまして無事故無災害で工事完成できました。
有難うございました。

当初伐木後と完成現況



寒さも厳しく
なりました。
風邪やインフル
エンザに気を
付けてね。

最後になり
ましたが、
一路邁進！
御安全に！



株式会社 内田組

【現場事務所】
【電話】
【FAX】

滋賀県大津市上田上桐生町地先
077-549-3911
077-549-3911



大津信楽線付替工事ニュース

令和元年12月18日




バックナンバーはQRコードを読み込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新4号橋下部その他工事

工期：令和元年6月25日～令和2年3月20日

【付替県道 新4号橋の橋台を2基と場所打擁壁（L型擁壁）を施工します。】

12月

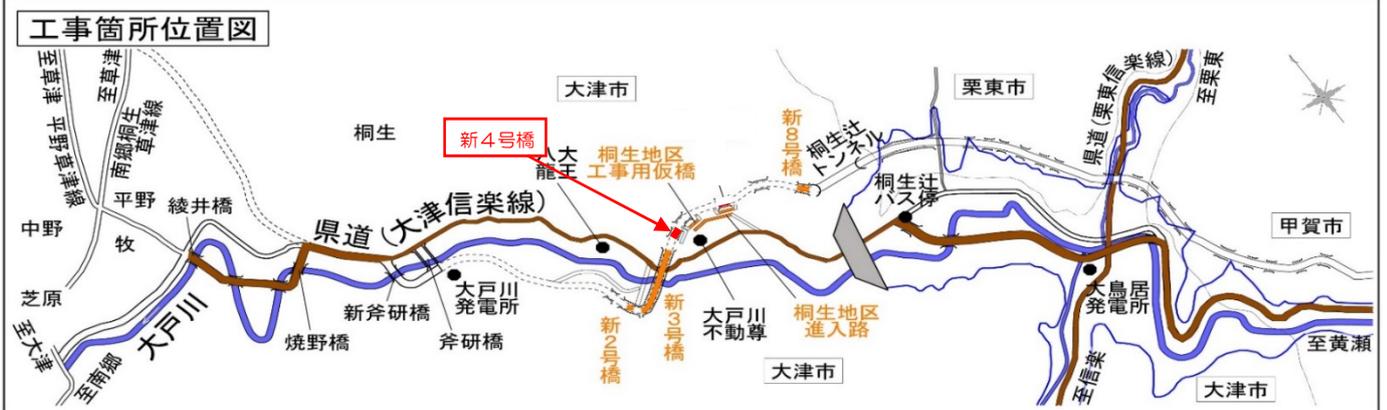

現場位置図



【工事の進捗】 A1橋台の躯体工を施工しています。【今後の予定】 A2橋台の土留・仮締切と床掘を施工しています。


A1橋台 深礎工 完了

作業状況

外径φ2500mm、深さ3.5mの深礎杭の鉄筋の組立とコンクリートの打設が完了しました。



鉄筋組立 状況



鉄筋組立 完了



コンクリート打設 状況



コンクリート打設 完了

A2橋台 床掘・土留

現在は床掘、土留（木矢板設置、除去式アンカー）を行い、深く掘り下げています。地中の転石（硬岩）が多く、床掘時はセリ矢により転石を破碎・撤去しながら施工し、除去式アンカーは大型削孔機に変更し施工スピードアップを図っています。



2段目 除去式アンカー状況



2段目 床掘状況



2段目 床掘状況



3段目 床掘状況

現場代理人のコメント

12月に入り日も落ちるのが早くなり寒さの厳しい時期となってきました。体調管理を心掛け、安全第一で作業をしています。工事へのご理解、ご協力を引き続き頂きますようお願い致します。

請負者：西村建設株式会社
現場代理人：森本 順
携帯電話：080-9302-8898

現場事務所：大津市上田上桐生町地先
事務所TEL：077-549-0100

西村建設株式会社
NISHIMURA CONSTRUCTION CO., LTD.

大津信楽線付替工事ニュース


令和元年12月18日



バックナンバーはQRコードを読み込み大戸川ダム工事事務所HPへ



工事名：大津信楽線左岸下流部道路改良その他工事
工期：令和元年8月31日～令和2年3月10日

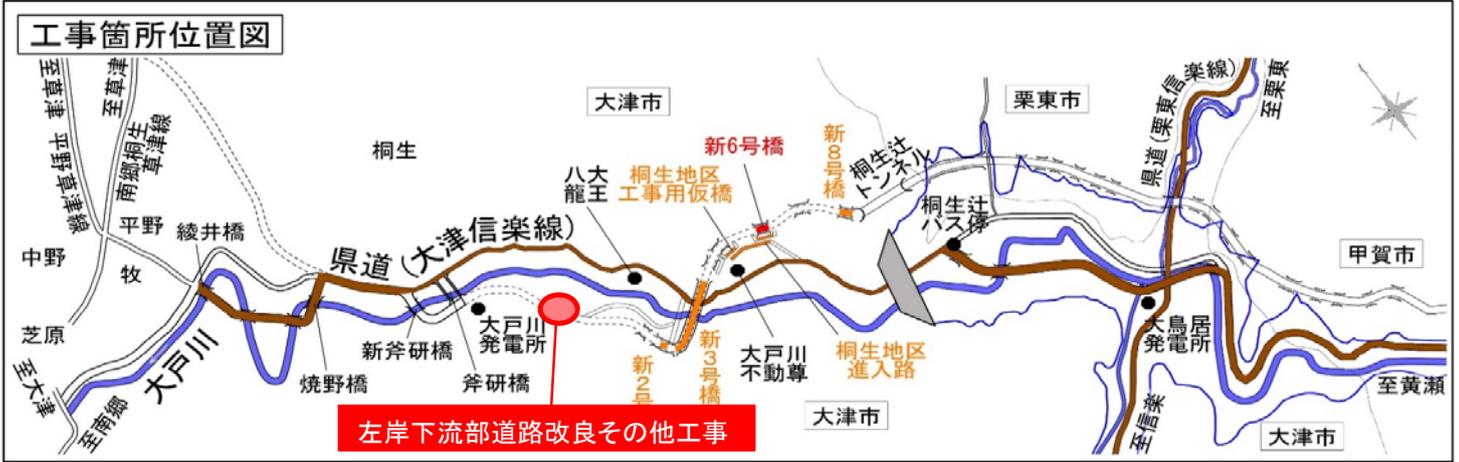

【現在の作業】2号補強土壁－掘削完了・地盤改良を着工します。1号補強土壁－年内は河川の仮締切を行います。
【今後の予定】2号補強土壁－年始より床付け・基礎コンクリート打設、1号補強土壁－年始より掘削を開始します。

工事用道路の施工状況

現場代理人のコメント



現場は転石が多く、掘削が難航しましたが、2号補強土壁部は地盤改良に着手します。師走に入り、慌ただしくなりますが、安全第一に進めてまいります。

現場代理人
米田 剛



Onyama (株) 大山建設

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上牧町地先
077-549-2587
077-549-2588

大津信楽線付替工事ニュース


令和元年12月18日



パケットはQRコードを読み込み大戸川ダム工事事務所HPへ

12月

工事名：大津信楽線新5号橋・新6号橋間他道路改良その他工事
工期：令和元年10月17日～令和3年2月28日

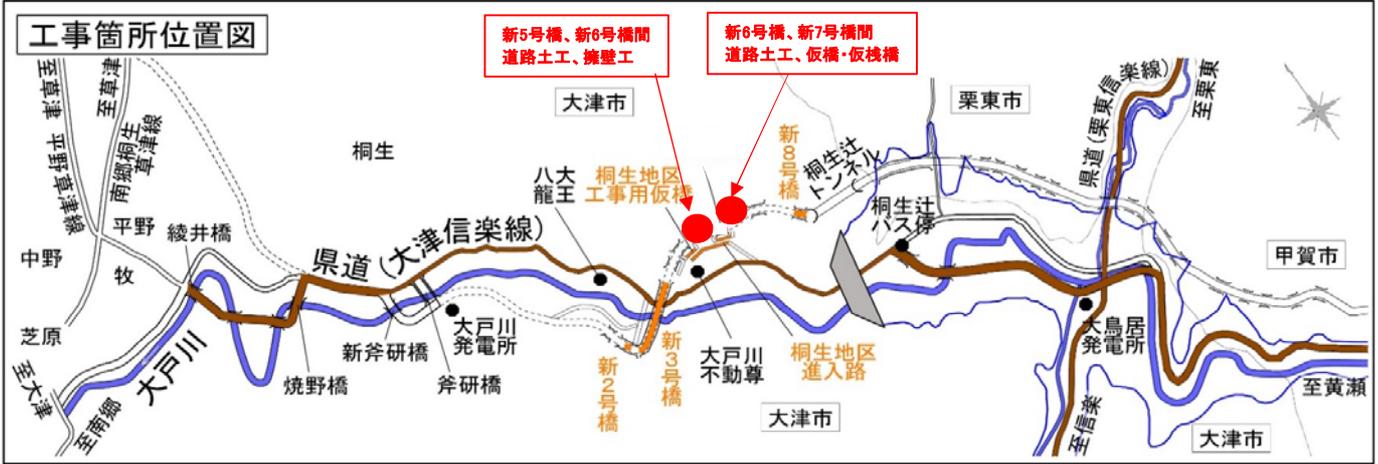

現場位置



工事進捗

現在伐採する範囲の測量を行い伐採する立木調査を行っています。



今後予定


伐採作業に入り、120tクローラークレーンを組み立て掘削作業の重機を搬入し本格作業に入ります。

監理技術者より一言

今まで準備作業でしたが、いよいよ本格的な工事に入ります。今後大型車両の出入りがありますが、一般車両最優先で運行管理を行います。今後とも工事へのご理解、ご協力をお願い致します。

監理技術者 秋村 智詩

松尾建設株式会社



【現場事務所】
【電話】
【FAX】

滋賀県大津市上田上桐生町地先
077-549-1070
077-549-1075
