

国道163号 精華拡幅 工事ニュース

平成30年2月 第5号

国土交通省 京都国道事務所です。

精華拡幅事業におきまして、昨年度に引き続き乾谷地区において工事を進め、さらに山田地区においても工事に着手し現在工事を進めています。

乾谷地区においては、「精華拡幅乾谷地区改良工事」、「精華拡幅乾谷地区橋梁下部他工事」が来月3月末までとなっており、来年度の工事に向けて工事の準備をしているところでございます。

今年度は山田地区において、「精華拡幅山田川橋下部他工事」「精華拡幅山田喜殿脇地区改良他工事」を進めて下ります。山田地区においては、いずれも来年度まで工期が有り、山田川に架かる橋梁等の工事を進めております。

工事の期間中は色々ご不便等お掛けしますが、引き続き地域の皆様のご協力を賜りますようお願い申し上げます。




完成箇所写真(精華拡幅乾谷高架橋橋梁下部他工事)





工事平面図

乾谷地区

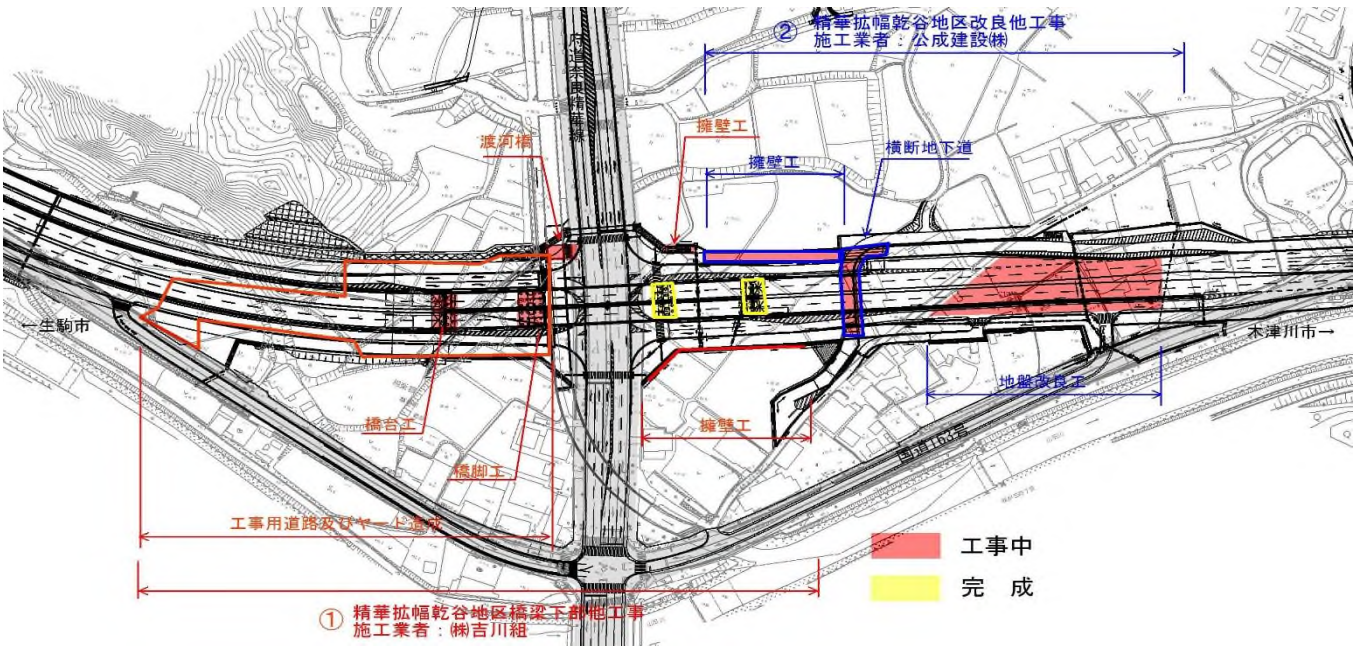

山田地区

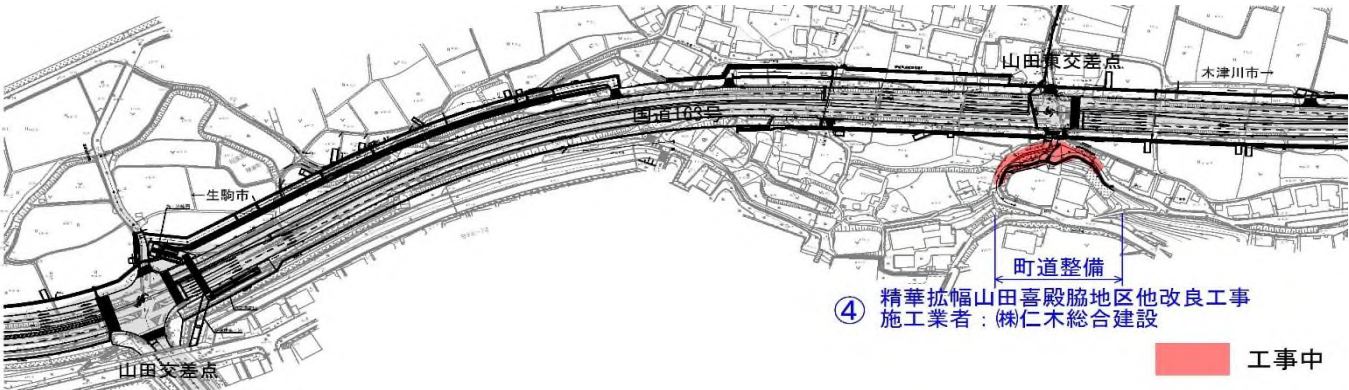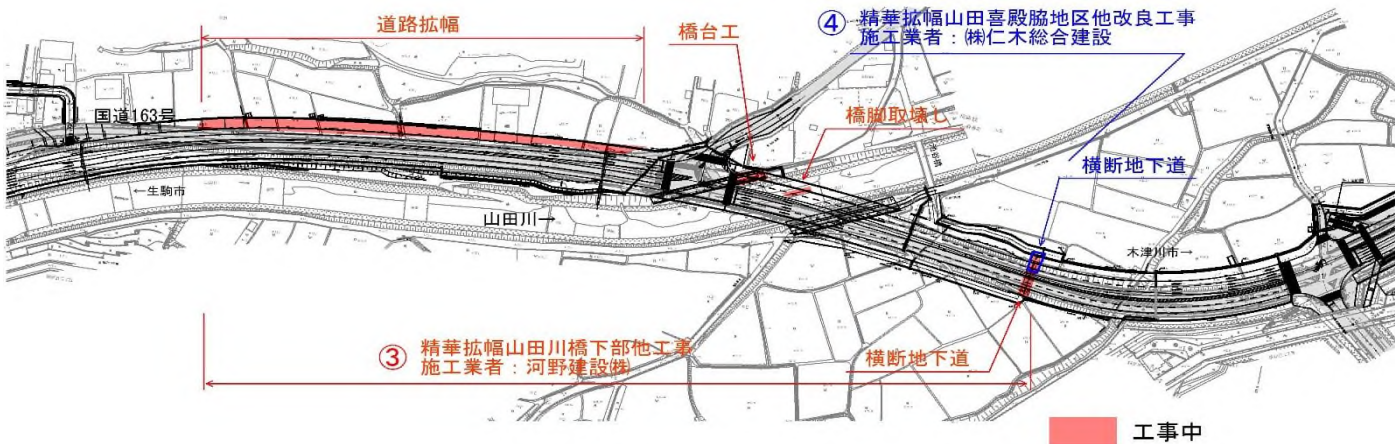

① 工事名：精華拡幅乾谷地区橋梁下部他工事

☆奈良精華線の西側で工事用道路と施工ヤードを造り、橋の脚(橋台3基、橋脚2基)を造る工事です☆

工事進捗率 88.8% 平成30年01月31日現在

工事の概要・・・橋台工 1 式 (3 基) ・ R C 橋脚工 1 式 (2 基) ・ コンクリート橋工 1 式
道路土工 1 式 (掘削10,000m³・路体盛土600m³)
地盤改良工 1 式 ・ 擁壁工 1 式 ・ 構造物撤去工 1 式 ・ 仮設工 1 式

工 期・・・平成29年03月02日 ～ 平成30年03月30日 (工期変更しました)

工事の状況・・・今現在、橋台工と橋脚工の本体構造物の施工と、その他の追加工事の施工を今年度3月末の工事完成に向けて、日々安全作業を進めております。また、1月24日に大阪市立大和川中学校とインターネット中継による『在学型現場見学会』を開催しました。生徒が教室に居ながら現場見学ができる新しい見学会に、当社としても貴重な体験をさせて頂くことができ、大変勉強になりました。本当に有難うございました。

当工事進捗状況写真



掘削前の準備作業状況(平成29年06月末ごろ)




場所打杭作業状況(平成29年09月末ごろ)



本体構造物作業状況(平成30年01月25日)

在学型現場見学会 [平成30年01月24日開催]

現場からの中継映像(中学校教室)

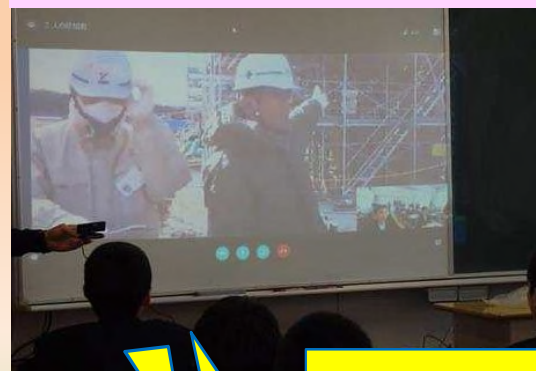

インターネット中継による
現場説明と質疑応答



タブレットによる現場での中継(撮影)状況

当工事を担当する現場代理人の
田堀です。
近隣住民様のご理解・ご協力を得
ながら、残り約2ヵ月、安全第一に
無事故無災害での完工をめざしま
すので、よろしくお願いします。

株式会社 吉川組
現場代理人：田堀 孝明



《お問い合わせ先》

 京都国道事務所 建設監督官 宮本 TEL：075-313-0009

 (株)吉川組 精華拡幅乾谷2工事事務所 TEL：0774-66-3688

② 工事名:精華拡幅乾谷地区改良他工事

(カルバート工【町道乾谷・三本木線の付替え】・擁壁工と、地盤改良等を施工する工事です)

工事進捗率 88.2% 平成30年1月31日現在


工事概要

地盤改良工 1 式, 擁壁工 1 式, カルバート工(乾谷・三本木線) 1 式
排水構造物工 1 式, 構造物撤去工 1 式, 仮設工 1 式

工期

平成29年3月8日 ~ 平成30年3月30日

平面図

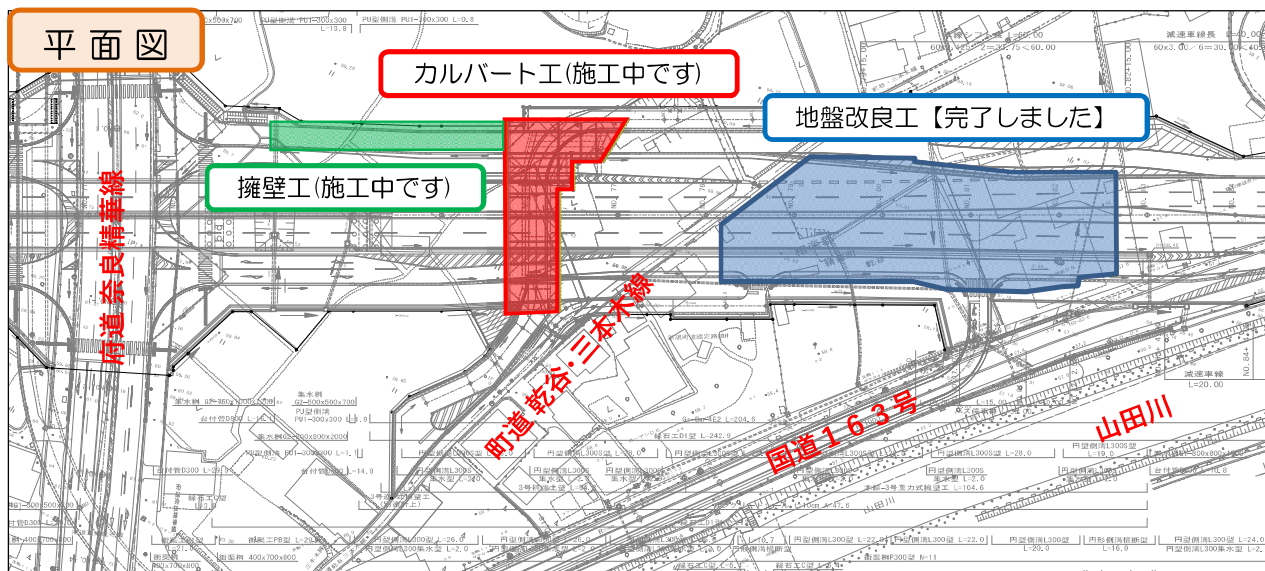

カルバート工(乾谷・三本木線)
コンクリート打設状況



内部の状況



監理技術者から

現在の工事の状況です



カルバート工はコンクリート打設が完了し、埋戻し・鋼矢板(土留)撤去を残すのみとなりました。完了後に擁壁工・排水構造物工の施工に取り掛かっていきます。

近隣及び地域の皆様にはご迷惑をおかけしますが、工事の安全施工に努めますので、3月末の工期までよろしくお願い致します。

《問い合わせ先》

京都国道事務所 建設監督官 宮本
公成建設現場事務所

TEL:075-313-0009
TEL:0774-39-8810

③ 工事名:精華拡幅山田川橋下部他工事

国道163号北側の歩道拡幅と山田川橋架け替えに伴う橋梁下部工事です。

工事進捗率 6.8 % 平成30年1月31日現在

工事概要

橋台工 1基	構造物撤去工 1式	道路土工 1式
擁壁工 1式	排水構造物工 1式	舗装工 1式
仮設工 1式	縁石工 1式	函渠工 1式

工期

平成29年 8月 22日 ～ 平成31年 3月下旬(予定)


工事説明

本工事は精華町山田地区において、1工区では歩道拡幅の工事を行います。
2工区では山田川橋北側左岸で既設橋台を取壊した後、新たに橋台を構築します。
また、山田川河川内の既設橋脚の取壊しを行います。
3工区ではボックスカルバート(南側)の施工をします。

全体平面図



2工区平面図

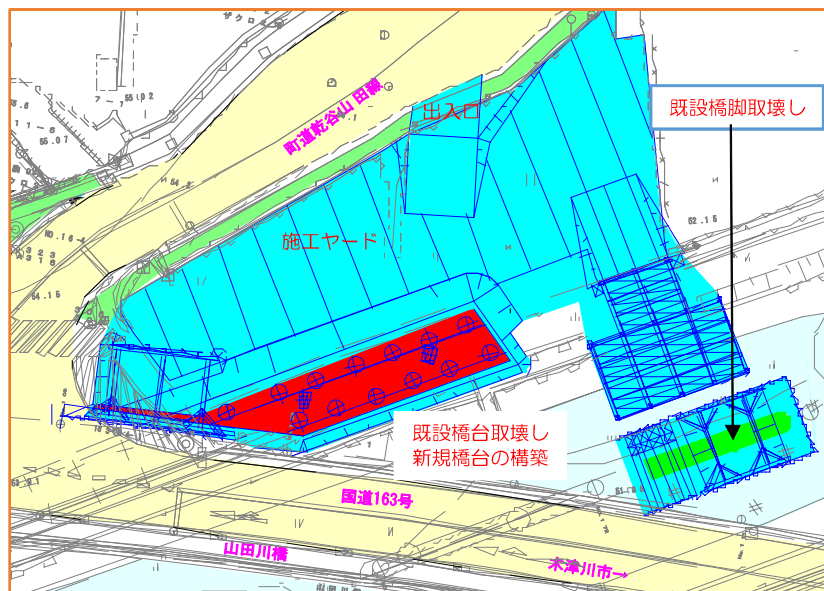

現場代理人から一言

現場代理人の平川です。
去年の11月から施工をしています。
住民の皆様へはご迷惑をおかけしますが、
安全施工に努めますので、ご理解とご協力を
よろしくお願い致します。



(株)河野建設
平川 哲也

《問い合わせ先》

京都国道事務所 建設監督官 宮本

TEL: 075-313-0009

河野建設現場事務所

TEL: 0774-73-2512

④ 工事名：精華拡幅山田喜殿脇地区他改良工事

<①国道163号の切り回しを行い横断地下道（北側半分）を設置する工事です>

<②山田東交差点南側にて国道163号拡幅に先立ち擁壁を造る工事です>

工事進捗率 14% 平成30年1月31日現在

工事概要

道路土工1式（掘削及び盛土）、擁壁工1式、場所打函渠工1式
排水構造物工1式、防護柵工1式、道路付属物工1式、舗装工1式
区画線工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式

工期

平成29年8月22日 ～ 平成30年11月30日（予定）


工事説明

①山田川橋東詰めから東へ約100m付近にて横断地下道の北側半分を設置する工事です。初めに国道163号線を南へ切り回しを行い横断地下道の北側半分の築造を行い再度、国道163号線を北側へ切り回しを行い工事は完了です。


（横断地下道の南側半分は河野建設が施工を行います。）

②山田東交差点の南側（町道山田下條線と町道山田9号線の合流ヶ所）にて現在のブロック積み擁壁を取除き、将来の国道163号線拡幅に備え、新たに擁壁を築造し工事は完了となります。

工事① 平面図

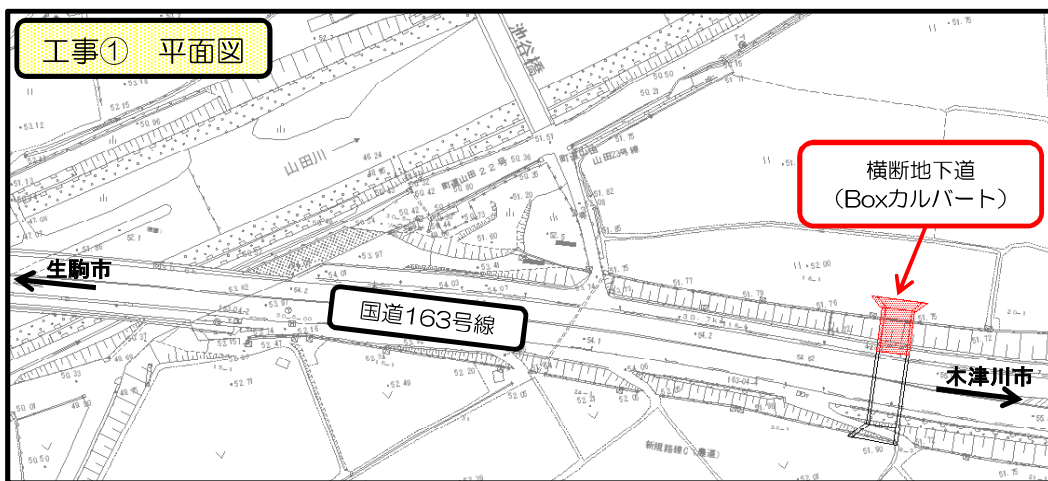

工事② 平面図

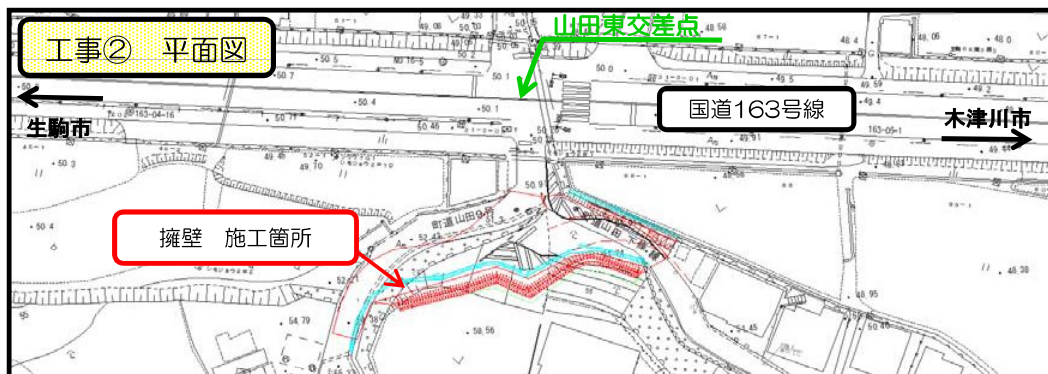

工事① 工事状況



当工事を担当します、現場代理人の片岡です。
11月より、上記の工事①を着手し12月末にて国道163号南側への切り回しは完了しています。1月より、横断地下道の準備から本体構築作業を実施しています。

近隣及び地域の皆様にはご迷惑をおかけしますが、工事の安全施工に努めますので、ご理解とご協力を宜しくお願い致します。

株式会社 仁木総合建設
現場代理人 片岡 史朗



【お問い合わせ先】



京都国道事務所 建設監督官 宮本 TEL：075-313-0009

（株）仁木総合建設 精華拡幅工事事務所 TEL：0774-82-2803
