

国土交通省近畿地方整備局
資料配布

配布日時	平成23年10月16日(日) 21時00分
------	--------------------------

件名	平成23年台風12号により発生した 河道閉塞箇所における緊急工事の実施状況について
----	--

概要	<p>奈良、和歌山両県知事からの要請を受け、国土交通省近畿地方整備局は土砂災害防止法に基づく緊急調査の結果を踏まえ、決壊や氾濫のおそれが特に高い河道閉塞箇所について、地域の安全・安心確保のための緊急工事を実施しています。</p> <p>赤谷地区、熊野地区、北股地区、栗平地区、長殿地区の10/16の作業状況</p> <ul style="list-style-type: none"> 各地区とも降雨の影響により予定していた工事は中止しました。熊野地区においてはポンプ排水のための安全を確認した上でポンプ排水をしました。また、北股地区においては現地確認を実施し安全を確認しましたので明日から工事を再開します。 10/17以降の作業予定は、別紙のとおりです。
----	--

取扱い	_____
-----	-------

配布場所	<p>近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ 和歌山県政記者クラブ、和歌山県政放送記者クラブ 和歌山県地方新聞協会 奈良県政・経済記者クラブ</p>
------	---

問い合わせ先	<p>国土交通省 近畿地方整備局 河川部</p> <p>河川調査官 中込 淳 (内線86-3624)</p> <p>河川計画課長 吉田 一亮 (内線86-3611)</p> <p>河川工事課長 下野 公仁 (内線86-3711)</p> <p>代表 06-6942-1141</p> <p>直通 06-6945-6355</p>
--------	--

赤谷地区(河道閉塞)緊急対策工事

施工:鹿島建設(株)



10月16日(日)の作業内容

- ・作業中止
- ・現地確認(被災状況、安全確認) 6名
- 進入路の一部流失を確認
- 工事用道路は異常なし
-
- 使用機械(10/16現在 現場内)
- ・油圧ショベル 0.7m³級 7台
- ・油圧ショベル 1.2m³級 1台
- ・クローラダンプ 10t積 4台
- ・ブルドーザ 7t級 1台
- 作業員 0名

(今後の予定)

10/17(月)の予定

- ・現地確認(被災状況、安全確認)を行い、工事再開を検討する。

10/17以降の予定

- ・現地の十分な安全確認を行ったうえで、工事を再開する予定
- 天候に左右されることに留意してください。

熊野地区(河道閉塞)緊急対策工事



10月16日(日)の作業内容

- ・ポンプ排水のみ実施。
- ・現地確認(ポンプ排水のための安全確認) 4名

○使用機械(10/16現在 現場内)

- 油圧ショベル 0.45m³級 6台
- クローラダンプ 6t積 2台
- 10tダンプ 1台
- 作業員 4名

(今後の予定)

10/17(月)の予定

- ・ポンプ排水 継続
- ・現地確認(被災状況、安全確認)を行い、工事再開を検討する。

10/17以降の予定

- ・現地の十分な安全確認を行ったうえで、工事を再開する予定
- 天候に左右されることに留意してください。

北股地区(河道閉塞)緊急対策工事



対策工は現在検討中のため、今後変更の可能性があります。

10月16日(日)の作業内容

- ・作業中止
- ・現地確認(被災状況、安全確認) 5名
全体的に異常はなし
湛水池は通常より1m程度水位上昇が確認できた。

使用機械(10/16現在)

- ・油圧ショベル 0.7m³級 4台
- ・油圧ショベル 0.4m³級 1台
- ・油圧ショベル 0.25m³級 1台
- ・クローラダンプ 11t積 1台
- 作業員 0名

(今後の予定)

10/17(月)の予定


- ・本日(16日)、工事現場内の安全確認ができたため、進入路設置工事および進入路設置工事に伴う倒木除去・切断・集積・場内運搬を再開する予定

10/17以降の予定

- ・進入路設置工事を進める予定
天候に左右されることに留意してください。

栗平地区(河道閉塞)緊急対策工事

施工:大成建設(株)

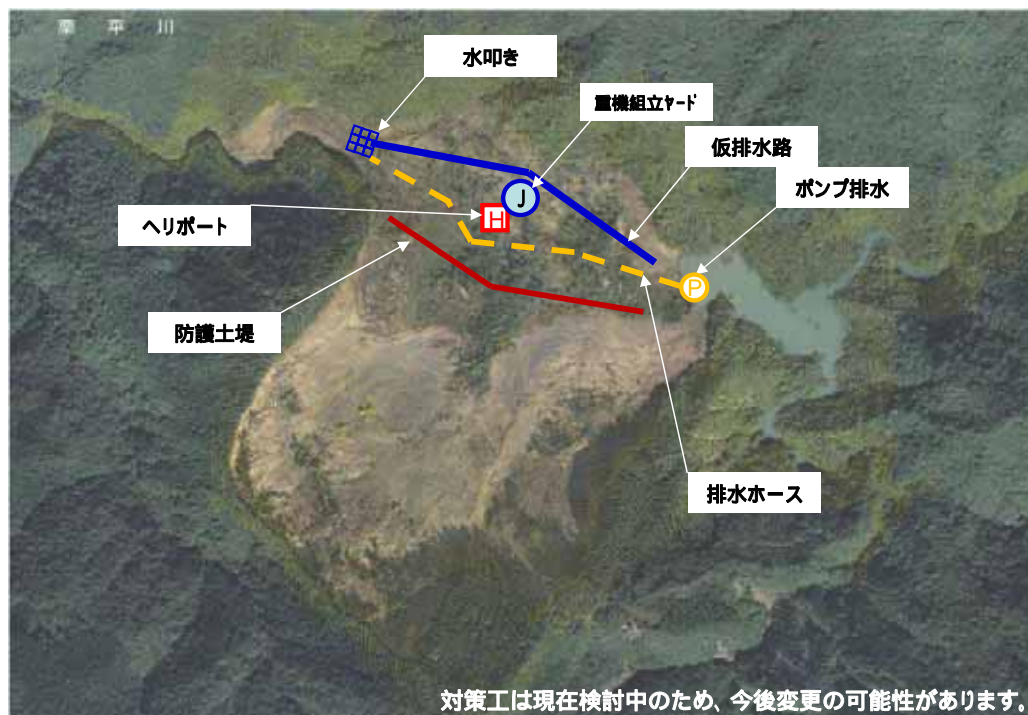

10月16日(日)の作業内容

・作業中止

使用機械(10/16現在 現場内)

・油圧ショベル 0.1m³級 2台

作業員 0名

(今後の予定)

10/17(月)の予定

・現地確認(被災状況、安全確認)を行い、工事再開を検討する。

10/17以降の予定

・現地の十分な安全確認を行ったうえで、工事を再開する予定

天候に左右されることに留意してください。

長殿地区(河道閉塞)緊急対策工事



10月16日(日)の作業内容	(今後の予定)
<p>・作業中止</p> <p>使用機械(10/16現在 現場内)</p> <p>・油圧ショベル 0.1m³級 2台</p> <p>作業員 0名</p>	<p>10/17(月)の予定</p> <p>・現地確認(被災状況、安全確認)を行い、工事再開を検討する。</p> <p>10/17以降の予定</p> <p>・現地の十分な安全確認を行ったうえで、工事を再開する予定</p> <p>天候に左右されることに留意してください。</p>
