

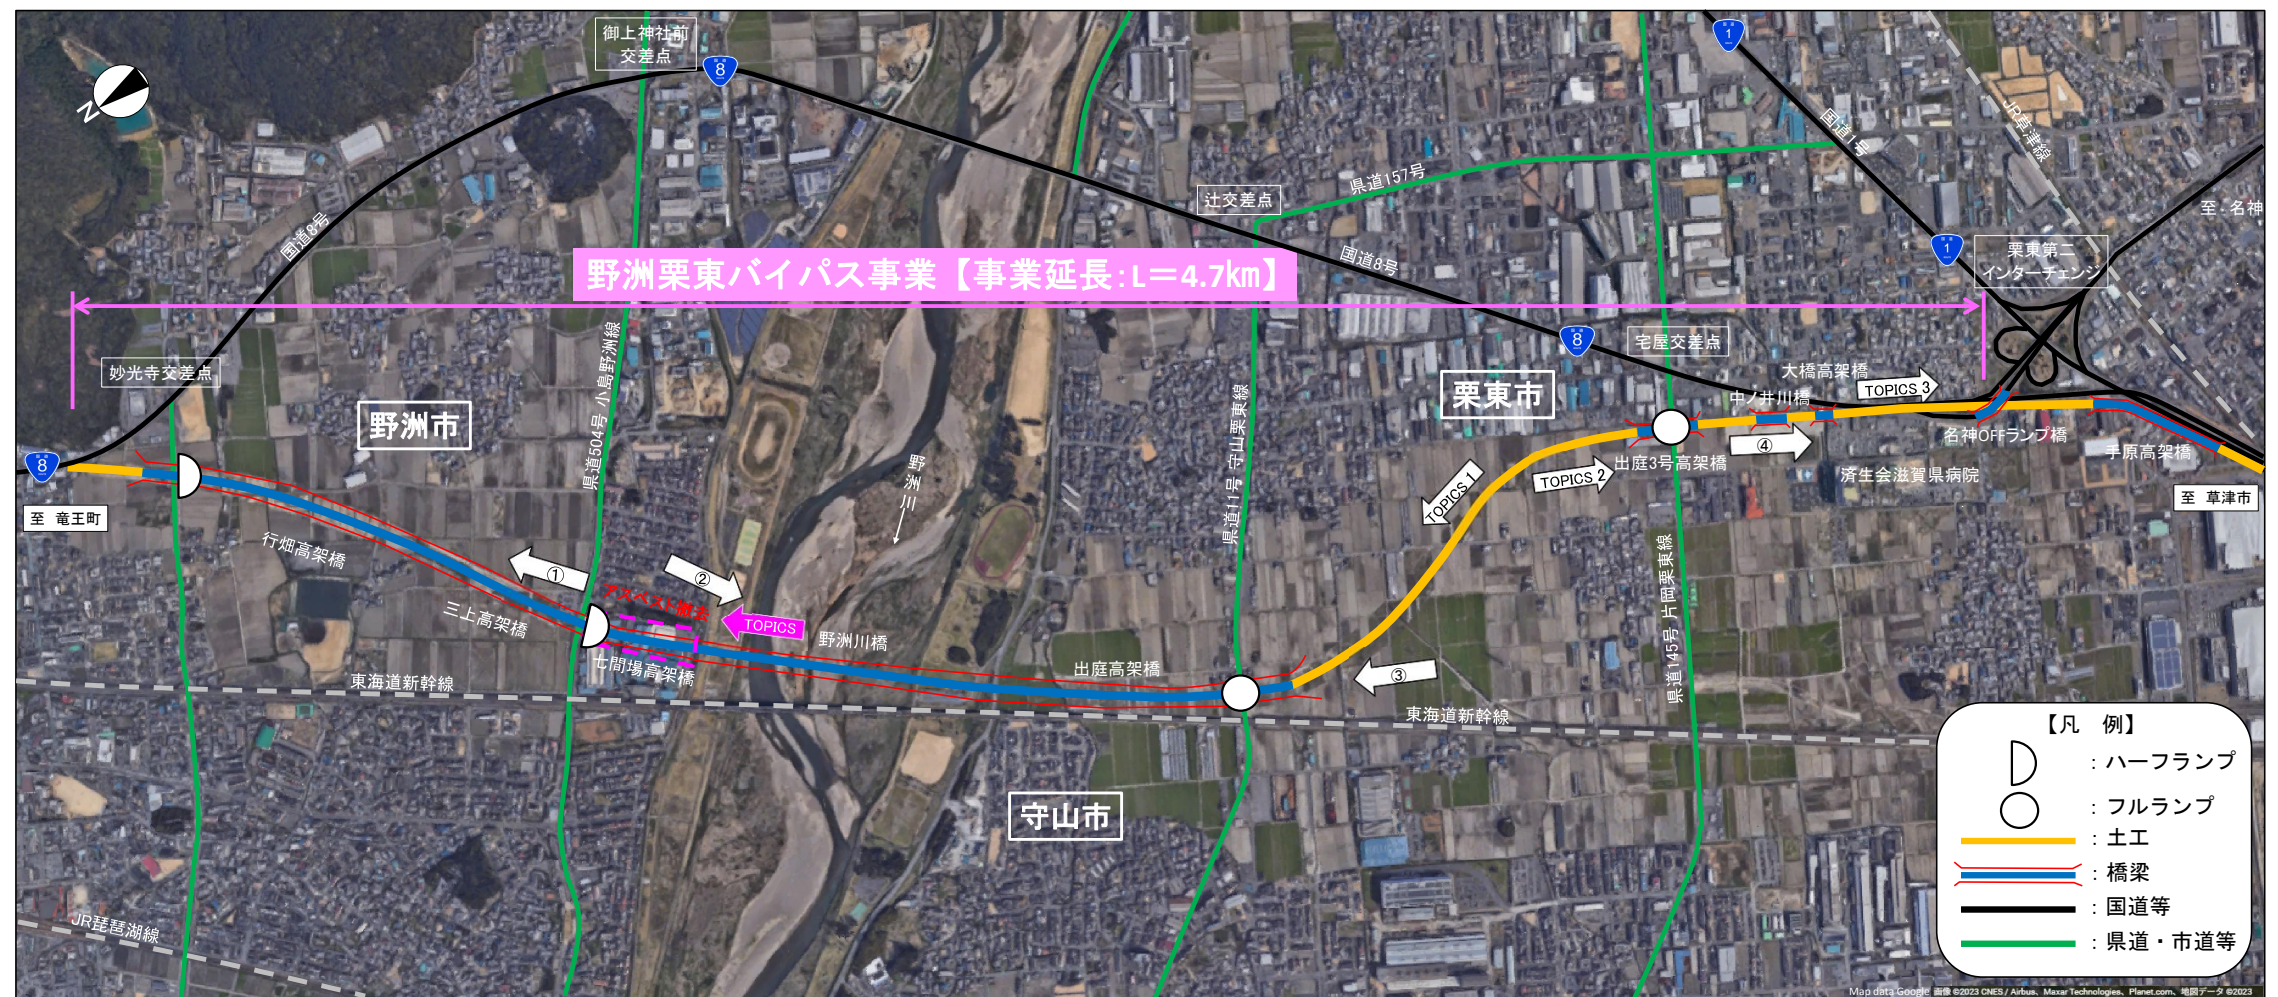
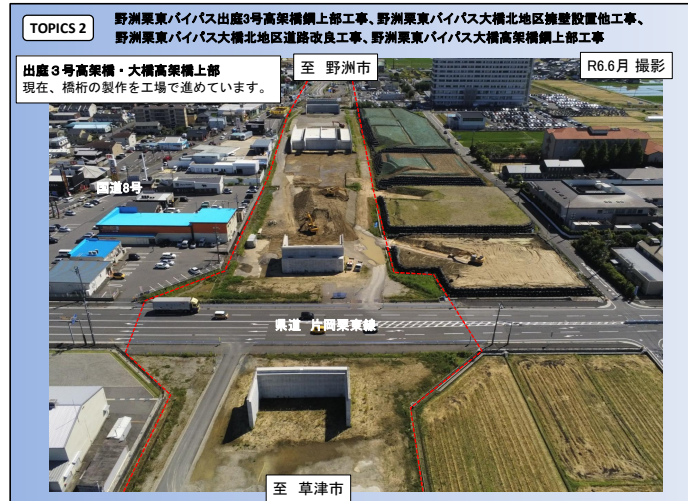


野洲栗東バイパス事業 工事進捗レポート

令和6年6月

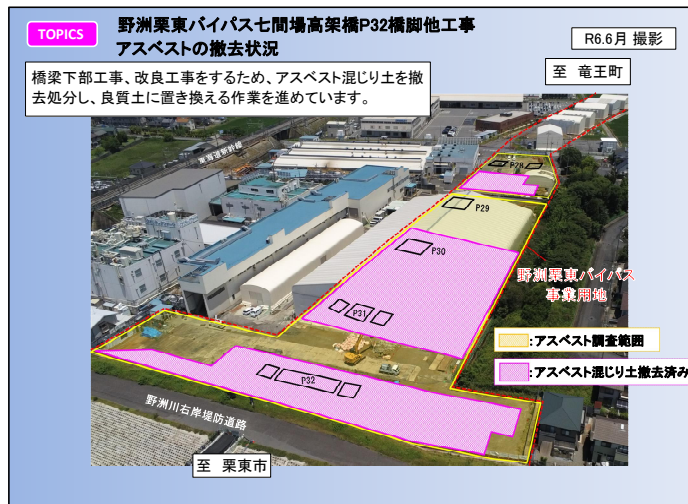

地区名	野洲市										守山市		栗東市																																															
	小篠原地区		妙光寺地区		行畑地区		三上地区						立入地区		出庭地区				中地区		宅屋地区			大橋地区		手原地区																																		
延長	1.90 km										0.60 km		2.20 km												0.36km			0.20km		0.12km																														
道路構造	土工		PC橋		PC橋		PC橋		PC橋		PC橋		鋼橋		鋼橋		鋼橋		鋼橋		土工		PC橋		PC橋		PC橋		PC橋		土工					鋼橋		土工		鋼橋		土工																		
至: 竜王町	行畑高架橋										三上高架橋		七間場高架橋		野洲川橋										出庭高架橋										出庭3号高架橋										中ノ井川橋		大橋高架橋		名神OFFランプ橋					手原高架橋						
凡 例 <table><tr><td> : 未着手</td><td> : 発注手続中</td><td> : 施工中</td><td> : 完 成</td></tr></table>																																						: 未着手	: 発注手続中	: 施工中	: 完 成																			
: 未着手	: 発注手続中	: 施工中	: 完 成																																																									

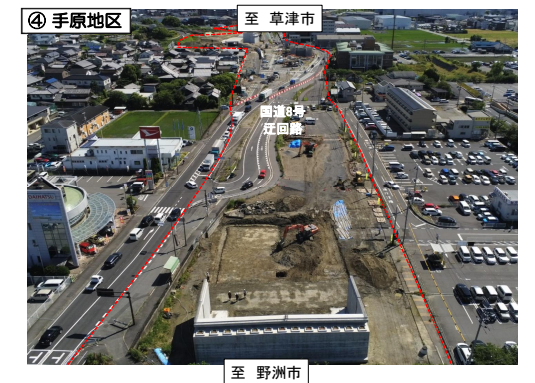

※アスベスト処分量の増加により、令和7年秋全線開通は遅延するものの、工事工程を精査し、できる限り早期に開通できるよう検討してまいります。
