

野洲栗東バイパス事業 工事進捗レポート

令和6年7月

TOPICS 野洲栗東バイパス七間場高架橋P32橋脚他工事 アスベストの撤去状況

R6.7月 撮影

橋梁下部工事、改良工事をするため、アスベスト混じり土を撤去処分し、良質土に置き換える作業を進めています。



TOPICS 1 野洲栗東バイパス出庭地区横断面橋脚他設置工事、野洲栗東バイパス出庭西地区橋脚他設置工事、野洲栗東バイパス出庭地区道路改良(2期)工事、野洲栗東バイパス中地区橋脚他設置工事、野洲栗東バイパス中地区道路改良工事、野洲栗東バイパス中地区橋脚他設置工事

R6.7月 撮影

改良工事
栗東市域の出庭地区のボックスカルバートの工事を進めています。



TOPICS 2 野洲栗東バイパス出庭3号高架橋橋脚上部工事、野洲栗東バイパス大橋北地区橋脚他設置工事、野洲栗東バイパス大橋北地区道路改良工事、野洲栗東バイパス大橋北地区橋脚他設置工事、野洲栗東バイパス手原地区道路改良工事

R6.7月 撮影

出庭3号高架橋・大橋高架橋上部
現在、橋桁の製作を工場で行っています。




TOPICS 3 野洲栗東バイパス手原高架橋下部他工事、野洲栗東バイパス名神OFFランプ橋脚上部工事、野洲栗東バイパス手原地区排水構造物他工事、野洲栗東バイパス手原高架橋橋脚上部工事

R6.7月 撮影

名神と国道1号、8号の分岐区間で橋梁下部や本線の改良工事を行っています。



地区名	野洲市	守山市	栗東市
小幡原地区	妙光寺地区	行畑地区	三上地区
延長	1.90 km	0.60 km	2.20 km
道路構造	土工	PC橋	PC橋
至:竜王町	行畑高架橋	三上高架橋	七間場高架橋
至:栗東市	野洲川橋	出庭高架橋	中ノ井川橋
至:草津市	大橋高架橋	名神OFFランプ橋	手原高架橋
至:名神			

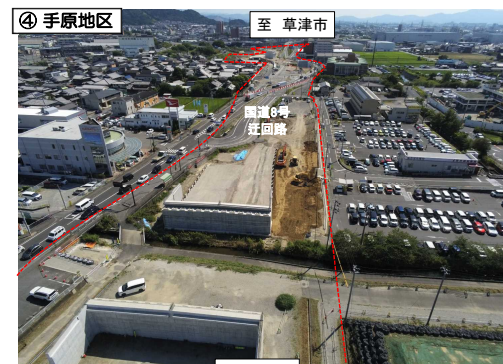

※アスベスト処分量の増加により、令和7年秋全線開通は遅延するものの、工事工程を精査し、できる限り早期に開通できるよう検討してまいります。
