

野洲栗東バイパス事業 工事進捗レポート

令和6年12月

TOPICS 野洲栗東バイパス七間場高架橋P32橋脚他工事
アスベストの撤去状況

R6.12月 撮影

橋梁下部工事、改良工事をするため、アスベスト混じり土を撤去処分し、良質土に置き換える作業を進めています。

至 竜王町



至 栗東市

TOPICS 1 野洲栗東バイパス出座西地区困渠他設置工事、野洲栗東バイパス中地区道路改良工事
野洲栗東バイパス宅屋地区道路改良工事

R6.12月 撮景



固渠工事

栗東市域の出庭地区のボックスカルバートの工事を進めています。


至 草津市

TOPICS 2 野洲栗東バイパス出座3号高架橋鋼上部工事、野洲栗東バイパス大橋北地区擁壁設置他工事、野洲栗東バイパス大橋北地区道路改良工事、野洲栗東バイパス大橋高架橋鋼上部工事、野洲栗東バイパス手原地区道路構造物他工事

R6.12月 撮影

出度3号高架橋上部工事
上部工の架設が完了し、こ
を進めていきます。

大橋高架橋上部工事
橋桁の製作が完了し、現
進めています。

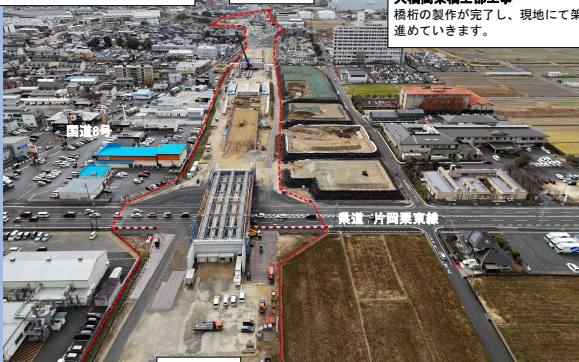

至 野洲市

TOPICS 3 野洲栗東バイパス手原高架橋下部他工事、野洲栗東バイパス名神OFFランプ橋鋼上部工事、野洲栗東バイパス手原地区排水構造物他工事、野洲栗東バイパス手原高架橋鋼上部工事

R6.12月 撮影

名神と国道1号、8号の分岐区間で橋梁下部や本線の改良工事を行っています。


名神OFFランプ橋鋼
上部工の架設が完了
工を進めていきます。




至 野洲市



地区名	野洲市										守山市		栗東市																																																																																																												
	小椋南地区			妙光寺地区			行畑地区				三上地区				立入地区		出庭地区				中地区		宅屋地区		大橋地区		手原地区																																																																																														
延長	1.90 km										0.60 km		2.20 km										0.36km		0.20km		0.12km																																																																																														
道路構造	土工		PC橋		PC橋		PC橋		PC橋		PC橋		鋼橋		鋼橋		鋼橋		鋼橋		土工		PC橋		PC橋		PC橋		PC橋		土工				鋼橋		土工																																																																																				
至：竜王町	行畑高架橋										三上高架橋				七間場高架橋				野洲川橋				出庭高架橋				出庭3号高架橋				中ノ井川橋		大橋高架橋		名神OFFランプ橋				手原高架橋		至：草津市																																																																																

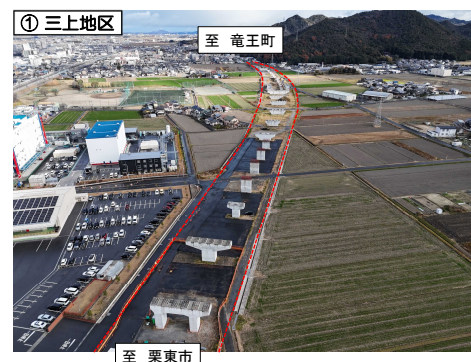

至 栗東市

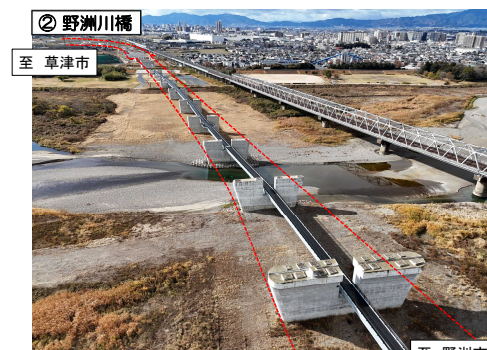

至 野洲市



至 草津市



至 野洲市

※アスベスト処分量の増加により、令和7年秋全線開通は遅延するものの、工事工程を精査し、できる限り早期に開通できるよう検討してまいります。
