

野洲栗東バイパス事業 工事進捗レポート

令和7年1月

TOPICS 野洲栗東バイパス七間場高架橋P32橋脚他工事 アスベストの撤去状況

R7.1月 撮影

橋梁下部工事、改良工事をするため、アスベスト混じり土を撤去処分し、良質土に置き換える作業が1月末に完了しました。仮設テントの解体撤去作業を進めています。



TOPICS 1 野洲栗東バイパス出庭西地区困渠他設置工事、野洲栗東バイパス中地区道路改良工事
野洲栗東バイパス宅屋地区道路改良工事

R7.1月 撮影




TOPICS 2 野洲栗東バイパス出座3号高架橋鋼上部工事、野洲栗東バイパス大橋北地区擁壁設置他工事、野洲栗東バイパス大橋北地区道路改良工事、野洲栗東バイパス大橋高架橋鋼上部工事、野洲栗東バイパス手原地区道路構造物他工事

R7.1月 撮影





TOPICS 3 野洲栗東バイパス手原高架橋下部他工事、野洲栗東バイパス名神OFFランプ橋鋼上部工事、野洲栗東バイパス手原地区排水構造物他工事、野洲栗東バイパス手原高架橋鋼上部工事

R7.1月 撮影

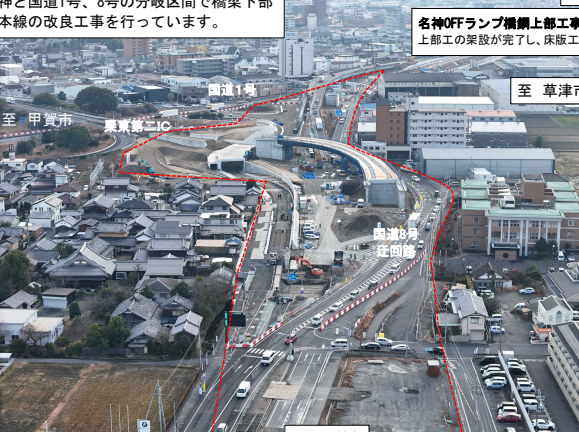

地区名	野洲市										守山市		栗東市																			
	小篠原地区		妙光寺地区		行畑地区		三上地区				立入地区		出庭地区				中地区		宅屋地区				大橋地区		手原地区							
延長	1.90 km										0.60 km		2.20 km														0.36km		0.20km		0.12km	
道路構造	土工		PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	鋼橋	鋼橋	鋼橋	鋼橋	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	土工				鋼橋	土工	PC橋	土工	鋼橋	土工	鋼橋	土工			
至：竜王町	行畑高架橋 三上高架橋 七間場高架橋 野洲川橋 出庭高架橋 出庭3号高架橋 中ノ井川橋 大橋高架橋 名神OFFランプ橋 手原高架橋																															
	94号合流部 A1 P2 (市)妙光寺北極線 GN-OFFランプ P7 (市)三上三宅線 P12 P17 P21 P23 P28 P21 P28 P29 P30 P31 野洲線 アスベスト撤去 P2 P1 歩道橋 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 A2 (市)野洲川幹線 A1 P1 P2 GN-OFFランプ P3 GN-OFFランプ P4 P5 P6 P11 P12 P13 P14 A2 4号 5号 6号 8号 (市)出庭線 9号 1号 2号 3号 4号 5号 A1 A2 (県)片岡栗東線 GN-OFFランプ A1 A2 中ノ井川 A1 A2 (市)大橋基地線 GN-OFFランプ A2 P1 A1 A1 P1 P2 P3 P4 至：草津市																															
凡 例 未着手 発注手続中 施工中 完成																																

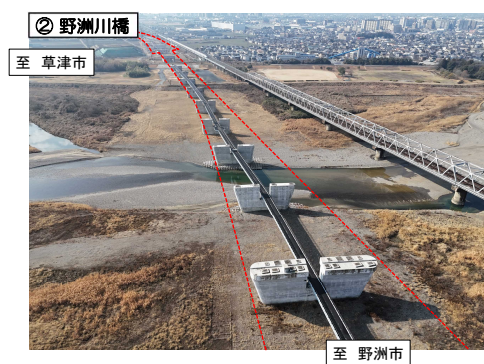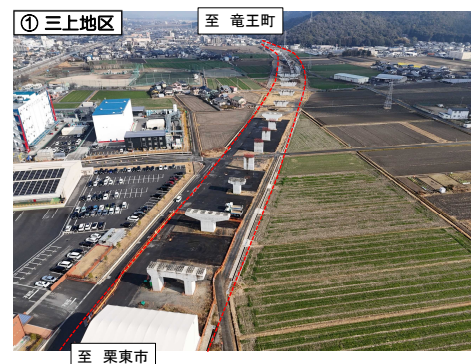

※アスベスト処分量の増加により、令和7年秋全線開通は遅延するものの、工事工程を精査し、できる限り早期に開通できるよう検討してまいります。
