

野洲栗東バイパス事業 工事進捗レポート

令和7年3月

TOPICS 1 野洲栗東バイパス七間場高架橋P31橋脚他工事

R7.3月撮影

橋梁下部工事、改良工事をするため、アスベスト混じり土を撤去処分し、良質土に置き換える作業が令和7年1月末に完了しました。仮設フェンスの解体撤去作業が令和7年2月末に完了しました。

橋梁下部工事
これからP31橋脚及びON/OFFランプ橋脚の施工を進めていきます。



TOPICS 2 野洲栗東バイパス出庭地区高架橋他設置工事、野洲栗東バイパス中地区道路改良工事、野洲栗東バイパス宅屋地区道路改良工事

R7.3月撮影



改良工事
路体盛土のための地盤改良工事を進めています。

高架橋工事
栗東市域の出庭地区のボックスカルバートの工事を進めています。

TOPICS 3 野洲栗東バイパス出庭3号高架橋上部工事、野洲栗東バイパス大橋北地区擁壁設置他工事、野洲栗東バイパス大橋北地区道路改良工事、野洲栗東バイパス手原地区道路構造物他工事、野洲栗東バイパス大橋南地区擁壁設置他工事、野洲栗東バイパス大橋南地区擁壁設置他工事

R7.3月撮影




出庭3号高架橋上部工事
上部工の架設が完了し、床版工を進めています。

大橋高架橋上部工事
上部工の架設が完了し、床版工を進めています。

擁壁工事
これから補強土壁の施工を進めています。

TOPICS 4 野洲栗東バイパス手原高架橋下部他工事、野洲栗東バイパス名神OFFランプ橋脚上部工事、野洲栗東バイパス手原地区排水構造物他工事、野洲栗東バイパス手原高架橋橋脚上部工事、野洲栗東バイパス手原南地区道路構造物設置他工事


R7.3月撮影

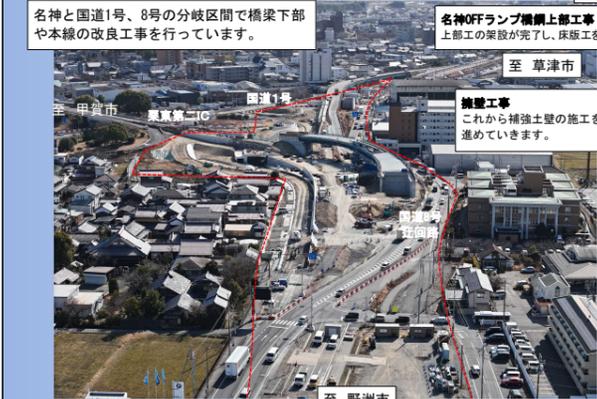

名神と国道1号、8号の分岐区間で橋梁下部や本線の改良工事を行っています。

名神OFFランプ橋脚上部工事
上部工の架設が完了し、床版工を進めています。


擁壁工事
これから補強土壁の施工を進めています。

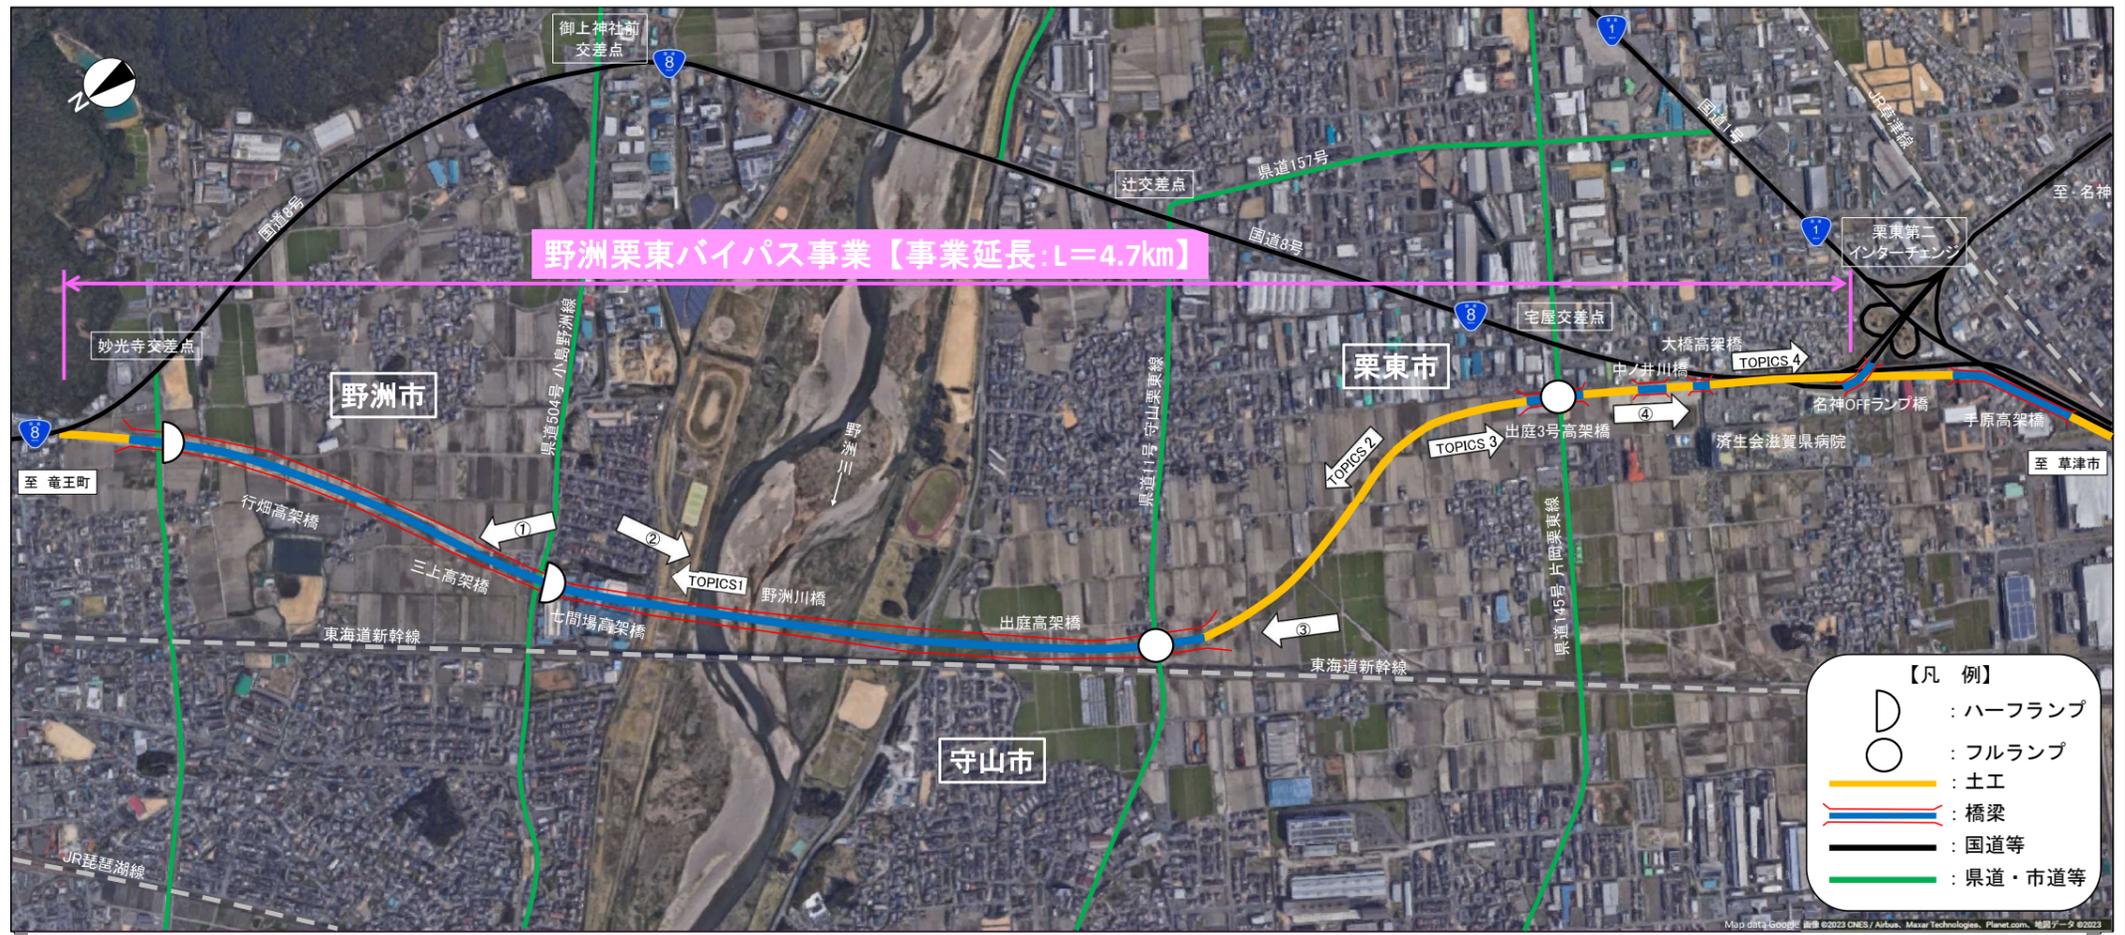

- 【凡例】
- D : ハーフランプ
 - O : フルランプ
 - : 土工
 - ▬ : 橋梁
 - : 国道等
 - : 県道・市道等

地区名	野洲市										守山市		栗東市																																													
延長	1.90 km										0.60 km		2.20 km																																													
道路構造	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	鋼橋	鋼橋	鋼橋	鋼橋	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	土工	鋼橋	土工	PC橋	鋼橋	土工	鋼橋	土工																																			
至: 竜王町	行畑高架橋										三上高架橋		七間場高架橋		野洲川橋		出庭高架橋		出庭3号高架橋		中ノ井川橋		大橋高架橋		名神OFFランプ橋		手原高架橋		至: 草津市																													
	A1	P2	P7	P12	(市)三上	P17	P22	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	A1	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	A2	4号	5号	6号	8号	9号	1号	2号	3号	4号	5号	(黒)片岡	A1	A2	A1	A2	(市)大橋	基地線	A2	P1	A1	A1	P1	P2	P3	P4	A2

- 凡例
- : 未着手
 - : 発注手続中
 - : 施工中
 - : 完成

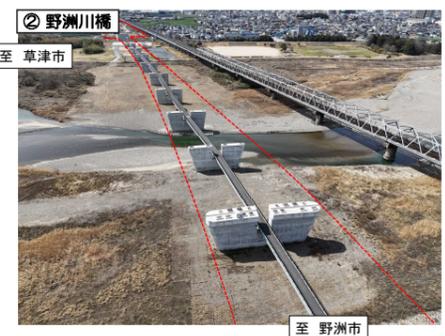

※アスベスト処分量の増加により、令和7年秋全線開通は遅延するものの、工事工程を精査し、できる限り早期に開通できるように検討してまいります。
