
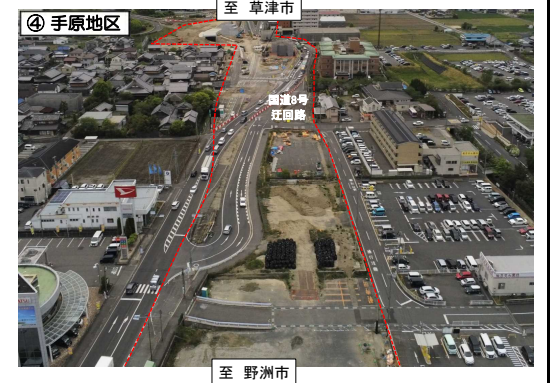
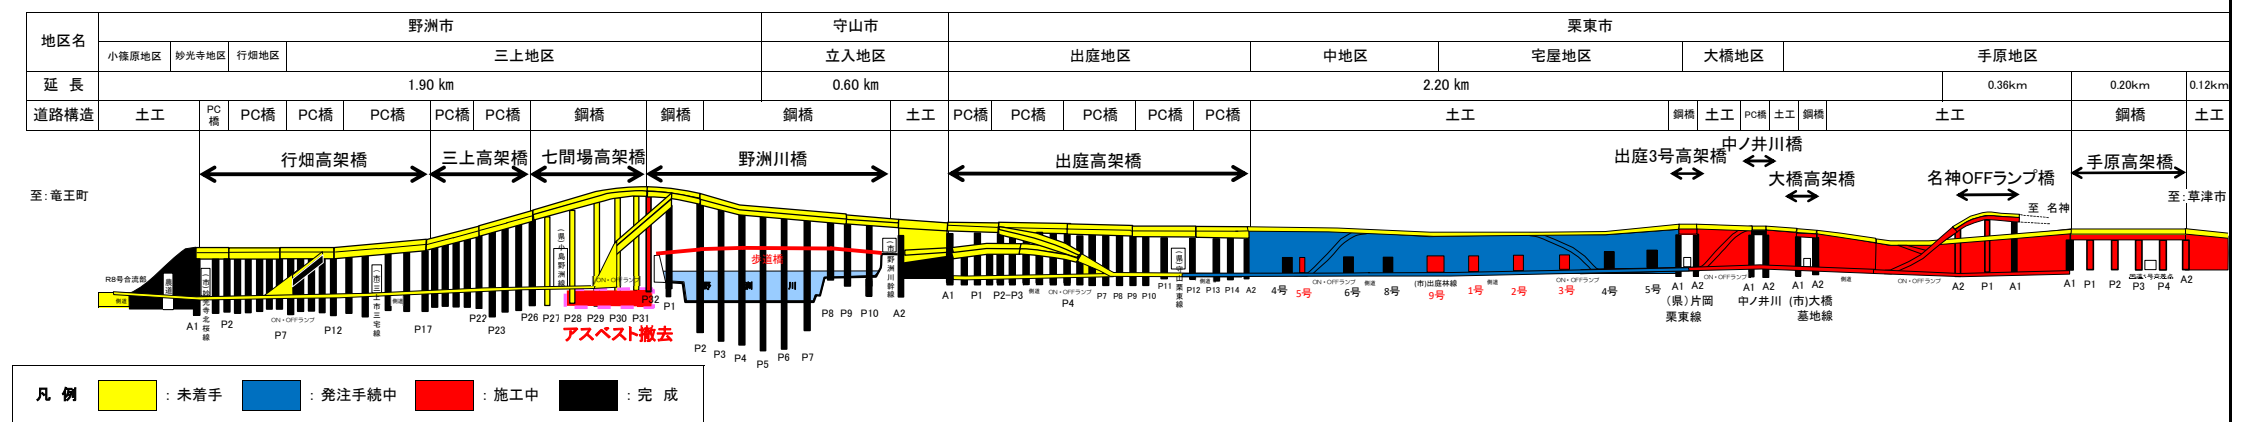


野洲栗東バイパス事業 工事進捗レポート







令和6年4月

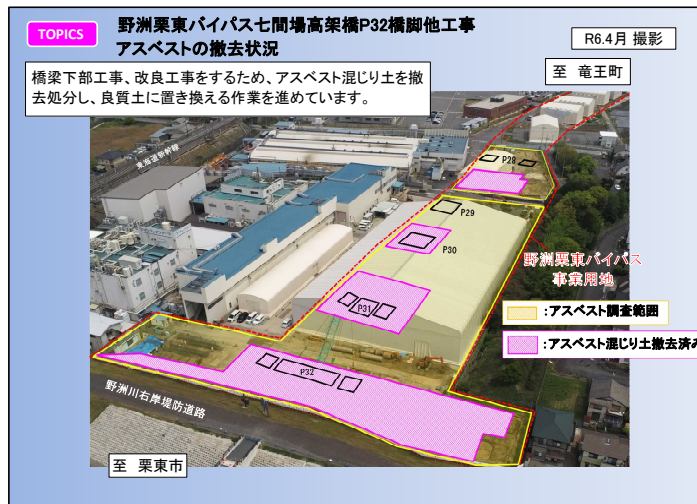

※アスベスト処分量の増加により、令和7年秋全線開通は遅延するものの、工事工程を精査し、できる限り早期に開通できるよう検討してまいります。

野洲栗東バイパス事業 工事進捗レポート

令和6年5月

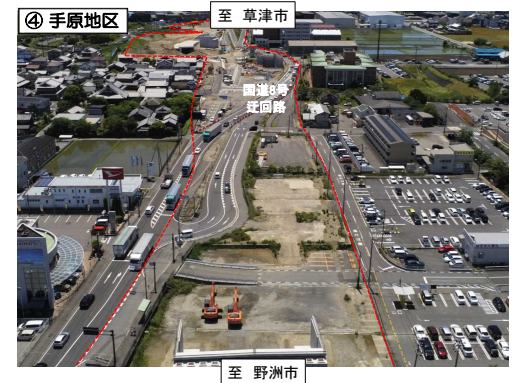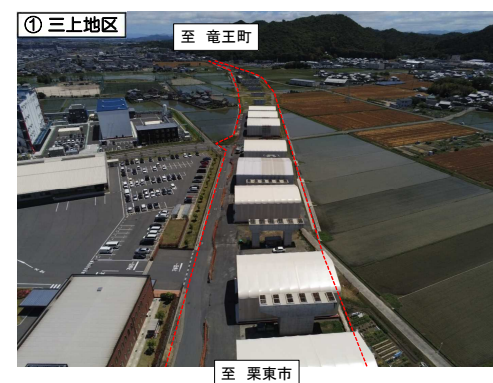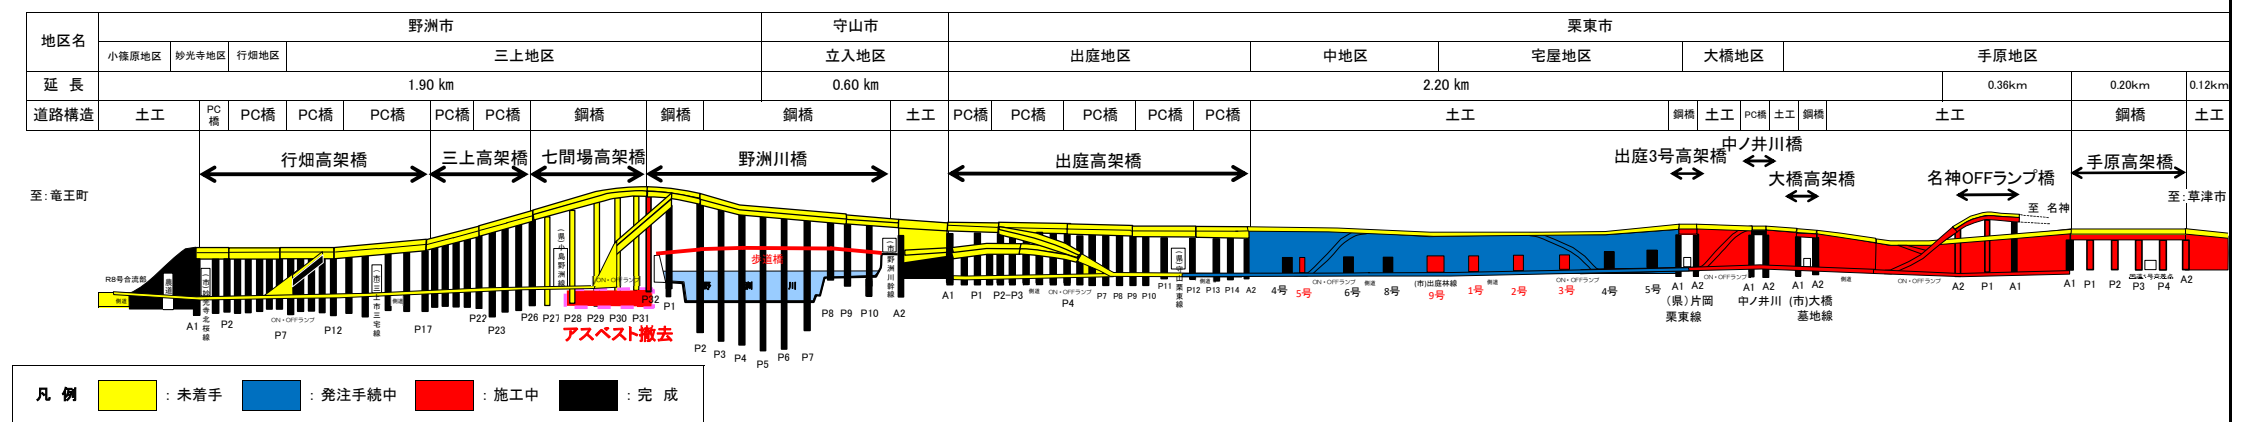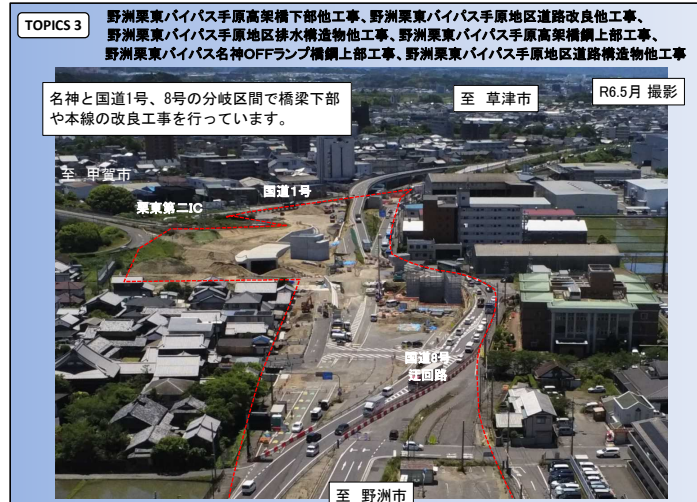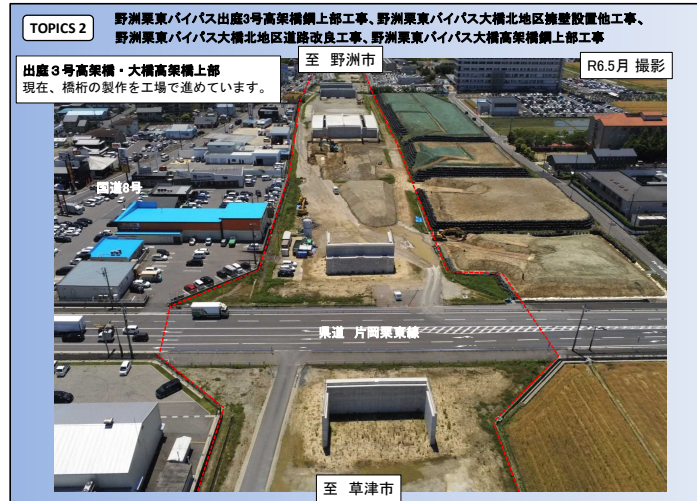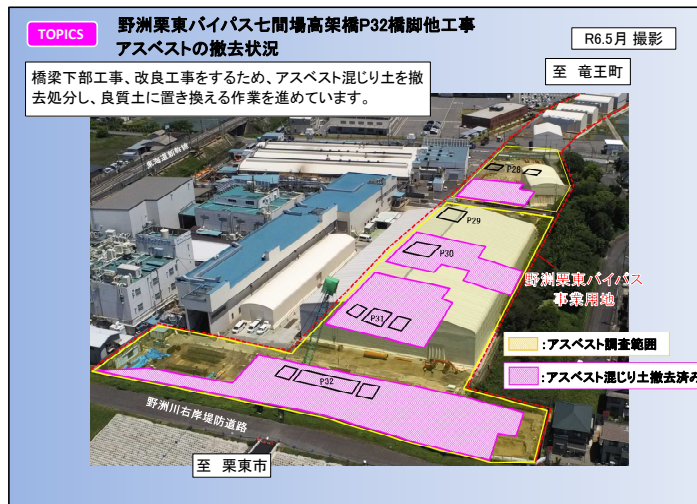

※アスベスト処分量の増加により、令和7年秋全線開通は遅延するものの、工事工程を精査し、できる限り早期に開通できるよう検討してまいります。

野洲栗東バイパス事業 工事進捗レポート

令和6年6月

TOPICS 野洲栗東バイパス七間場高架橋P32橋脚他工事
アスベストの撤去状況

R6.6月撮影

橋梁下部工事、改良工事をするため、アスベスト混じり土を撤去処分し、良質土に置き換える作業を進めています。

至 竜王町

野洲栗東バイパス事業用地

アスベスト調査範囲

アスベスト混じり土撤去済み

野洲川右岸堤防道路

至 栗東市

TOPICS 1 野洲栗東バイパス出庭地区横断面橋脚他設置工事、野洲栗東バイパス出庭西部地区面橋脚他設置工事、野洲栗東バイパス出庭地区道路改良(2期)工事、野洲栗東バイパス中地区面橋脚他設置工事、野洲栗東バイパス中地区道路改良工事、野洲栗東バイパス宅屋地区道路改良工事

R6.6月撮影

改良工事
栗東市域の出庭地区のボックスカルバートの工事を行っています。

至 野洲市

至 草津市

TOPICS 2 野洲栗東バイパス出庭3号高架橋橋上部工事、野洲栗東バイパス大橋北地区護壁設置他工事、野洲栗東バイパス大橋北地区道路改良工事、野洲栗東バイパス大橋高架橋上部工事

R6.6月撮影

出庭3号高架橋・大橋高架橋上部
現在、橋桁の製作を工場で行っています。

至 野洲市

至 草津市

TOPICS 3 野洲栗東バイパス手原高架橋下部他工事、野洲栗東バイパス手原地区道路改良他工事、野洲栗東バイパス手原地区排水構造物他工事、野洲栗東バイパス手原高架橋橋上部工事、野洲栗東バイパス名神OFFランプ橋橋上部工事、野洲栗東バイパス手原地区道路構造物他工事


R6.6月撮影

名神と国道1号、8号の分岐区間で橋梁下部や本線の改良工事を行っています。


至 甲賀市

至 草津市

至 野洲市

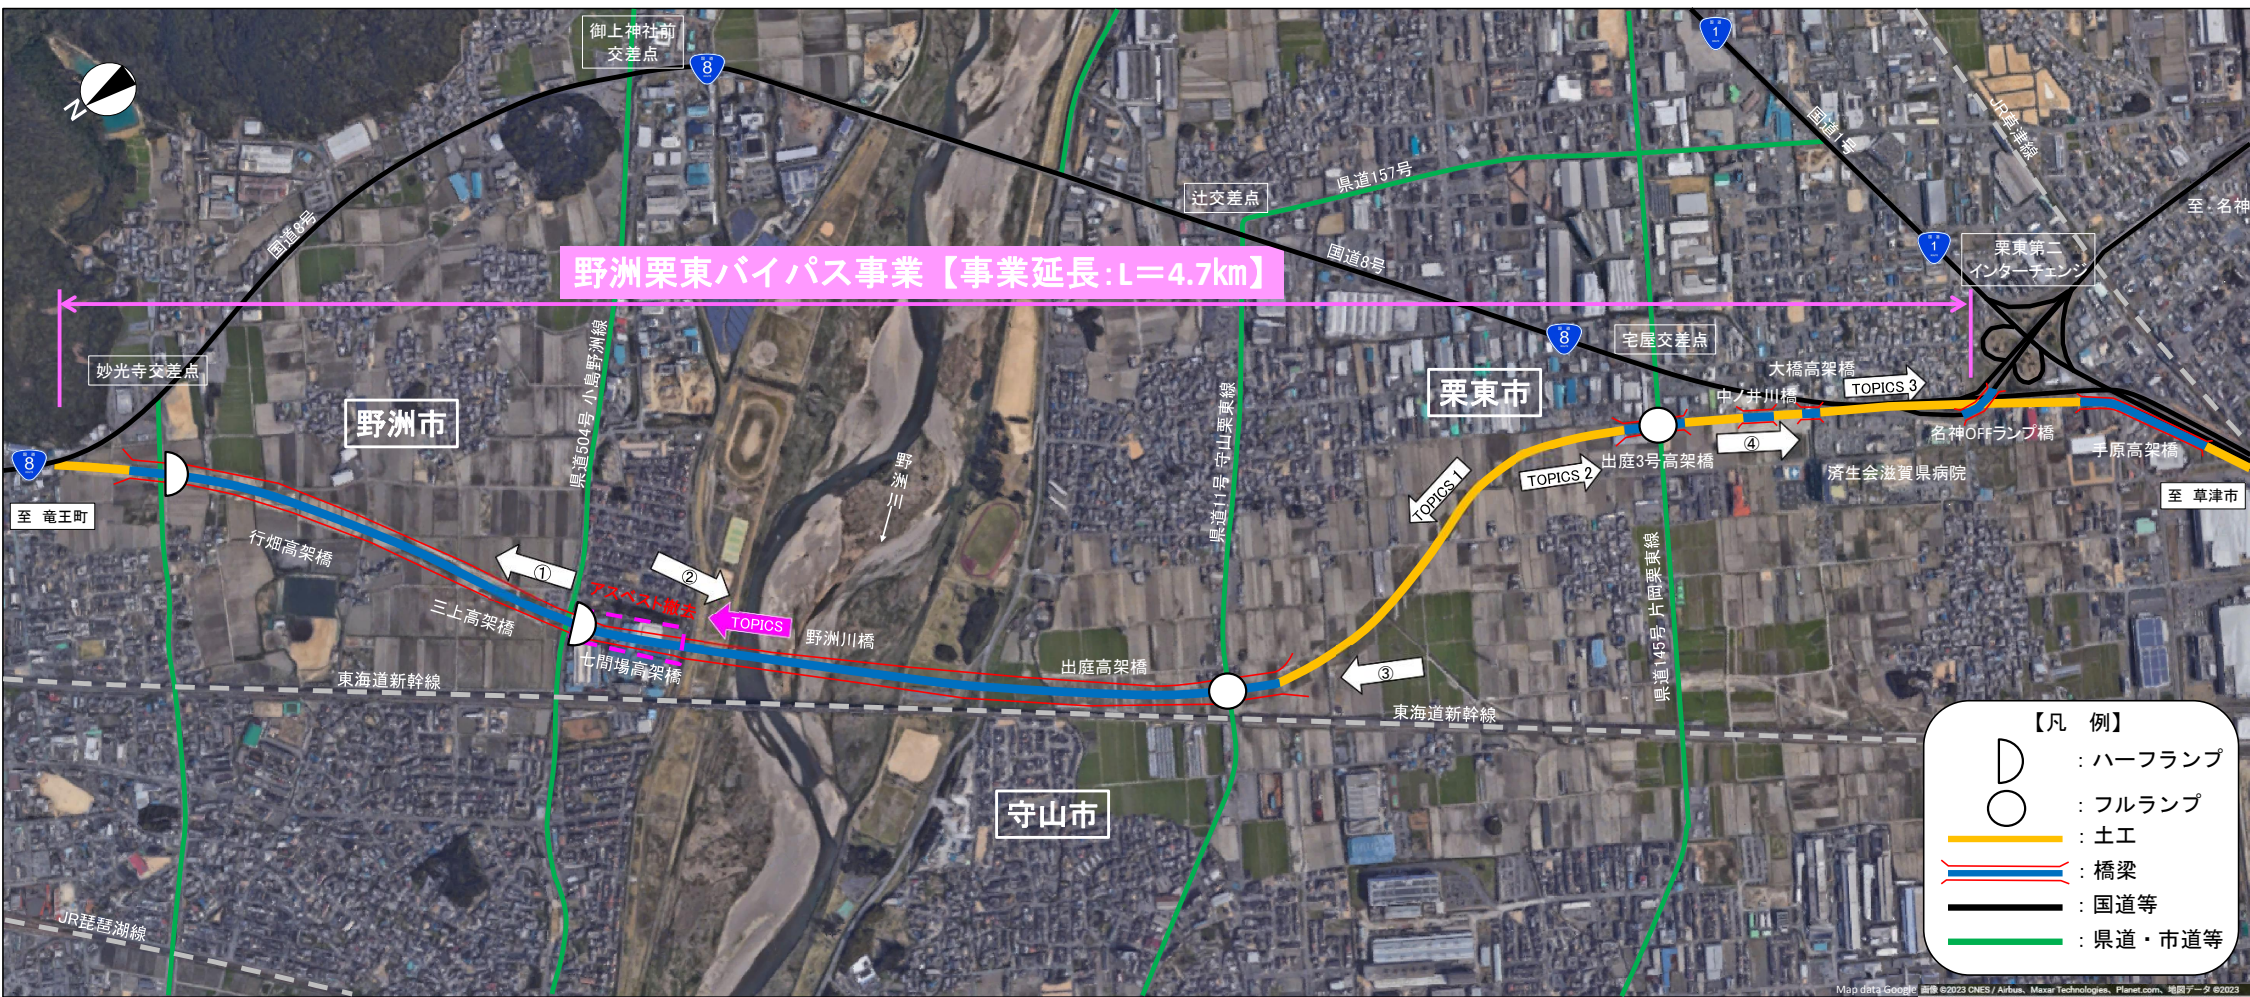

地区名	野洲市										守山市	栗東市																				
	小幡原地区	妙光寺地区	行畑地区	三上地区						立入地区	出庭地区				中地区	宅屋地区		大橋地区	手原地区													
延長	1.90 km										0.60 km	2.20 km										0.38km		0.20km	0.12km							
道路構造	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	鋼橋	鋼橋	鋼橋	鋼橋	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	土工				鋼橋	土工	PC橋	土工	鋼橋	土工							
至:竜王町	行畑高架橋										三上高架橋		七間場高架橋		野洲川橋				出庭高架橋				出庭3号高架橋		中ノ井川橋		大橋高架橋		名神OFFランプ橋		手原高架橋	
	R8号市道沿										市道沿		市道沿		市道沿		市道沿		市道沿		市道沿		市道沿		市道沿		市道沿		市道沿			
	A1 P2 P7 P12 P17 P22 P26 P28 P29 P30 P31										P2 P3 P4 P5 P6 P7		P8 P9 P10		A2		A1 P1 P2 P3 P4 P5 P6		P7 P8 P9 P10		P11 P12 P13 P14 A2		4号 5号 6号 8号 9号 1号 2号 3号 4号 5号		A1 A2 (農)片岡 葉東線		A1 A2 中ノ井川 (市)大橋 高地線		A2 P1 A1 A1 P1 P2 P3 P4			
	アスベスト撤去										アスベスト撤去		アスベスト撤去		アスベスト撤去		アスベスト撤去		アスベスト撤去		アスベスト撤去		アスベスト撤去		アスベスト撤去		アスベスト撤去		アスベスト撤去			
	R8号市道沿										市道沿		市道沿		市道沿		市道沿		市道沿		市道沿		市道沿		市道沿		市道沿		市道沿		市道沿	
凡 例 : 未着手 : 発注手続中 : 施工中 : 完 成																																

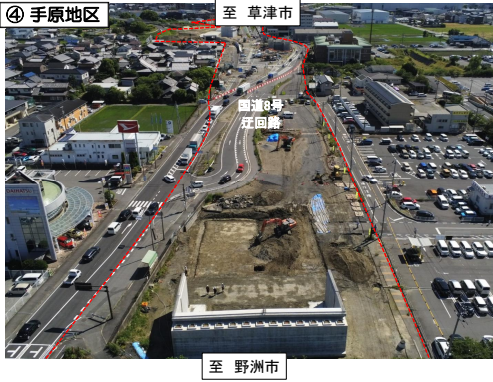


※アスベスト処分量の増加により、令和7年秋全線開通は遅延するものの、工事工程を精査し、できる限り早期に開通できるよう検討してまいります。

野洲栗東バイパス事業 工事進捗レポート

令和6年7月

TOPICS 野洲栗東バイパス七間場高架橋P32橋脚他工事 アスベストの撤去状況

R6.7月 撮影

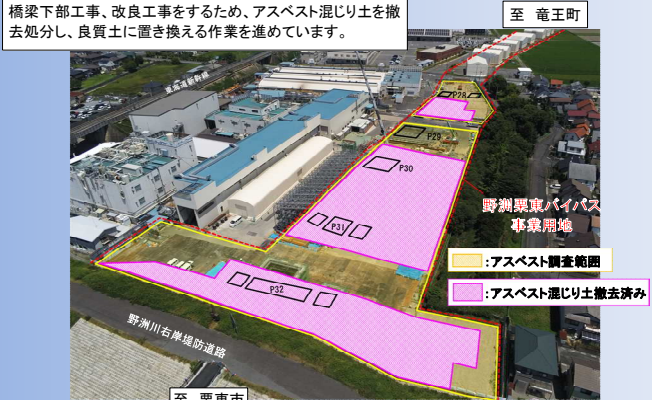


TOPICS 1 野洲栗東バイパス出庭地区横断橋設置工事、野洲栗東バイパス出庭西地区南側他設置工事、野洲栗東バイパス出庭地区道路改良(2期)工事、野洲栗東バイパス中地区南側他設置工事、野洲栗東バイパス中地区道路改良工事、野洲栗東バイパス宅屋地区道路改良工事

R6.7月 撮影



TOPICS 2 野洲栗東バイパス出庭3号高架橋橋上部工事、野洲栗東バイパス大橋北地区擁壁設置他工事、野洲栗東バイパス大橋北地区道路改良工事、野洲栗東バイパス大橋高架橋橋上部工事、野洲栗東バイパス手原地区道路構造物他工事

R6.7月 撮影

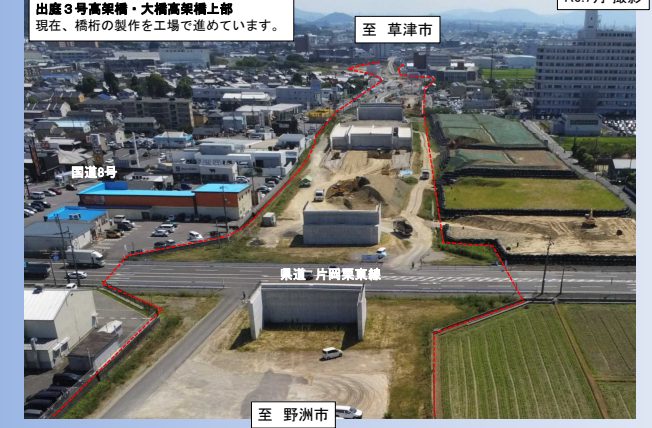


TOPICS 3 野洲栗東バイパス手原高架橋下部他工事、野洲栗東バイパス名神OFFランプ橋橋上部工事、野洲栗東バイパス手原地区排水構造物他工事、野洲栗東バイパス手原高架橋橋上部工事

R6.7月 撮影



地区名	野洲市										守山市	栗東市																						
	小幡原地区	妙光寺地区	行畑地区	三上地区							立入地区	出庭地区				中地区	宅屋地区			大橋地区	手原地区													
延長	1.90 km										0.60 km	2.20 km										0.38km			0.20km	0.12km								
道路構造	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	鋼橋	鋼橋	鋼橋	鋼橋	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	土工				鋼橋	土工	PC橋	土工	鋼橋	土工	鋼橋	土工							
至:竜王町	行畑高架橋										三上高架橋		七間場高架橋		野洲川橋				出庭高架橋				出庭3号高架橋				中ノ井川橋		大橋高架橋		名神OFFランプ橋		手原高架橋	

凡 例	黄色	青	赤	黒
	未着手	発注手続中	施工中	完成

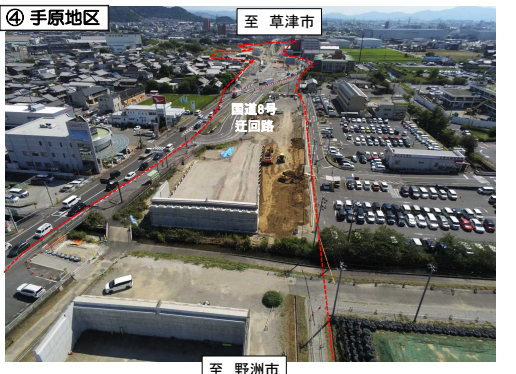

※アスベスト処分量の増加により、令和7年秋全線開通は遅延するものの、工事工程を精査し、できる限り早期に開通できるよう検討してまいります。

野洲栗東バイパス事業 工事進捗レポート

令和6年8月

TOPICS 野洲栗東バイパス七間場高架橋P32橋脚他工事
アスベストの撤去状況

R6.8月 撮影

橋梁下部工事、改良工事をするため、アスベスト混じり土を撤去処分し、良質土に置き換える作業を進めています。

至 竜王町

野洲栗東バイパス
工事用地

：アスベスト調査範囲
：アスベスト混じり土撤去済み

野洲川右岸堤防道路

至 栗東市

TOPICS 1 野洲栗東バイパス出産地区横断橋設置他工事、野洲栗東バイパス出産西地区両側他設置工事、野洲栗東バイパス出産地区道路改良(2期)工事、野洲栗東バイパス中地区両側他設置工事、野洲栗東バイパス中地区道路改良工事、野洲栗東バイパス宅屋地区道路改良工事

R6.8月 撮影

改良工事
栗東市域の出産地区のボックスカルバートの工事を行っています。

至 野洲市

至 草津市

TOPICS 2 野洲栗東バイパス出産3号高架橋上部工事、野洲栗東バイパス大橋北地区擁壁設置他工事、野洲栗東バイパス大橋北地区道路改良工事、野洲栗東バイパス大橋高架橋上部工事、野洲栗東バイパス手原地区道路構造物他工事

R6.8月 撮影

出産3号高架橋・大橋高架橋上部
現在、橋桁の製作を工場で行っています。

至 草津市

至 野洲市

TOPICS 3 野洲栗東バイパス手原高架橋下部他工事、野洲栗東バイパス名神OFFランプ橋上部工事、野洲栗東バイパス手原地区排水構造物他工事、野洲栗東バイパス手原高架橋上部工事

R6.8月 撮影

名神と国道1号、8号の分岐区間で橋梁下部や本線の改良工事を行っています。

名神OFFランプ橋上部工事
現在、橋桁の製作を工場で行っています。

至 草津市


至 甲賀市

至 野洲市

至 栗東市



地区名	野洲市	守山市	栗東市
小幡原地区	妙光寺地区	行畑地区	三上地区
延長	1.90 km	0.60 km	2.20 km
道路構造	土工	PC橋	PC橋
至 竜王町	行畑高架橋	三上高架橋	七間場高架橋
野洲川橋	出産高架橋	出産3号高架橋	中ノ井川橋
大橋高架橋	名神OFFランプ橋	手原高架橋	至 草津市

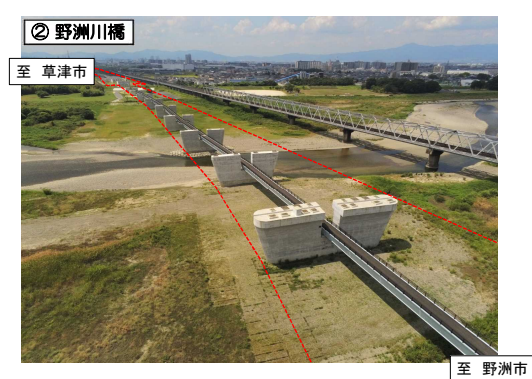

※アスベスト処分量の増加により、令和7年秋全線開通は遅延するものの、工事工程を精査し、できる限り早期に開通できるよう検討してまいります。

野洲栗東バイパス事業 工事進捗レポート

令和6年9月

TOPICS 野洲栗東バイパス七間場高架橋P32橋脚他工事
アスベストの撤去状況

R6.9月 撮影

橋梁下部工事、改良工事をするため、アスベスト混じり土を掘り出し、分別して処分し、良質土に置き換える作業を進めています。



TOPICS 1

野洲果東バイパス出地地区横断渠他設置工事、野洲果東バイパス出地西地区渠他設置工事、
野洲果東バイパス出地地区道路改良(2期)工事、野洲果東バイパス中地区渠他設置工事、
野洲果東バイパス中地区道路改良工事、野洲果東バイパス宅間地区道路改良工事

R6.9月 撮影



改良工事

栗東市域の出庭地区のボックスカルバートの工事を進めています。

至 草津市

TOPICS 2

野洲東部バイパス出区3号高架橋欄上部工事、野洲東部バイパス大橋北地区擁壁設置他工事、
野洲東部バイパス大橋北地区道路改良工事、野洲東部バイパス大橋高架橋欄上部工事、
野洲東部バイパス手原地区道路構造物他工事

6.9月 撮影

出座3号高架橋・大橋高架橋上部
現在、橋桁の製作を工場に進めています。



至 野洲市


TOPICS 3

野洲栗東バイパス手原高架橋下部他工事、野洲栗東バイパス名神OFFランプ橋鋼上部工事、
野洲栗東バイパス手原地区排水構造物他工事、野洲栗東バイパス手原高架橋鋼上部工事

R6.9月 撮影

名神と国道1号、8号の分岐区間で橋や本線の改良工事を行っています。

名神OFFランプ橋鋼上部工事
現在、橋桁の製作を工場に進めています。

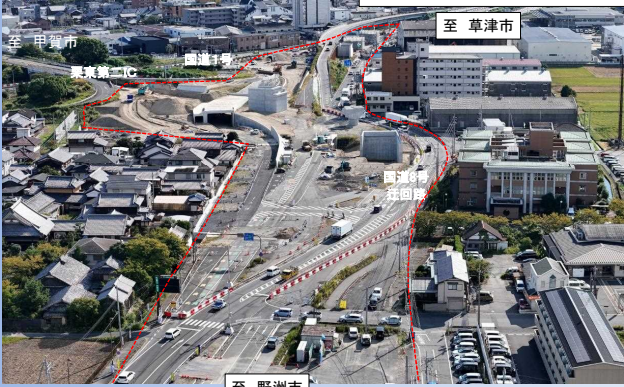


至 野洲市



地区名	野洲市										守山市		栗東市																						
	小椋原地区		妙光寺地区		行畑地区		三上地区				立入地区		出庭地区				中地区			宅屋地区			大橋地区		手原地区										
延長	1.90 km										0.60 km		2.20 km															0.38km		0.20km		0.12km			
道路構造	土工		PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	鋼橋	鋼橋	鋼橋	鋼橋	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	土工					鋼橋	土工	PC橋	土工	鋼橋	土工		鋼橋	土工				
至：竜王町	行畑高架橋										三上高架橋		七間場高架橋		野洲川橋				出庭高架橋				出庭3号高架橋					中ノ井川橋		大橋高架橋		名神OFFランプ橋		手原高架橋	
	至：竜王町										至：三上地区		至：七間場地区		至：野洲川地区				至：出庭地区				至：中地区					至：宅屋地区		至：大橋地区		至：手原地区		至：草津市	
凡 例 : 未着手 : 発注手続中 : 施工中 : 完成																																			



至 栗東市

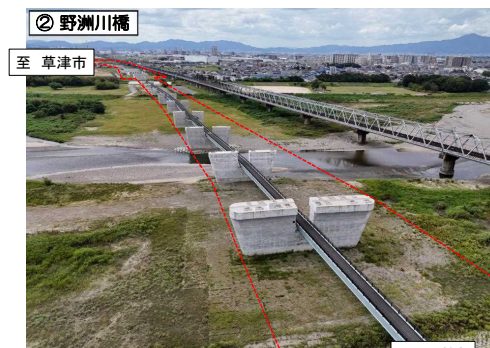

至 野洲市



至 草津市



至 野洲市

※アスベスト処分量の増加により、令和7年秋全線開通は遅延するものの、工事工程を精査し、できる限り早期に開通できるよう検討してまいります。


野洲栗東バイパス事業 工事進捗レポート

令和6年10月

TOPICS 野洲栗東バイパス七間場高架橋P32橋脚他工事 アスベストの撤去状況

R6.10月 撮影

橋梁下部工事、改良工事をするため、アスベスト混じり土を撤去処分し、良質土に置き換える作業を進めています。

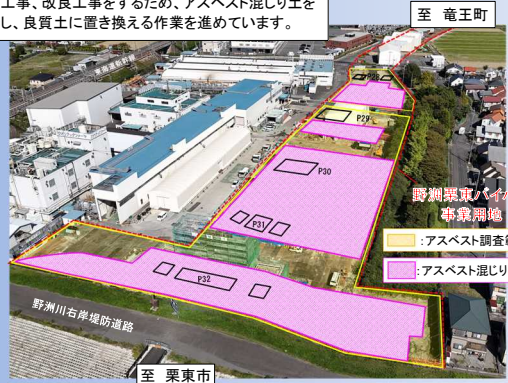

TOPICS 1 野洲栗東バイパス出座地区橋断面異他設置工事、野洲栗東バイパス出座地区橋断面異他設置工事、野洲栗東バイパス出座地区道路改良(2期)工事、野洲栗東バイパス中地区橋断面異他設置工事、野洲栗東バイパス中地区道路改良工事、野洲栗東バイパス中地区道路改良工事

R6.10月 撮影




改良工事
路体盛土のための地盤改良工事を進めています。

函渠工事
栗東市域の出座地区のボックスカルバートの工事を進めています。

TOPICS 2 野洲栗東バイパス出座3号高架橋橋上工事、野洲栗東バイパス大橋北地区擁壁設置他工事、野洲栗東バイパス大橋北地区道路改良工事、野洲栗東バイパス大橋高架橋橋上工事、野洲栗東バイパス手原地区道路構造物他工事

R6.10月 撮影

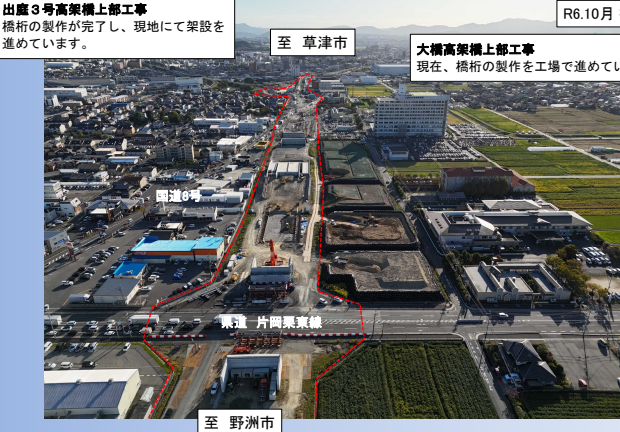


出座3号高架橋橋上工事
橋桁の製作が完了し、現地に架設を進めています。

大橋高架橋橋上工事
現在、橋桁の製作を工場で行っています。

TOPICS 3 野洲栗東バイパス手原高架橋下部他工事、野洲栗東バイパス名神OFFランプ橋上部工事、野洲栗東バイパス手原地区排水構造物他工事、野洲栗東バイパス手原高架橋橋上工事

R6.10月 撮影



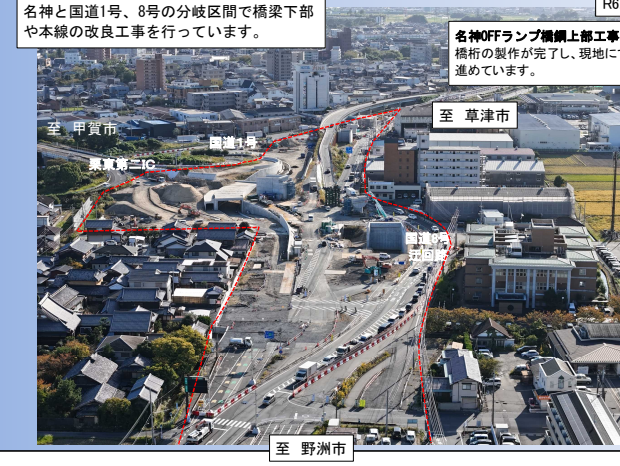


名神と国道1号、8号の分岐区間で橋梁下部や本線の改良工事を行っています。

名神OFFランプ橋上部工事
橋桁の製作が完了し、現地に架設を進めています。



地区名	野洲市	守山市	栗東市
小橋原地区	妙光寺地区	行畑地区	三上地区
延長	1.90 km	0.60 km	2.20 km
道路構造	土工	PC橋	PC橋
至: 竜王町	行畑高架橋	三上高架橋	七間場高架橋
至: 草津市	野洲川橋	出庭高架橋	中ノ井川橋
至: 草津市	大橋高架橋	名神OFFランプ橋	手原高架橋
至: 草津市	至: 草津市	至: 草津市	至: 草津市

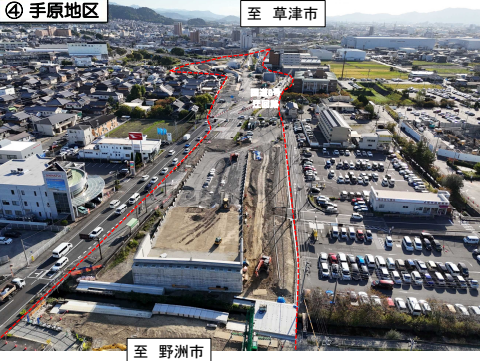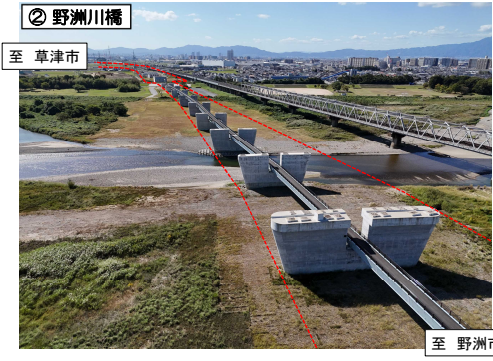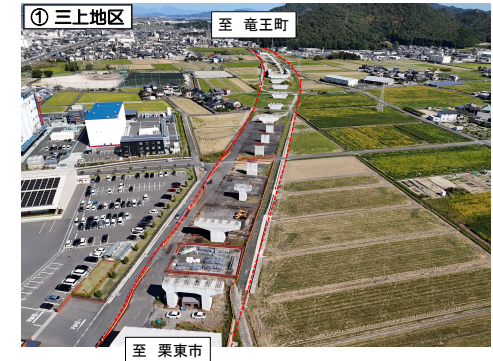

※アスベスト処分量の増加により、令和7年秋全線開通は遅延するものの、工事工程を精査し、できる限り早期に開通できるよう検討してまいります。

令和6年11月



地区名	野洲市										守山市		栗東市																									
小篠原地区	妙光寺地区	行畑地区	三上地区							立入地区		出庭地区				中地区			宅屋地区			大橋地区		手原地区														
延長	1.90 km										0.60 km		2.20 km																		0.36km		0.20km		0.12km			
道路構造	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	鋼橋	鋼橋	鋼橋	鋼橋	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	土工						鋼橋	土工	PC橋	土工	鋼橋	土工		鋼橋	土工							
至：竜王町	行畑高架橋										三上高架橋		七間場高架橋		野洲川橋		出庭高架橋						出庭3号高架橋						中ノ井川橋		大橋高架橋		名神OFFランプ橋		手原高架橋		至：草津市	
凡 例 未着手 発注手続中 施工中 完 成																																						



※アスベスト処分量の増加により、令和7年秋全線開通は遅延するものの、工事工程を精査し、できる限り早期に開通できるよう検討してまいります。

野洲栗東バイパス事業 工事進捗レポート

令和6年12月

TOPICS 野洲栗東バイパス七間場高架橋P32橋脚他工事 アスベストの撤去状況

R6.12月 撮影

橋梁下部工事、改良工事をするため、アスベスト混じり土を撤去処分し、良質土に置き換える作業を進めています。

至 竜王町



至 栗東市

TOPICS 1 野洲栗東バイパス出座西地区面築他設置工事、野洲栗東バイパス中地区道路改良工事 野洲栗東バイパス宅地地区道路改良工事

R6.12月 撮影

至 野洲市



改良工事

路体盛土のための地盤改良工事を進めています。

面築工事

栗東市域の出座地区のボックスカルバートの工事を進めています。

至 草津市

TOPICS 2 野洲栗東バイパス出座3号高架橋橋上上部工事、野洲栗東バイパス大橋北地区築壁設置他工事、 野洲栗東バイパス大橋北地区道路改良工事、野洲栗東バイパス大橋高架橋橋上上部工事、 野洲栗東バイパス手原地区道路構造物他工事

R6.12月 撮影

至 草津市

出座3号高架橋橋上上部工事
上部工の架設が完了し、これから床版工を進めていきます。

大橋高架橋橋上上部工事
橋桁の製作が完了し、現地に架設を進めています。



至 野洲市

TOPICS 3 野洲栗東バイパス手原高架橋下部他工事、野洲栗東バイパス名神OFFランプ橋橋上上部工事、 野洲栗東バイパス手原地区排水構造物他工事、野洲栗東バイパス手原高架橋橋上上部工事

R6.12月 撮影

至 草津市

名神と国道1号、8号の分岐区間で橋梁下部や本線の改良工事を行っています。

名神OFFランプ橋橋上上部工事
上部工の架設が完了し、これから床版工を進めています。



至 野洲市



- 【凡 例】
- : ハーフランプ
 - : フルランプ
 - : 土工
 - : 橋梁
 - : 国道等
 - : 県道・市道等

地区名	野洲市										守山市	栗東市																				
	小篠原地区	妙光寺地区	行畑地区	三上地区						立入地区		出庭地区				中地区	宅屋地区		大橋地区	手原地区												
延長	1.90 km										0.60 km		2.20 km										0.36km		0.20km	0.12km						
道路構造	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	鋼橋	鋼橋	鋼橋	鋼橋	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	土工				鋼橋	土工	鋼橋	土工	鋼橋	土工							
至:竜王町	行畑高架橋										三上高架橋		七間場高架橋		野洲川橋		出庭高架橋				出庭3号高架橋				中ノ井川橋		大橋高架橋		名神OFFランプ橋		手原高架橋	

野洲栗東バイパス事業 工事進捗レポート

令和7年1月

TOPICS 野洲栗東バイパス七間場高架橋P32橋脚他工事 アスベストの撤去状況

R7.1月 撮影

橋梁下部工事、改良工事をするため、アスベスト混じり土を撤去処分し、良質土に置き換える作業が1月末に完了しました。仮設テントの解体撤去作業を進めています。



TOPICS 1 野洲栗東バイパス出庭西地区団集他設置工事、野洲栗東バイパス中地区道路改良工事
野洲栗東バイパス宅屋地区道路改良工事

R7.1月 撮影



TOPICS 2 野洲栗東バイパス出庄3号高架橋鋼上部工事、野洲栗東バイパス大橋北地区擁壁設置他工事、野洲栗東バイパス大橋北地区道路改良工事、野洲栗東バイパス大橋高架橋鋼上部工事、野洲栗東バイパス手原地区道路構造物他工事

R7.1月 撮影



TOPICS 3 野洲栗東バイパス手原高架橋下部他工事、野洲栗東バイパス名神OFFランプ橋鋼上部工事、野洲栗東バイパス手原地区排水構造物他工事、野洲栗東バイパス手原高架橋鋼上部工事

R7.1月 撮影



地区名	野洲市										守山市		栗東市																					
	小椋原地区		妙光寺地区		行畑地区		三上地区				立入地区		出庭地区				中地区		宅屋地区		大橋地区		手原地区											
延長	1.90 km										0.60 km		2.20 km										0.36km		0.20km		0.12km							
道路構造	土工		PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	鋼橋	鋼橋	鋼橋	鋼橋	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	土工				鋼橋	土工	鋼橋	土工									
至：竜王町	行畑高架橋										三上高架橋		七間場高架橋		野洲川橋		出庭高架橋				出庭3号高架橋				中ノ井川橋		大橋高架橋		名神OFFランプ橋		手原高架橋		至：草津市	
	9号等合流部										(市)妙光寺北極線		(市)三上三宅線		野洲線		(県)小島アスベスト撤去		(市)野洲川幹線		(県)守山栗東線				4号 5号 6号 8号 (市)出庭9号 1号 2号 3号 4号 5号 A1 A2 (県)片岡栗東線				OH-OFFランプ A1 A2 (市)大橋基地線		OH-OFFランプ A2 P1 A1 A1 P1 P2 P3 P4 A2 (県)手原			
凡 例 未着手 発注手続中 施工中 完成																																		



※アスベスト処分量の増加により、令和7年秋全線開通は遅延するものの、工事工程を精査し、できる限り早期に開通できるよう検討してまいります。

野洲栗東バイパス事業 工事進捗レポート

令和7年2月

TOPICS 1 野洲栗東バイパス七間場高架橋P32橋脚他工事

R7.2月 撮影

橋梁下部工事、改良工事をするため、アスベスト混じり土を撤去処分し、良質土に置き換える作業が1月末に完了しました。
仮設テントの解体撤去作業が完了しました。



TOPICS 2 野洲果東バイパス出座西地区函渠他設置工事、野洲果東バイパス中地区道路改良工事
野洲果東バイパス宅屋地区道路改良工事

R7.2月 撮影



TOPICS 3 野洲栗東バイパス出度3号高架橋鋼上部工事、野洲栗東バイパス大槻北地区擁壁設置他工事
野洲栗東バイパス大槻北地区道路改良工事、野洲栗東バイパス大槻高架橋鋼上部工事、
野洲栗東バイパス手原地区道路構造物他工事

R7.2月 撮影



TOPICS 4 野洲栗東バイパス手原高架橋下部他工事、野洲栗東バイパス名神OFFランプ橋鋼上部工事、野洲栗東バイパス手原地区排水構造物他工事、野洲栗東バイパス手原高架橋鋼上部工事

R7.2月 撮影



地区名	野洲市										守山市		栗東市															
	小篠原地区		妙光寺地区		行畑地区		三上地区				立入地区		出庭地区				中地区		宅屋地区		大橋地区		手原地区					
延長	1.90 km										0.60 km		2.20 km										0.36km		0.20km		0.12km	
道路構造	土工		PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	鋼橋	鋼橋	鋼橋	鋼橋	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	土工				鋼橋	土工	鋼橋	土工			
至：竜王町	行畑高架橋 三上高架橋 七間場高架橋 野洲川橋 出庭高架橋 出庭3号高架橋 中ノ井川橋 大橋高架橋 名神OFFランプ橋 手原高架橋																											
	9号等合流部 A1 P2 (市)妙光寺北極線 GN-OFFランプ P7 P12 (市)三上宅線 P17 P21 P23 P26 P27 P28 P29 P30 P31 野洲線 P32 P1 歩道橋 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 A2 (市)野洲川幹線 A1 P1 P2 GN-OFFランプ P3 P4 P5 P6 P11 P12 P13 P14 A2 (県)守山栗東線 4号 5号 6号 8号 (市)出庭線9号 1号 2号 3号 4号 GN-OFFランプ 5号 A1 A2 (県)片岡栗東線 GN-OFFランプ A1 A2 A1 A2 (市)大橋基地線 GN-OFFランプ A2 P1 A1 A1 P1 P2 P3 P4 至：草津市																											
凡 例 ：未着手 ：発注手続中 ：施工中 ：完成																												



※アスベスト処分量の増加により、令和7年秋全線開通は遅延するものの、工事工程を精査し、できる限り早期に開通できるよう検討してまいります。

野洲栗東バイパス事業 工事進捗レポート

令和7年3月

TOPICS 1 野洲栗東バイパス七間場高架橋P31橋脚他工事

R7.3月 撮影

橋梁下部工事、改良工事をするため、アスベスト混じり土を撤去処分し、良質土に置き換える作業が令和7年1月末に完了しました。仮設テントの解体撤去作業が令和7年2月末に完了しました。

橋梁下部工事
これからP31橋脚及びON/OFFランプ橋脚の施工を進めています。



TOPICS 2 野洲栗東バイパス出座西地区函渠他設置工事、野洲栗東バイパス中地区道路改良工事、野洲栗東バイパス宅屋地区道路改良工事

R7.3月 撮影



TOPICS 3 野洲栗東バイパス出座3号高架橋鋼上部工事、野洲栗東バイパス大橋北地区擁壁設置他工事、野洲栗東バイパス大橋北地区道路改良工事、野洲栗東バイパス手原地区道路橋造物他工事、野洲栗東バイパス大橋南地区擁壁設置他工事

R7.3月 撮影



TOPICS 4 野洲栗東バイパス手原高架橋下部他工事、野洲栗東バイパス名神OFFランプ橋脚上部工事、野洲栗東バイパス手原地区排水橋造物他工事、野洲栗東バイパス手原高架橋鋼上部工事、野洲栗東バイパス手原南地区道路橋造物設置他工事

R7.3月 撮影



地区名	野洲市										守山市	栗東市																			
	小篠原地区	妙光寺地区	行畑地区	三上地区							立入地区	出庭地区				中地区	宅屋地区			大橋地区	手原地区										
延長	1.90 km										0.60 km		2.20 km										0.38km		0.20km	0.12km					
道路構造	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	鋼橋	鋼橋	鋼橋	鋼橋	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	土工			鋼橋	土工	鋼橋	土工	鋼橋	土工							
至:竜王町	行畑高架橋										三上高架橋		七間場高架橋		野洲川橋		出庭高架橋				出庭3号高架橋			中ノ井川橋		大橋高架橋		名神OFFランプ橋		手原高架橋	
	R8号合流点										歩道橋		歩道橋		歩道橋				歩道橋			歩道橋			歩道橋		歩道橋		歩道橋		
</																															
