


小松拡幅(14工区)事業 工事進捗レポート

令和6年4月

TOPICS 1 小松拡幅北小松トンネル舗装他工事
小松拡幅北小松跨道橋下部他道路改良工事
小松拡幅荻野北地区道路改良工事

R6.4月 撮影

北小松跨道橋の下部工が完成後、上部工のPC桁を架設します。跨道橋が完成すれば、道路改良工事を行います。並行して、トンネル区間は舗装作業を行っています。

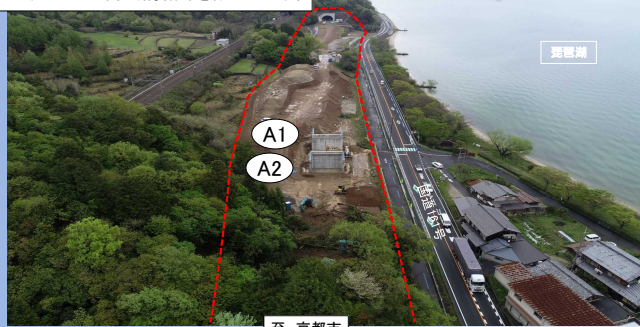

TOPICS 2 小松拡幅荻野北地区道路改良工事、小松拡幅牛山地区改良工事
小松拡幅荻野南地区道路改良工事

R6.4月 撮影


道路改良工事
水路の一部が整備完了しました。引き続き、水路と構造物の整備を進めて、盛土作業を行う予定です。



TOPICS 3 小松拡幅北小松高架橋(P8～P12)PC上部工事
小松拡幅北小松高架橋(P22～A2)PC上部工事

R6.4月 撮影


橋脚上部工事
現在、P8～P12橋脚間の橋梁桁を製作しています。新しく、P22橋脚～A2橋脚間の上部工事の施工準備が始まっています。

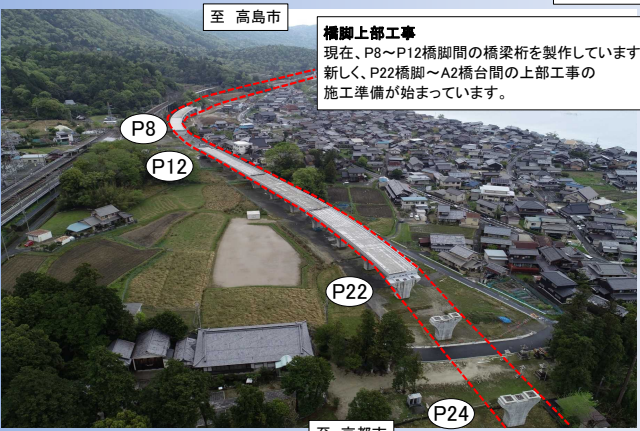

TOPICS 4 小松拡幅滝川橋他PC上部工事
小松拡幅滝川地区改良工事

R6.4月 撮影

今後、滝川橋の拡幅を行い、切り回り道路の整備を行います。

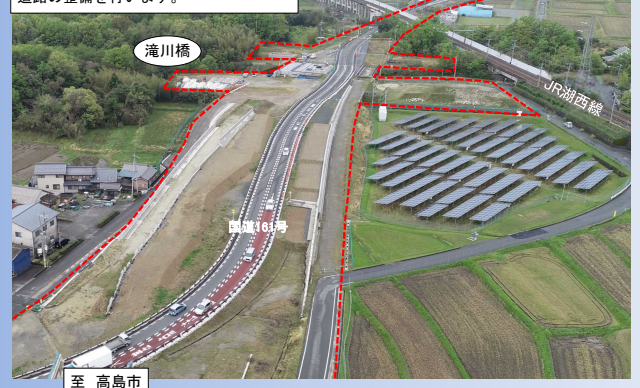

地区名	大津市								
延 長	0.40 km	0.41 km	0.70 km	0.60 km	0.40 km				
道路構造	土工	トンネル	土工	PC橋	土工	PC橋	土工	PC橋	土工



凡 例	：未着手	：発注手続中	：施工中	：完 成
-----	------	--------	------	------

