



○窪田遊水地の工事進捗を視覚的に把握いただくため、第36号よりドローンによる空撮写真を掲載しています！

全景（大和川側）



全景（岡崎川側）



R7大和川窪田遊水地掘削他工事【株式会社 城内組】

掘削工 (ICT)

緑の着色範囲で掘削が完了しています。



迂回道路撤去工



水路工 (1)



工事の進捗



令和8年9月8日時点の進捗

○掘削工 (ICT)

約17,600m³/41,000m³完了。

○迂回道路撤去工



約13,100m³/27,000m³完了。

○水路工 (1)

約130m/260mの底板コンクリート打設完了、70m躯体コンクリート完了。

R 7 大和川窪田遊水地北側周囲堤他工事【株式会社 城内組】

盛土工の進捗

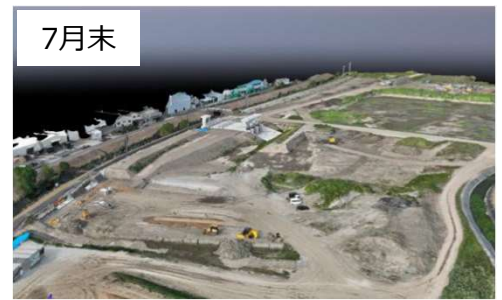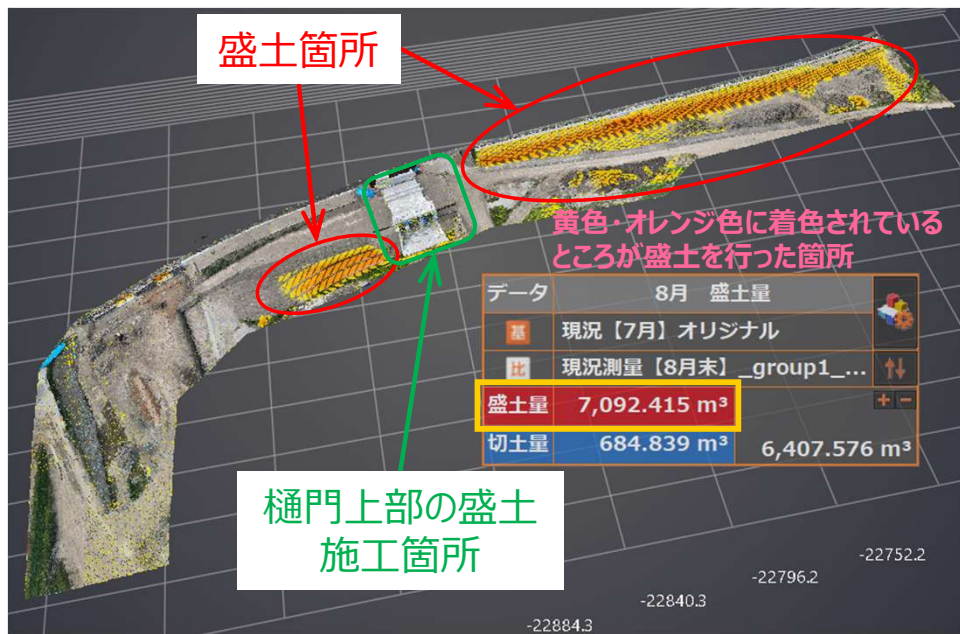

河川土工（盛土工ICT）



盛土施工状況

水道管移設・農水管移設



管布設状況



令和8年8月末日時点での進捗

○河川土工（盛土工ICT）

約7,092m³/46,000m³完了

○水道管移設工・農水管移設工

水道管 270m施工完了

農水管 350m施工完了

○9月8日～樋門上部の盛土施工開始

盛土工 1,000m³、大型土のう 140袋

9月の作業

- : 掘削工(ICT)
- : 土質改良工
- : 盛土工(ICT)
- : 工事用車両ルート

改良
ヤード

工事概要

- ★8月に引き続き掘削した土を改良ヤードに運搬します。
- ★改良した土を盛土場へ運搬、転圧します。



完成予想

R7大和川窪田遊水地内水取込樋門発電機棟他新築工事【昌栄建設(株)】


10月の工事内容

①排水樋門上屋

完了

②発電機棟

屋根、躯体コンクリート型枠解体、
アルミサッシ取付など

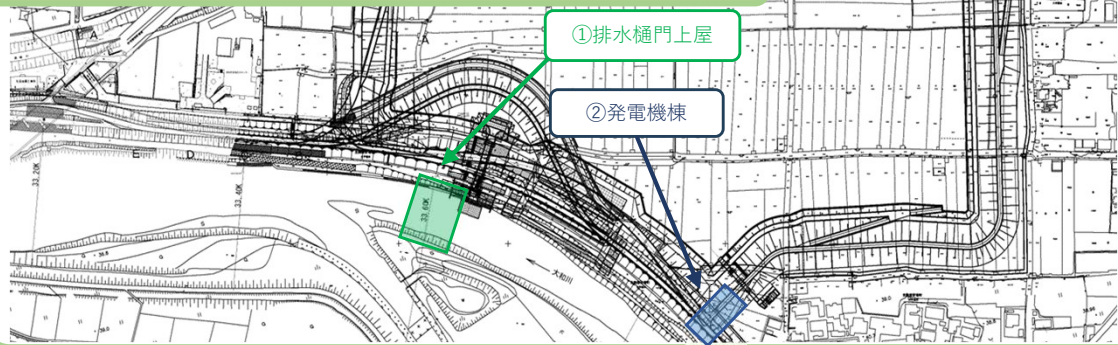

工事の進捗

排水樋門上屋

屋根側面に幕板が付き、屋根の軒裏にボードがつけました。雨が続くため、外部の作業が滞っていますが、この後シーリング充填の後、塗装です。



工事名 R7大和川窪田遊水地内水取込樋門
発電機棟他新築工事
工 種 屋根および
測 点 樋門上屋
幕板
完了



工事名 R7大和川窪田遊水地内水取込樋門
発電機棟他新築工事
工 種 内外装工事
測 点 樋門上屋
ケイ酸カルシウム板
完了
2024/09/11

発電機棟

躯体の壁の鉄筋組立、および型枠の組立てです。梁や屋根もコンクリートで打つため、内部には写真のように足場を組み、下から型枠を受ける土台(支保工)を立てます。この後梁、屋根の型枠、鉄筋の組立てが終わるといよいよコンクリート打設です。



工事名 R7大和川窪田遊水地内水取込樋門
発電機棟他新築工事
工 種 鉄筋工事
測 点 発電機棟
発電機室壁配筋完了
W18
2024/09/04



工事名 R7大和川窪田遊水地内水取込樋門
発電機棟他新築工事
工 種 型枠工事
測 点 発電機棟
支保工組立状況
2024/09/04
