


■国道168号折立橋応急復旧工事について

- ・台風12号の影響により落橋した国道168号折立橋の応急復旧工事については、9月16日(金)に国土交通省近畿地方整備局が着手しました。
- ・現在、一部既存の橋梁を活用し、流出・損壊した部分については仮設の橋(仮棧橋)をかける工事を実施しています。
- ・できるだけ早く折立橋が応急復旧できるよう24時間体制で施工を実施し、10月末の開通を目指しています。

■落橋した折立橋

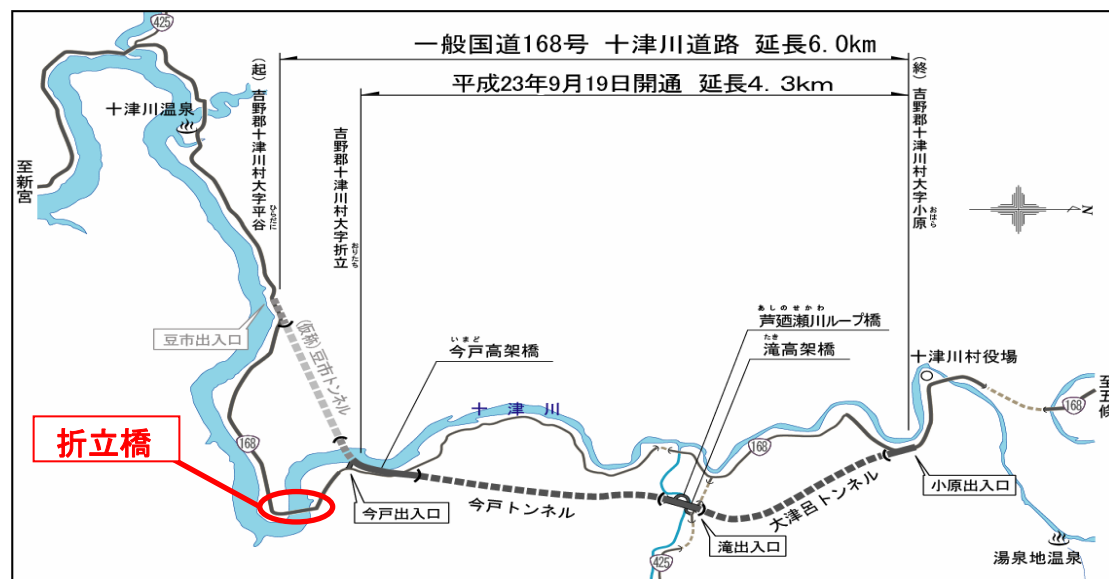


■位置図



国道168号折立橋応急復旧工事進捗状況

<10月6日現在 工事進捗状況>

- 工事用道路3号橋仮橋設置完了<箇所③>
- 折立橋右岸ヤード造成完了、大型土のう据付・地覆処理完了<箇所④>
クローラークレーン折立橋右岸ヤードへ移動完了、敷鉄板敷設、ブーム組立<箇所④>

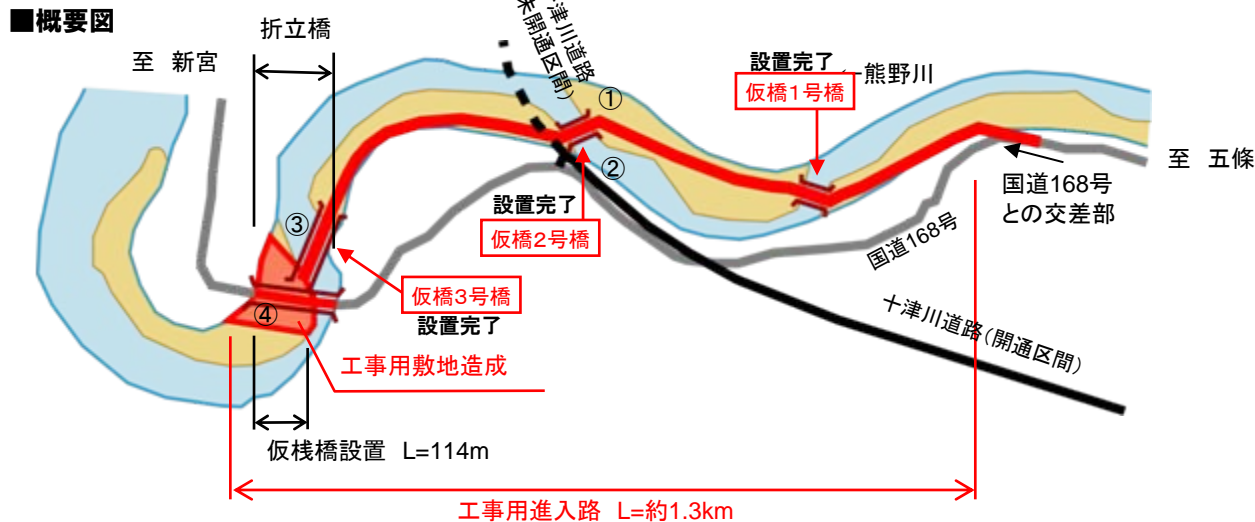


工事用道路3号橋仮橋設置完了<箇所③>



クローラークレーン折立橋右岸ヤードへ移動完了
敷鉄板敷設、ブーム組立<箇所④>



■仮橋橋平面図 (箇所④)

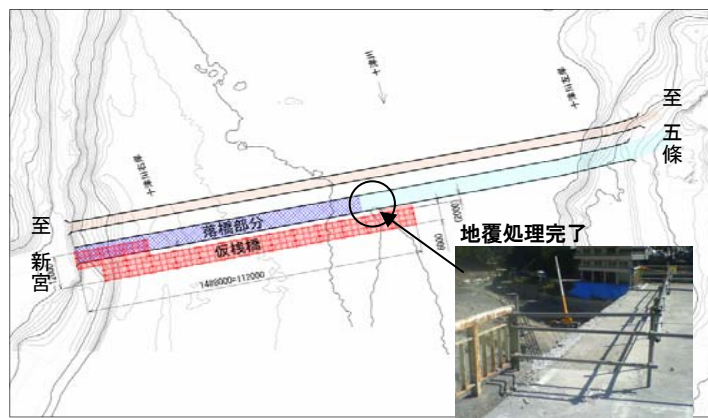

■工程表

9/16着手

		9月		10月		11月	
		10	20	10	20	10	20
準備工	測量・調査・調達		5日				
工事用道路	設置・撤去			16日			15日
橋梁撤去	A1~P1落橋部			15日			
仮橋橋設置					24日		
舗装・取合工						4日	
片付け							5日

10月末仮橋橋完成予定
