


大津信楽線付替工事ニュース

平成27年 2月 16日

工事名：桐生地区工事用進入路整備工事

【平面図】

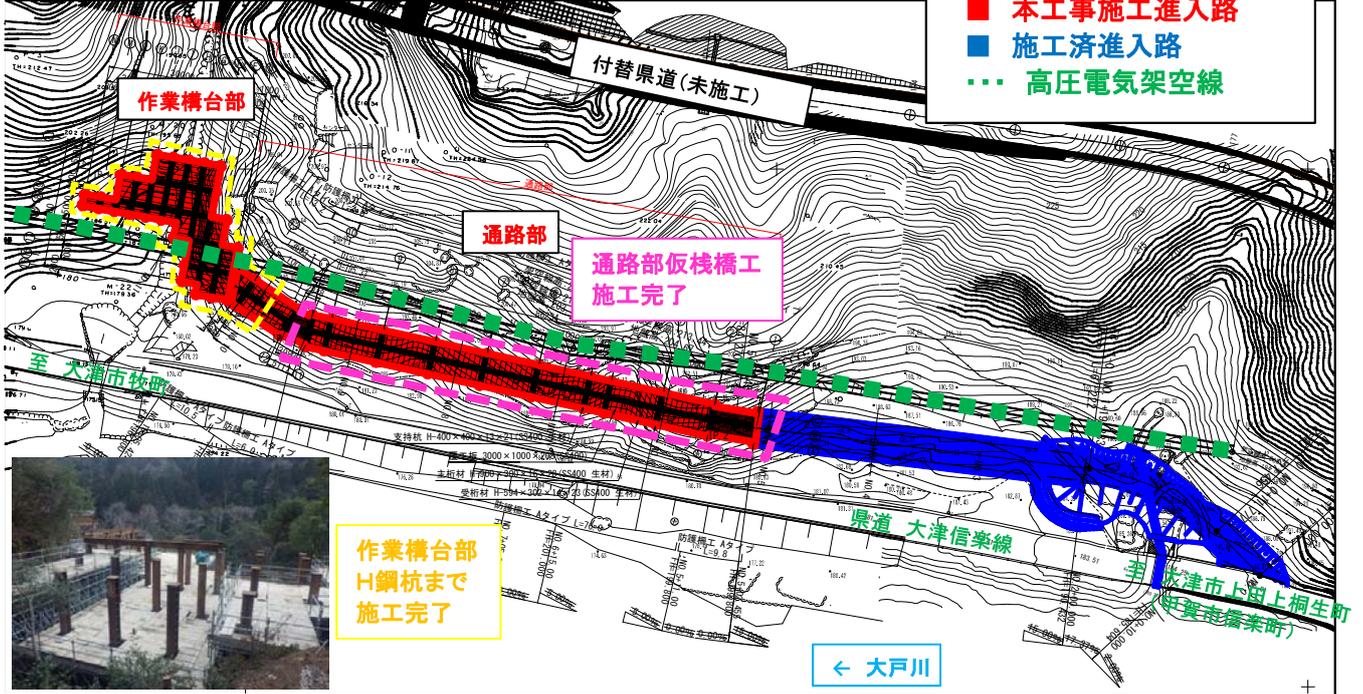

凡例

- 本工事施工進入路
- 施工済進入路
- 高圧電気架空線

● 県道沿いの仮囲いを撤去しました。



現在県道は通行止め期間ですが、路側部に設置していた仮囲いを撤去しました。

● 作業構台部のH鋼杭の作業が完了し、今後は足場の解体⇒仮栈橋工の架設作業へと進みます。



H鋼杭頭部の処理を行いました。



【工程表】

作業内容	平成26年						平成27年		
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備工		計画・測量	伐採工				←→		
落石雪害防止工 落石防止柵設置、撤去			移設				大津信楽線通行止め 1/19～2/27		
仮橋・仮栈橋工 通路部									
作業構台部									
後片付け									
片側交互通行規制予定期間							←→		

※ ホームページで工事の状況等を配信しています。
<http://ntamamura.wix.com/daidogawakiryuu>


施工者 株式会社 桑原組
現場事務所 住所 大津市上田上桐生町地先
TEL 077-549-2150
FAX 077-549-2165

大津信楽線付替工事ニュース

平成 27年 2月 16日

工 事 名 大津信楽線新8号橋他工事

●現在 新7号橋では、P1橋脚部の軽量盛土工の基礎工、新8号橋では、A2橋台のコンクリート躯体コンクリート打設が完了し養生を行っています。

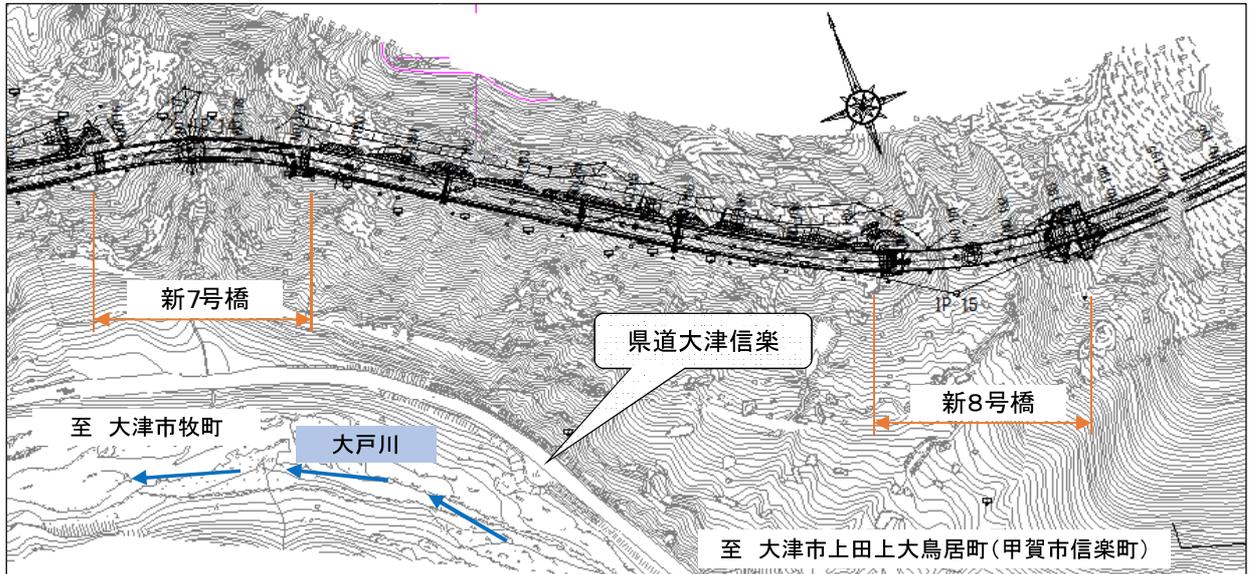

【新8号橋】



○橋台のコンクリート打設が完了しました。
外部足場を解体してから、2月下旬に擁壁工に着手します。

【新7号橋】



○P1橋脚部の掘削作業が完了し、軽量盛土（FCB工法）の基礎工に着手しました。
2月20日頃から、軽量盛土に着手します。


【工程表】

工 種	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備工	■						
8号橋A2橋台		■	■	■	■	■	■
7号橋P1橋台			■	■	■	■	■
後方付け							■

請 負 者 名 株式会社 松浦組 住 所 大津市逢坂一丁目13-12
現場事務所 TEL 077-549-2207

工事名:黄瀬地区道路改良工事

当工事は、今月2月27日をもって完了いたします。
徹底した安全管理のもと施工を行った結果、無事故無災害で完了することが出来ました。
地域の皆様方には、色々ご協力いただき、誠にありがとうございました。

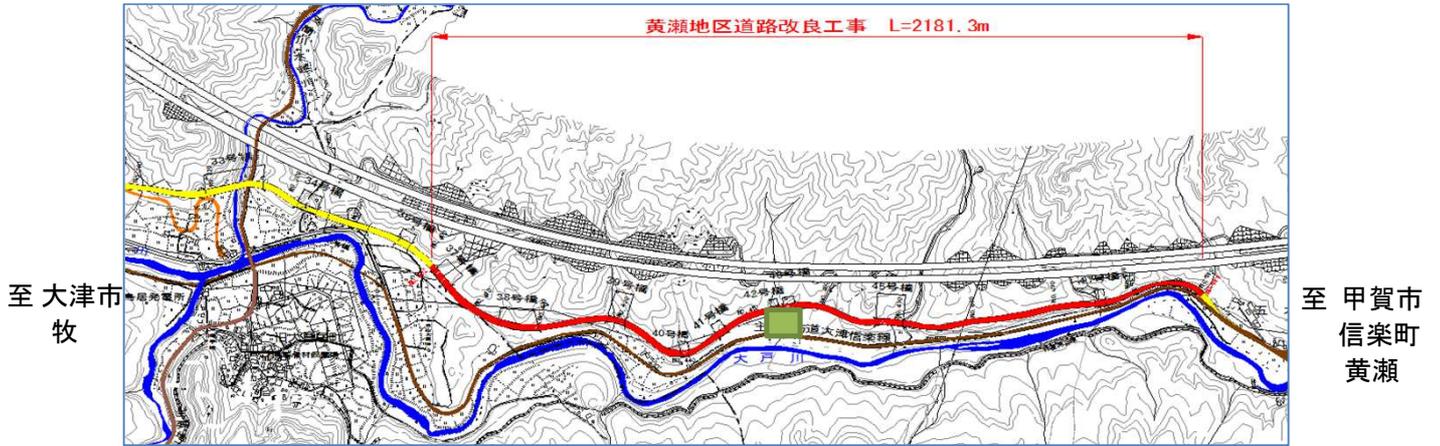

— 施工箇所 — — 大戸川 — — 県道大津信楽線 — ■ 現場事務所

【着工から完了までの流れ】



請負会社 高島鋳建 株式会社 現場担当者 藤掛 竜也(現場代理人) 岡山 貴史(監理技術者)
TEL 080-1426-5914 TEL 090-1718-9002

大津信楽線付替工事ニュース

平成27年2月16日

工事名:大戸川ダム管内護岸補修工事

〈工事の進捗〉

- ・【7工区】:12月26日(金)より始めた7工区の大型ブロック積みが完了し、天端調整コンクリートの施工と両端のすり付け石積みを施工しています。
- ・【2工区】:2月2日(月)より、護岸復旧の為の仮設進入路を設置しています。

〈今後の予定〉

- ・【7工区】:引き続き、護岸復旧作業(天端調整コンクリート、下流端、上流端を雑割石によるすり付け石積み)を行います。
- ・【2工区】:仮設進入路設置完了後、法面補強工の施工を行います。



【2工区(桐生地区)の作業状況】



着工前
(上の写真)

護岸復旧のため
仮設進入路を
設置しています。
(右の写真)



【工程表】

	2月	3月	4月	5月	6月	7月	備考
(2工区)							
準備工	■						
仮設工	■				■		
法面補強工		■	■	■	■		
後片付け					■	■	
(7工区)							
仮設工		■					
擁壁工	■						
舗装工		■					

【7工区(大鳥居地区)の作業状況】



着工前
(左の写真)

大型ブロックの天
端調整コンクリート
の施工を行って
います。
(下の写真)



請負者:(株)大同
現場担当者: 大谷 信仁(現場代理人)
TEL: 090-8932-7433

現場事務所:滋賀県大津市上田上大鳥居地先
TEL: 077-549-2703
FAX: 077-549-2703

大津信楽線付替工事ニュース

平成27年2月16日


工事名：大津信楽線落石対策工事

工期：平成26年10月23日～平成27年3月20日

工事概要：落石雪害防止工 根固め工 9m³、落石防止網工 ロープ伏 636m² ロープ掛 186m

落石防止柵工 528m、小割除去工 27m³、仮設工 落石防止柵工 88m モノレール工 1,657m

【施工位置図】

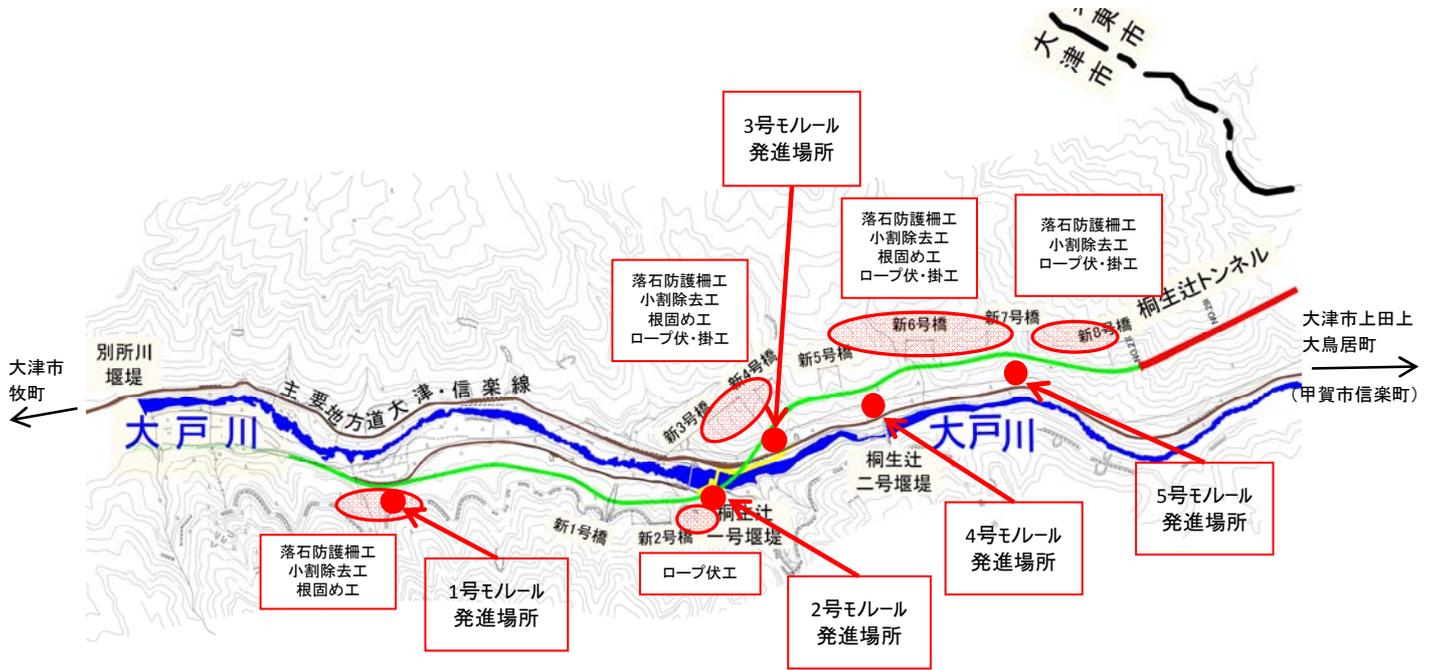

ワイヤー固定用 アンカー削孔

転石をワイヤーで固定

ワイヤー設置完了



【工事説明】

当工事は大津信楽線付替工事に伴う落石対策工事です。

上記写真(ロープ伏工)は法面上に点在する落下の恐れのある転石をワイヤーロープを格子状に張付け固定し落石を防ぎます。今後はワイヤーロープで転石を固定する落石防止網工(ロープ伏工、ロープ掛工)および落石による災害を防ぐ落石防護柵工の施工を行っていきます。

工事中はご不便をお掛けすることがあると思いますが、何卒ご理解の上ご協力お願い致します。

【工程表】

作業内容	H26年			H27年		
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備工						
根固め工						
ロープ伏工						
ロープ掛工						
落石防護柵工						
小割除去工						
仮設工 落石防護柵工						
モノレール工						

施工者
現場事務所 住所
電話番号

イビデングリーンテック(株)関西支店
大津市上田上桐生町地先
TEL、FAX 077-549-0202

大津信楽線付替工事ニュース

平成27年2月16日


工事名：大津信楽線新3号橋工事

【工事概要】


- | | |
|---------------|--------|
| ○橋梁上部工 | ○橋梁下部工 |
| PC片持箱桁橋工 | 道路土工 |
| 橋梁付属物工 | RC橋脚工 |
| コンクリート橋足場等設置工 | 擁壁工 |
| 仮設工 | 構造物撤去工 |
| | 仮設工 |

【工期】 平成26年12月25日～平成28年10月31日

【平面図】

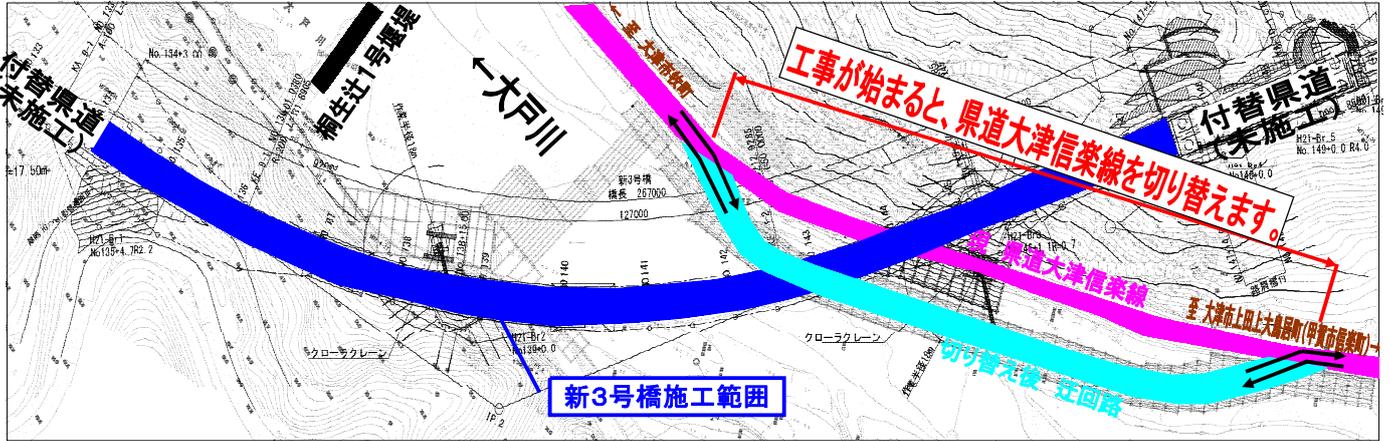

【側面図】

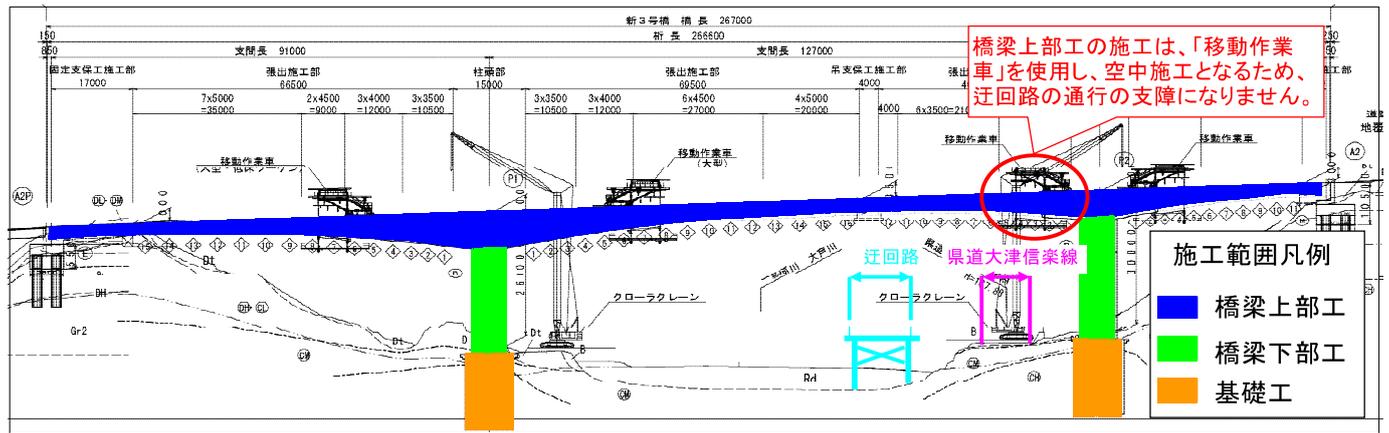

【完成イメージ】



【工程表】

作業内容	平成27年												平成28年									
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
準備工	■	■																				
橋梁上部工													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
橋梁下部工			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
後片付け工																						■
その他	↔ 迂回路切り替え4月初旬予定																					

施工者：川田建設株式会社
 現場事務所：大津市上田上桐生町地先(予定)
 TEL：080-5986-6203
