


大津信楽線付替工事ニュース

令和元年9月18日



パツパツは
QRコードを読み
込み大戸川が工
事事務所HPへ

工事名：大津信楽線左岸部道路改良その他工事
当初工期：平成30年3月29日～平成31年2月28日
変更工期：～令和元年12月26日

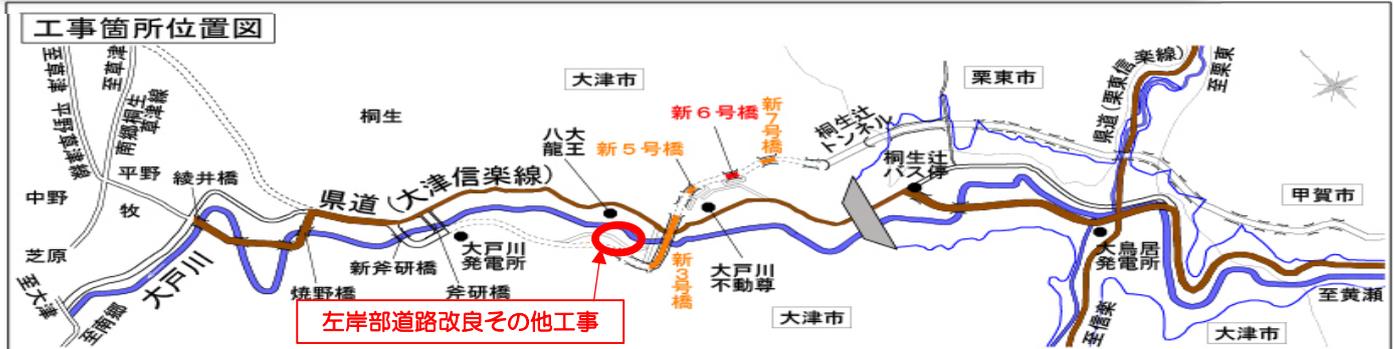

工事進捗

現在、地中に大量の転石層が出現したため、杭打ち作業が難航しています。
9月末に支持杭工を完了し、10月からはアーチカルバート工を開始します。

施工状況写真



現場代理人から一言

地下にある目に見えない転石が機械に引っ掛かって非常に難航しています。
トライアンドエラーを繰り返しながら、安全に少しでも早く工事が完了できるように努力します！！

現場代理人
森田 圭一



大津信楽線付替工事ニュース

令和元年09月18日



バックナンバーはQRコードを読み込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線桐生地区道路改良その他工事
工期：平成30年12月28日～令和元年11月30日

9月



「大津信楽線桐生地区道路改良その他工事」は、据付コンクリート及び補強土壁工(5段目)を施工中です。

【現在の作業】・補強土壁5段目設置 【今後の予定】・補強土壁工(5段目)背面コンクリート・アンカー削孔・設置
作業足場設置形状



涼しくなりました！まだまだ残暑もあり、天気の急変に注意が必要だよ。御安全に！

現場代理人の声



株式会社 内田組

【現場事務所】 滋賀県大津市上田上桐生町地先
【電話】 077-549-3911
【FAX】 077-549-3911



大津信楽線付替工事ニュース

令和元年9月18日




バックナンバーはQRコードを読み込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新4号橋下部その他工事

工期：令和元年6月25日～令和2年3月20日

【付替県道 新4号橋の橋台を2基と場所打擁壁（L型擁壁）を施工します。】

9月

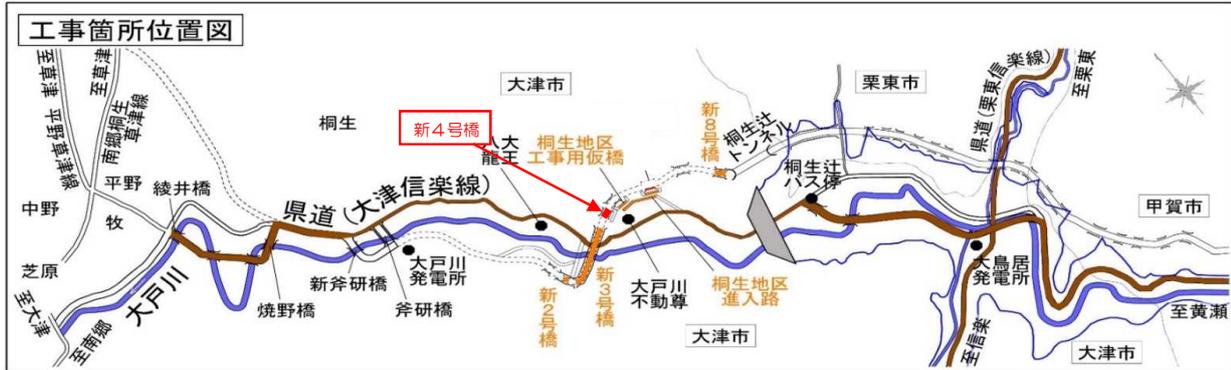

現場位置図



【工事の進捗】 A1橋台の床掘が完了しました。 【今後の予定】 9月下旬より深礎工を進めていきます。

A1橋台 床掘完了

盆休暇前に伐採が完了し、盆明けから床掘を開始しました。床掘は小型バックホウと大型バックホウを併用し、作業を進めました。



作業状況

A2橋台 仮設工（土留・仮締切工 土留 H鋼親杭打設）

こちらも盆明けから土留・仮締切工のH鋼親杭の打設を行っています。地盤に外径φ600の削孔を行い、H鋼親杭（最長L=15.0m）を建て込んでいきます。転石が多く確認され苦労して施工を行っていますが、所定の間隔や深さを守り施工して



現場代理人のコメント

9月に入っても日中は厳しい暑さとなっています。また秋雨前線や台風の影響により降雨が例年より多くなっています。安全第一で作業を進めてまいりますので、工事へのご理解、ご協力を頂きますようお願い致します。

請負者：西村建設株式会社

現場代理人：森本 順

携帯電話：080-9302-8898

現場事務所：大津市上田上桐生町地先

事務所TEL：077-549-0100

西村建設株式会社
NISHIMURA CONSTRUCTION CO., LTD.
