

大津信楽線付替工事ニュース

令和3年1月15日




バックナンバーは
QRコードを読込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津信楽線新2号橋下部その他工事

工期：令和元年9月19日～令和3年2月1日

【付替県道 新2号橋の橋台を1基と、補強土壁を施工します。】

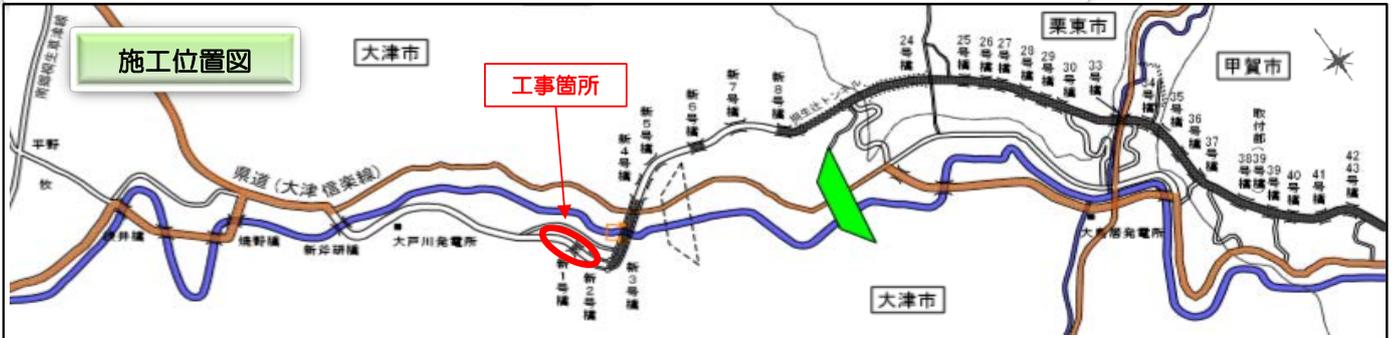

軽量盛土材(スーパーソル)とは

スーパーソルは廃ガラスを焼却発泡して製造された盛土材で、土の1/5~1/6程度の重さの非常に軽い盛土材です。本工事では下部にある構造物「かご砕工」の重さを軽減するため使用しています。

工事進捗

12月末撮影



3号・4号補強土壁が完成し新2号橋と道路がつながりました。
法面処理：下部のかご砕工が完成し、上部の法面を施工しています。

今後の予定



アーチカルバート坑口の法面処理完成後、道路側溝及び、ガードレールを施工し、1月末に弊社の工事範囲は完成となります。
県道16号の大型車両の通行時等、皆様には協力をお願いありがとうございました。

安全第一

新年度で完成させてます



株式会社 内田組

【現場事務所】 大津市上田上桐生町地先

【電話】 077-549-3356

【FAX】 077-549-3356

大津信楽線付替工事ニュース

令和3年1月15日



バックナンバーは
QRコードを讀込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

1月

工事名：大津信楽線新4号橋・新5号橋間道路改良その他工事

当初工期：令和2年3月4日～令和3年2月28日

(道路の基礎となる擁壁を設置します。)

工事箇所位置図

大津市



新4号・新5号橋間改良その他工



新4号

新5号橋

擁壁工掘削完了



重力式基礎型枠組立状況



重力式基礎コンクリート打設状況



巨大な転石の処理もなんとか完了し、重力式基礎も打設することができました。
残すところ2ヶ月となりました。完成に向けて工事を進めてまいりたいと思います。

重力式基礎コンクリート完成



現場代理人コメント

朝は、仮設通路も凍結するような寒さとなっています。また、コロナも増えてきている中、感染防止対策しながら引き続き安全作業で頑張ります。

現場代理人
笠巻 慎也



八田建設株式会社

【現場事務所】 滋賀県大津市上田上桐生町地

【電話】 077-549-0151

【FAX】 077-549-0155

大津信楽線付替工事ニュース

令和3年1月15日




バックナンバーはQRコードを読み込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新4号橋上部工工事
工期：令和2年2月18日～令和3年7月30日

1月

工事箇所位置図

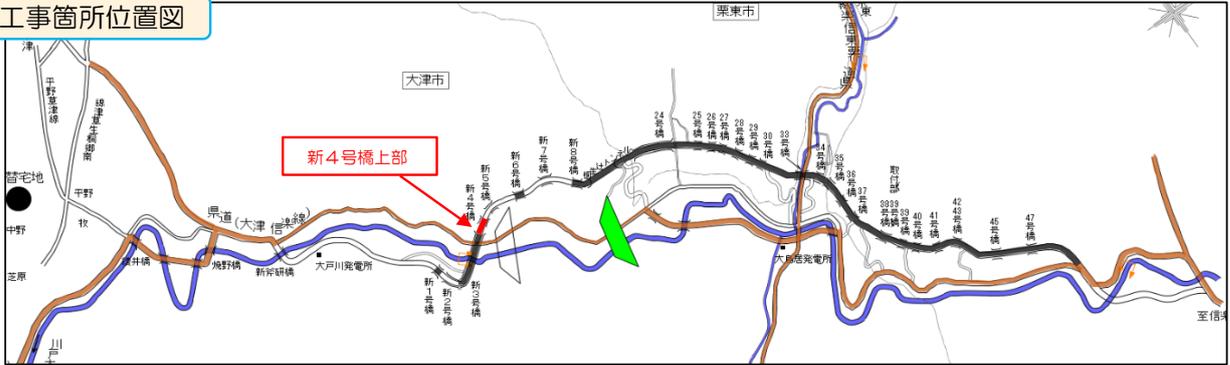

現場位置図



現場の進捗状況

PC箱桁製作工の一次施工範囲の鉄筋・型枠の組立が終わり、1月14日に一回目のコンクリート（約190m³）の打設を予定しています。場内の整理整頓に努め、周囲に十分気を付けて施工を行います。



現場代理人のコメント

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願ひ申し上げます。年末から年始にかけ、新型コロナウイルス感染症拡大しておりますが、感染防止対策を徹底しながら、工事は順調に進行しております。安全第一で作業いたしますので、ご理解・ご協力を宜しくお願ひ致します。



請負者：昭和コンクリート工業(株)
現場代理人：渡邊泰全
携帯電話：080-4064-1368

現場事務所：大津市上田上桐生町地先
事務所TEL：077-549-2370

大津信楽線付替工事ニュース


令和3年1月15日



バックナンバーは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道大津信楽線上流区間他舗装その他工事
工期：令和2年11月18日～令和3年3月10日

1月

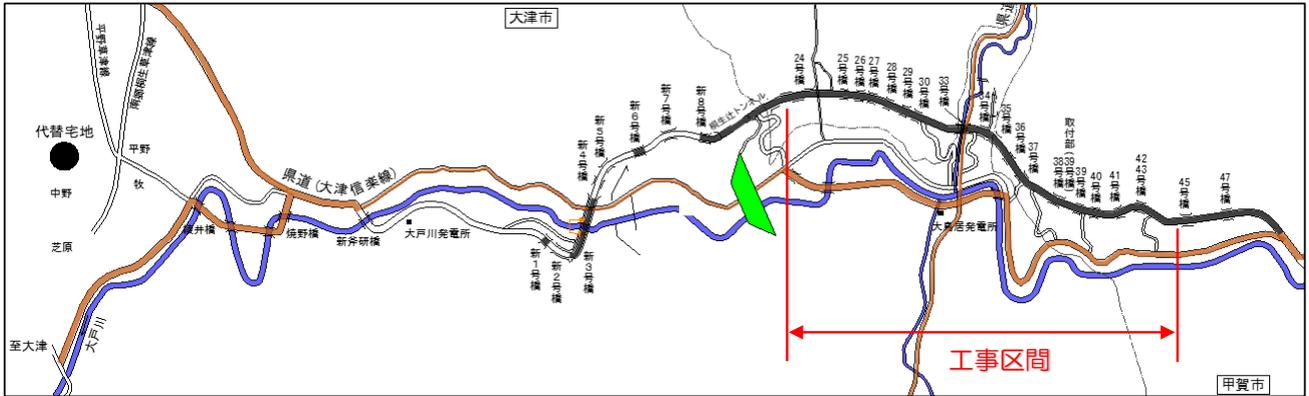


現在の状況



図面（標準横断図）

土工部
NO. 364

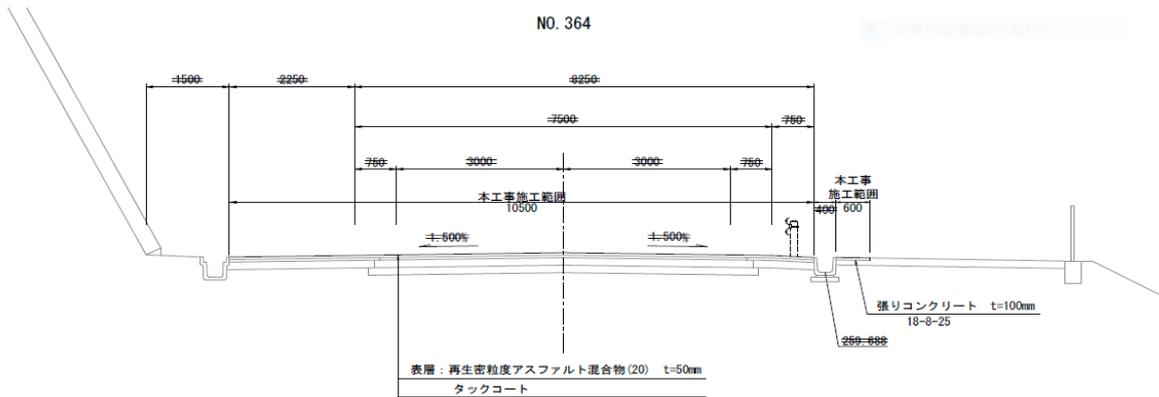

現場代理人コメント

1月になり冬本番の季節になりました。当工事においては、新型コロナウイルス対策を行い、本格的に工事に取り掛かっています。極寒の中での施工となりますが、当作業所がチーム一となり、安全第一で乗り越えたいと思います。また、2月に入りますと舗装工事を開始する為、工事車両の出入りが頻繁になりますが、交通には十分配慮して通行いたしますので、皆様方のご理解、ご協力の程よろしくお願い致します。



請負者：近江道路土木(株)
現場代理人：増田晋一
携帯電話：090-3651-9347

現場事務所：甲賀市信楽町黄瀬3315番地

大津信楽線付替工事ニュース


令和3年1月15日



バックナンバーは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津信楽線新7号橋上部工工事
工期：令和2年1月16日～令和3年2月28日

1月

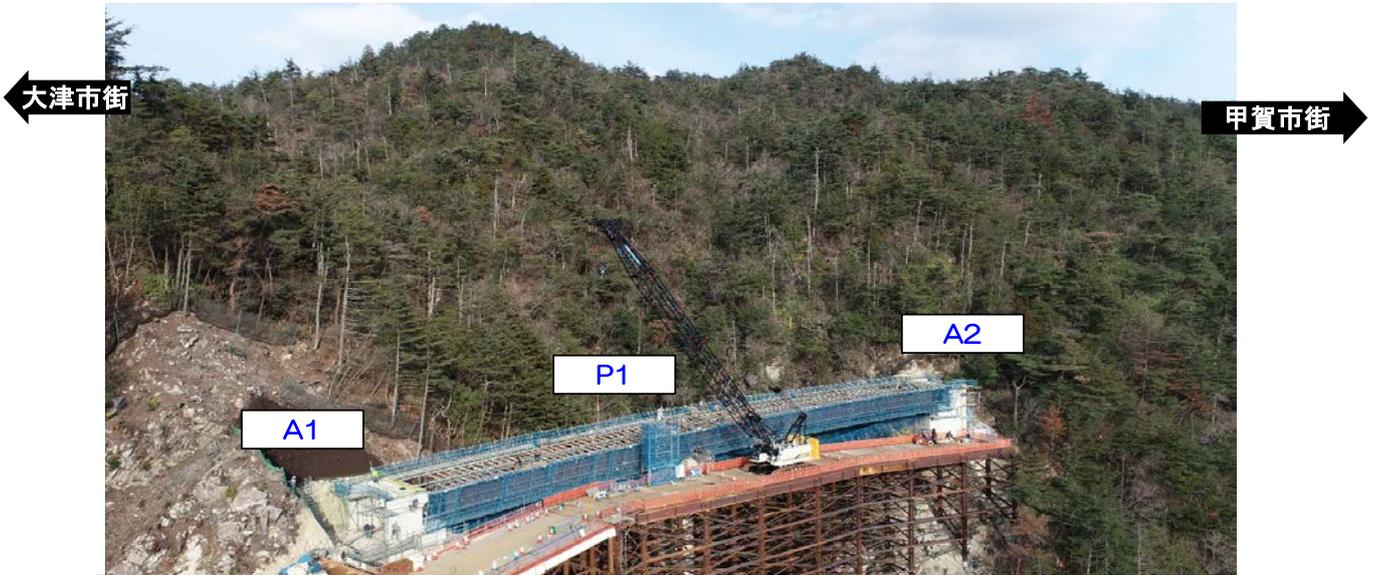

現在の状況


現場代理人コメント



現場では桁の架設作業も終了し
現在2月の下旬、コンクリート打設
を目標に型枠組立作業を行っています。
冷え込みが一段と進む中、コロナ、
インフルエンザ対策と健康管理に留
意し安全第一で進めています。

現場代理人 鶴田 政宏

現在の作業：橋げたの床版コンクリートの施工を進めています。
今後の予定：床版工、壁高欄工、伸縮装置工、転落防止柵工
を予定しています。

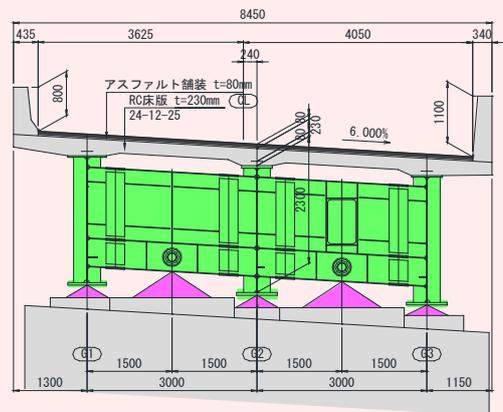

KH 株式会社 駒井ハルテック
KOMAIHALTEC Inc.

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上桐生町地先
077-549-2546
077-549-2547

大津信楽線付替工事ニュース

令和 3年1月15日



バックナンバーは
QRコードを読み
み大戸川ダム工事
事務所HPへ



工事名：大戸川ダム付替県道新7号橋・新8号橋間道路改良その他工事
工期：令和2年11月7日～令和3年11月19日



【現在の作業】測量・調査・仮設関係

【今後の予定】11号補強土壁—1月中に補強土壁材料を搬入し、2月より補強土壁の据付と路体・路床盛土を行います。

工事現場の施工状況

監理技術者のコメント



この度、工事を施工させていただきます(株)大山建設です。急峻な地形での作業となりますが、安全第一に進めてまいります。今後とも宜しくお願いいたします。

監理技術者
米田 剛



OhyAMA (株)大山建設

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上桐生町地先
077-549-1700
077-549-1705

大津信楽線付替工事ニュース


令和3年1月15日



バックナンバーは
QRコードを載込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津信楽線左岸下流道路改良工事
工期：令和2年7月7日～令和3年2月26日

1月

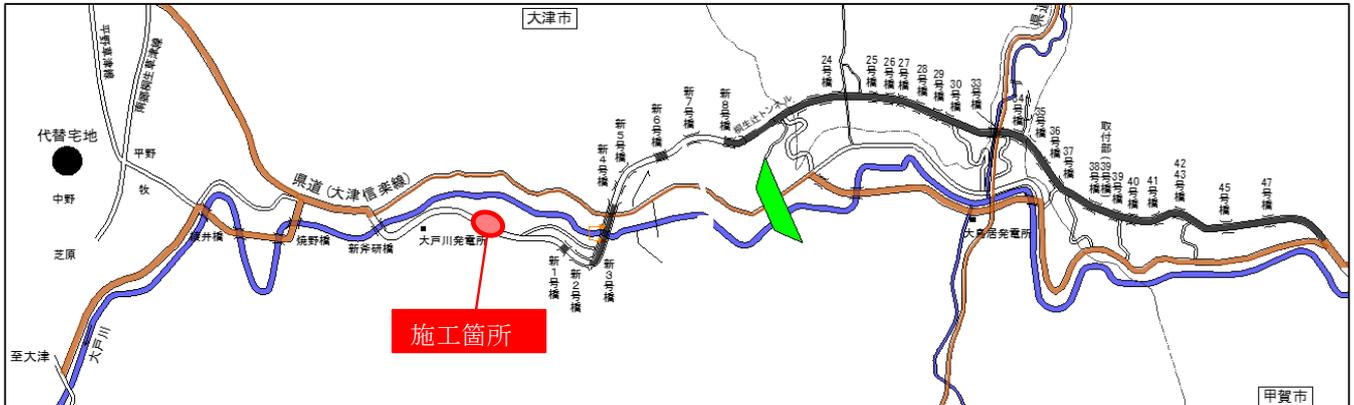

1号補強土壁の笠石コンクリートと、排水構造物工(集水桝、台付管)の施工をしています。

現場代理人のコメント



1号補強土壁 笠石コンクリート施工状況



排水構造物(台付管)施工状況

1号補強土壁の笠石コンクリート(型枠、鉄筋)組立作業、排水構造物(集水桝、台付管)の施工を行っています。
寒いが続きますが、引き続きコロナ対策を徹底し、安全作業で現場を進めてまいります。

現場代理人
山口 博孝



OnyAMA 株式会社 大山建設

【現場事務所】
【電話】
【FAX】

滋賀県大津市上田上牧町1131
077-549-0583
077-549-0583

大津信楽線付替工事ニュース 令和3年1月15日



バックナンバーは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津信楽線新5号橋・新6号橋間他道路改良その他工事
工期：令和元年10月17日～令和3年2月28日

1月



起点側、終点側からの現場状況をドローンで撮影しました。9号補強土壁工施工中。新7号A1橋台は完了しました。

工事写真

9号補強土壁工は発泡スチロールブロックを積重ね、壁面はパネルを設置し、高さ3m毎に床版コンクリートを打設します。



発泡スチロールブロック設置状況。



壁面のパネル設置状況。



1層の発泡スチロール、パネル設置完了。



高さ3m毎に床版コンクリート打設。




発砲スチロールブロックは軽いので工場から現場までの運搬は4tの箱車を使用しています。搬入された材料は、施工箇所が高所のため、クレーンで材料を荷揚げしています。発砲スチロールブロックの量が多いため搬入管理に苦慮しています。

監理技術者
より一言



大寒波の到来で日本海側は大変な大雪になっています。現場は朝晩の冷え込みが厳しく体調管理に気を付けています。最後まで、気を緩めず安全第一で作業員一同頑張ります。

松尾建設株式会社



【現場事務所】 滋賀県大津市上田上桐生町地先
【電話】 077-549-1070
【FAX】 077-549-1075
監理技術者 秋村 智詩
