


加古川中流部緊急治水対策(加東市滝野地区)

更新箇所:赤文字


【R7年5月末時点】

～度重なる浸水被害に対して、重点的な治水対策を実施～

- 度重なる浸水被害に対して、平成29年度から、加古川中流部の加東市滝野地区(河高・下滝野・上滝野地区)を緊急対策特定区間に設定し、重点的に築堤や川の掘削を実施し、概ね10年間で平成16年洪水(台風第23号)と同規模の洪水に対する浸水被害の早期軽減を図ります。
- このうち、特に近年浸水頻度が高い河高・下滝野地区については、平成29年度から概ね5年間(令和3年度)で整備するとともに、5か年加速化予算を活用することで、滝野地区全体の完成を令和7年度を目標に事業を推進します。

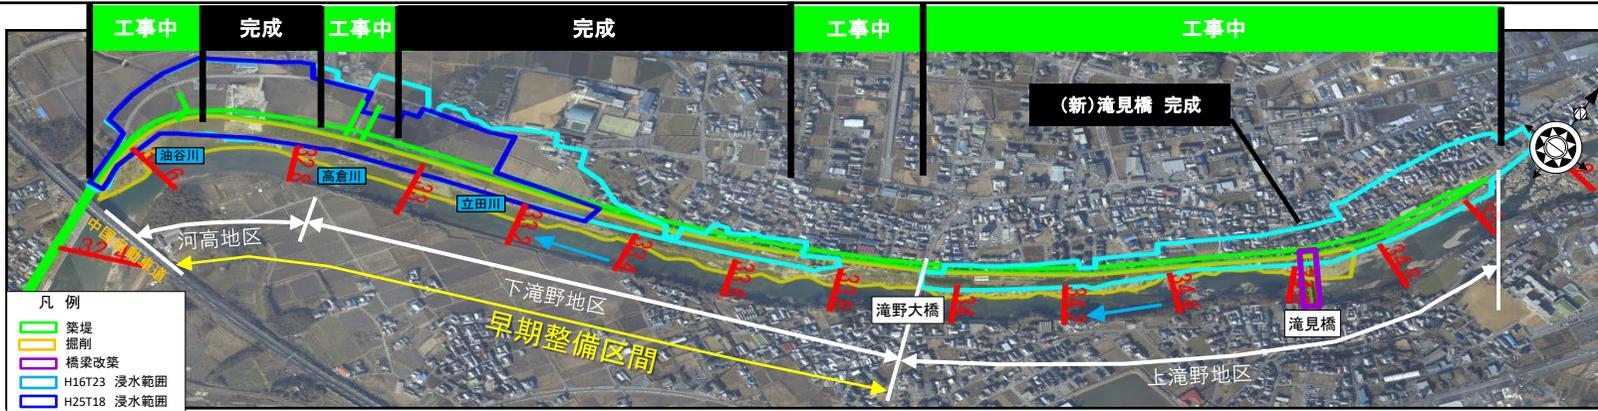

計画断面図



工事概略工程

地区	年度	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
河高	築堤										
下滝野	掘削										
上滝野	橋梁改築(旧橋撤去完了)										
	掘削										
	築堤										
	R3概成										

R7年度完成を目標に事業推進

事業進捗

河高・下滝野地区(早期整備区間)

河高・下滝野	進捗率
用地取得	100%
築堤	98% (概成)
掘削	100%

早期整備区間である油谷川、高倉川、滝野大橋下流の一部は令和4年3月末に概成しており、治水安全度は確保しています。令和6年度も概成箇所の整備を継続して行います。



上滝野地区


上滝野	進捗率
用地取得	100%
築堤	25%
掘削	77%
橋梁改築(新橋) 旧橋撤去	100% 撤去完了

R4年度から滝野大橋上流で築堤護岸を施工。R7年度も継続して整備を進めます。




※現時点での予定であり、今後の状況により随時更新します。
各地区の完成状況は、次年度の出水期までに機能効果を発現する予定です。

整備前

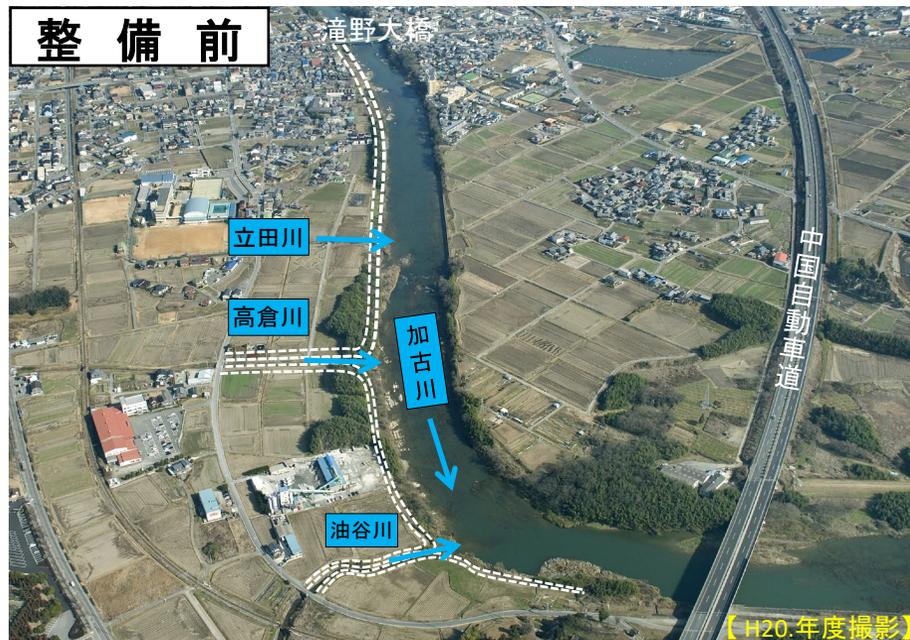


河高地区 工事实施状況

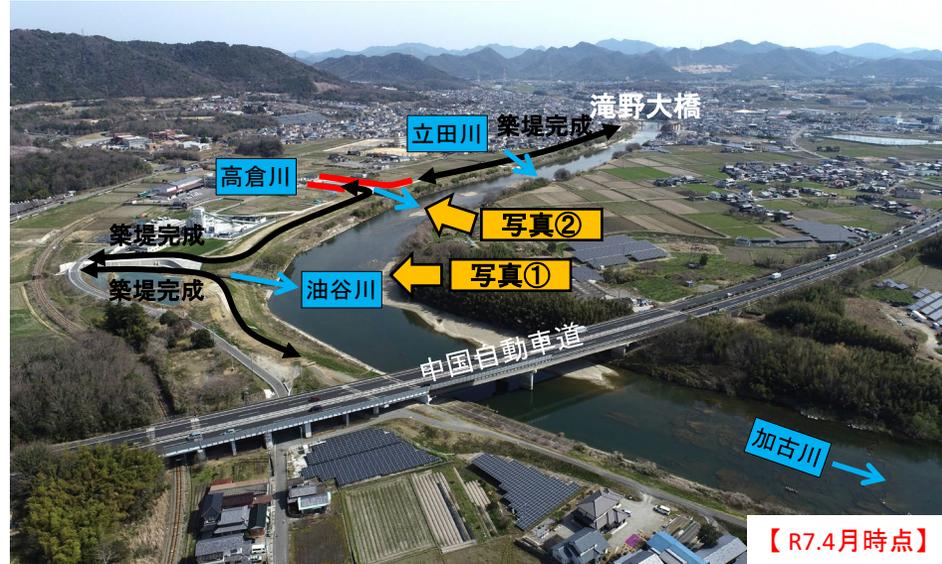


写真①(河高地区 工事实施状況)

起点側の築堤工事

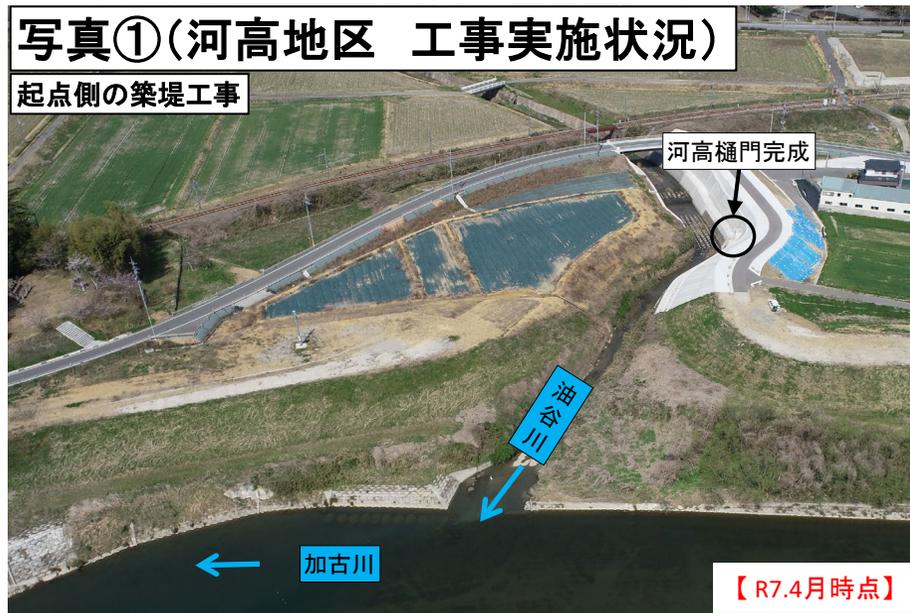

写真②(河高地区 工事实施状況)

高倉川バック堤の築堤工事

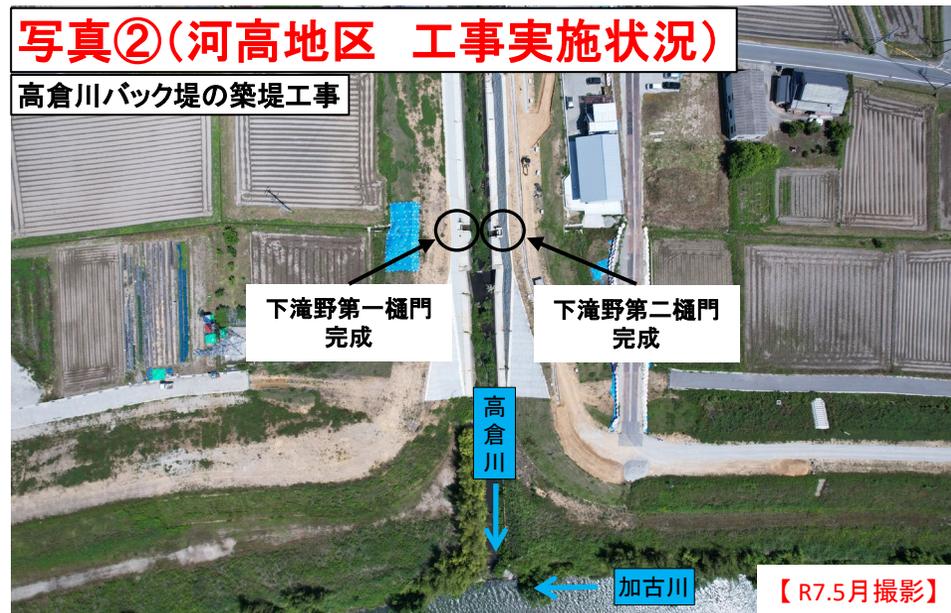

下滝野地区(早期整備区間)の工事進捗状況

更新箇所: 赤文字

【令和7年5月末時点】

整備前



下滝野地区 工事实施状況



写真③(下滝野地区 工事实施状況)



整備前



上滝野地区 工事実施状況



上滝野地区 工事実施状況



写真④ (上滝野地区 工事準備状況)
