



加古川中流部緊急治水対策(加東市滝野地区)

更新箇所: 赤文字

～度重なる浸水被害に対して、重点的な治水対策を実施～

【R5年11月末時点】

- 度重なる浸水被害に対して、平成29年度から、加古川中流部の加東市滝野地区(河高・下滝野・上滝野地区)を緊急対策特定区間に設定し、重点的に築堤や川の掘削を実施し、概ね10年間で平成16年洪水(台風第23号)と同規模の洪水に対する浸水被害の早期軽減を図ります。
- このうち、特に近年浸水頻度が高い河高・下滝野地区については、平成29年度から概ね5年間(令和3年度)で整備するとともに、5か年加速化予算を活用することで、滝野地区全体の完成を令和7年度を目標に事業を推進します。

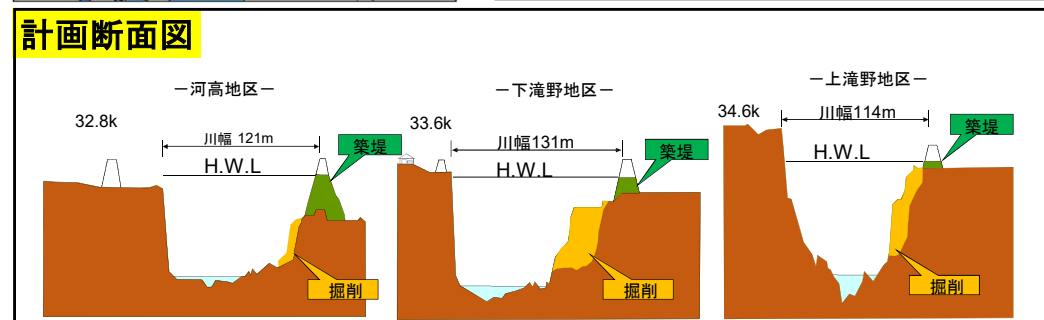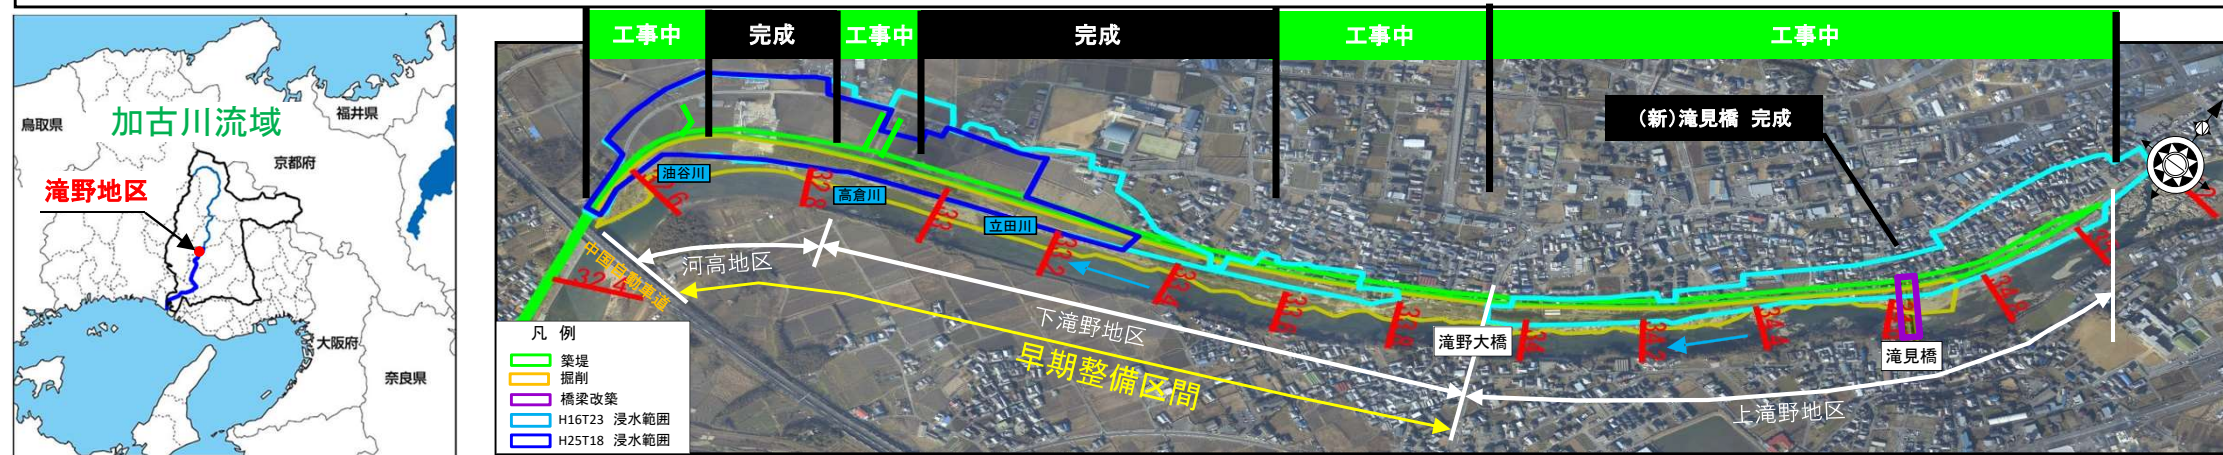

事業進捗
 令和4年3月末に油谷川、高倉川、滝野大橋下流の一部が概成箇所ですが、早期整備区間の治水安全度は確保しています。令和5年度も概成箇所の整備を継続して行います。

河高・下滝野地区(早期整備区間)

河高・下滝野	進捗率
用地取得	100%
築堤	93% (概成)
掘削	100%



工事概略工程

年度	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
河高 下滝野		築堤	掘削			築堤				
上滝野			掘削			築堤				
		橋梁改築(旧橋撤去完了)								


R6完成予定


R7年度完成を目標に事業推進

※現時点での予定であり、今後の状況により随時更新します。


上滝野地区

上滝野	進捗率
用地取得	93%
築堤	10%
掘削	44%
橋梁改築(新橋) 旧橋撤去	100% 撤去完了

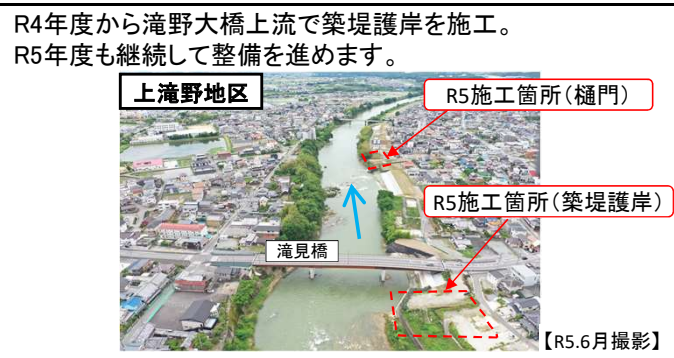

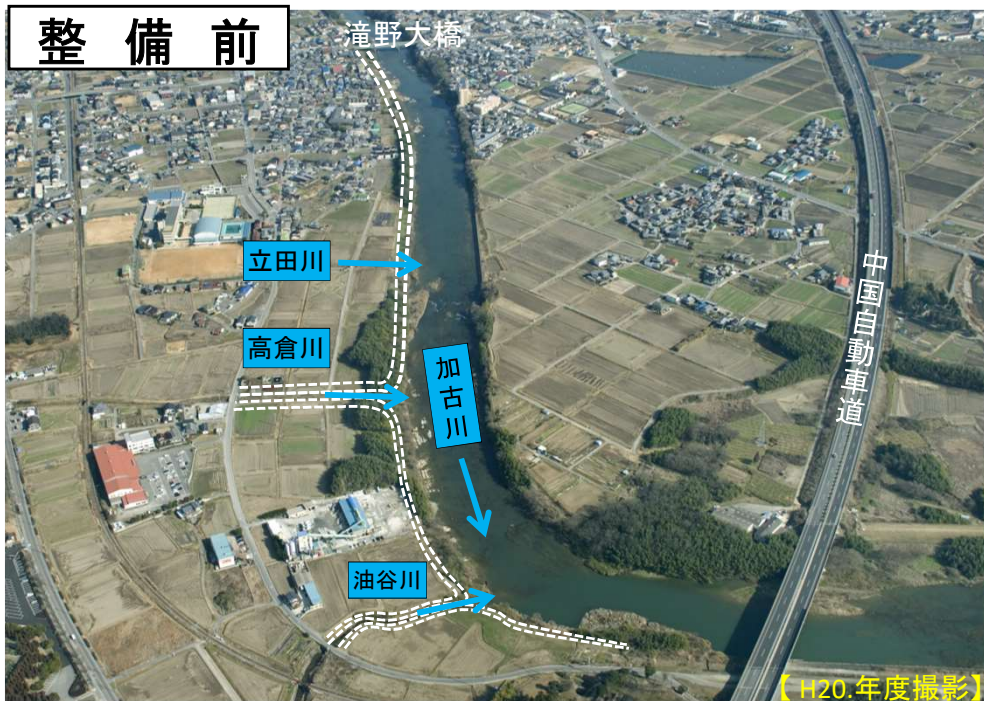

河高野地区 工事実施状況

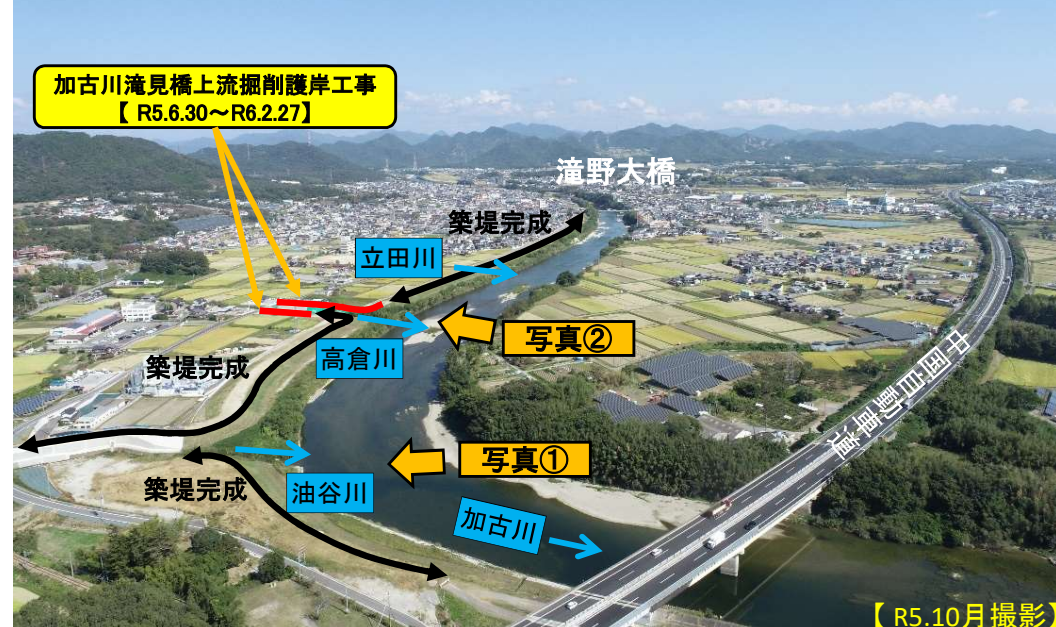


写真①(河高地区 工事実施状況)

・起点側の築堤護岸工事



写真②(河高地区 工事実施状況)



・高倉川バック堤の築堤護岸工事

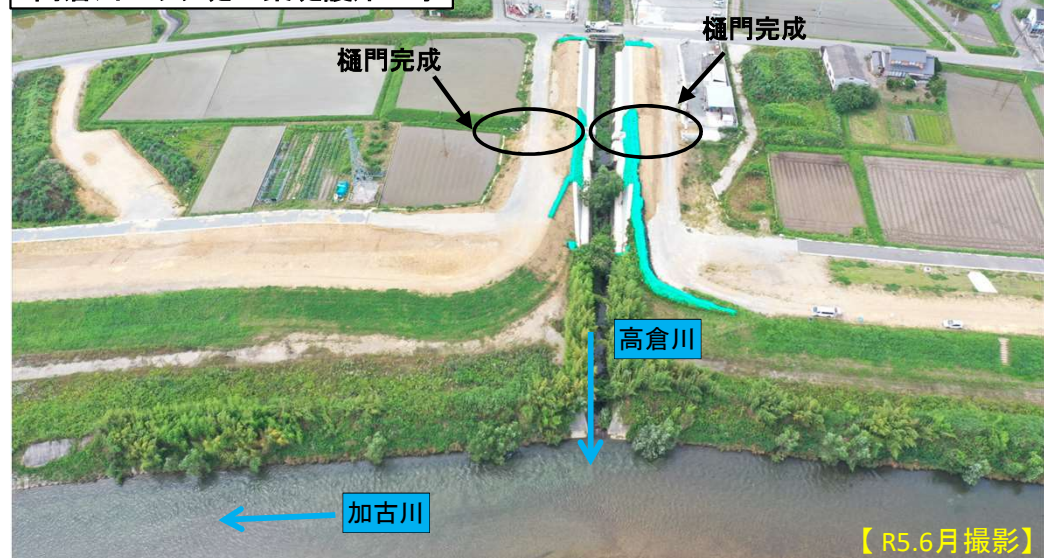

下滝野地区(早期整備区間)の工事進捗状況

更新箇所: 赤字


【令和5年11月末時点】

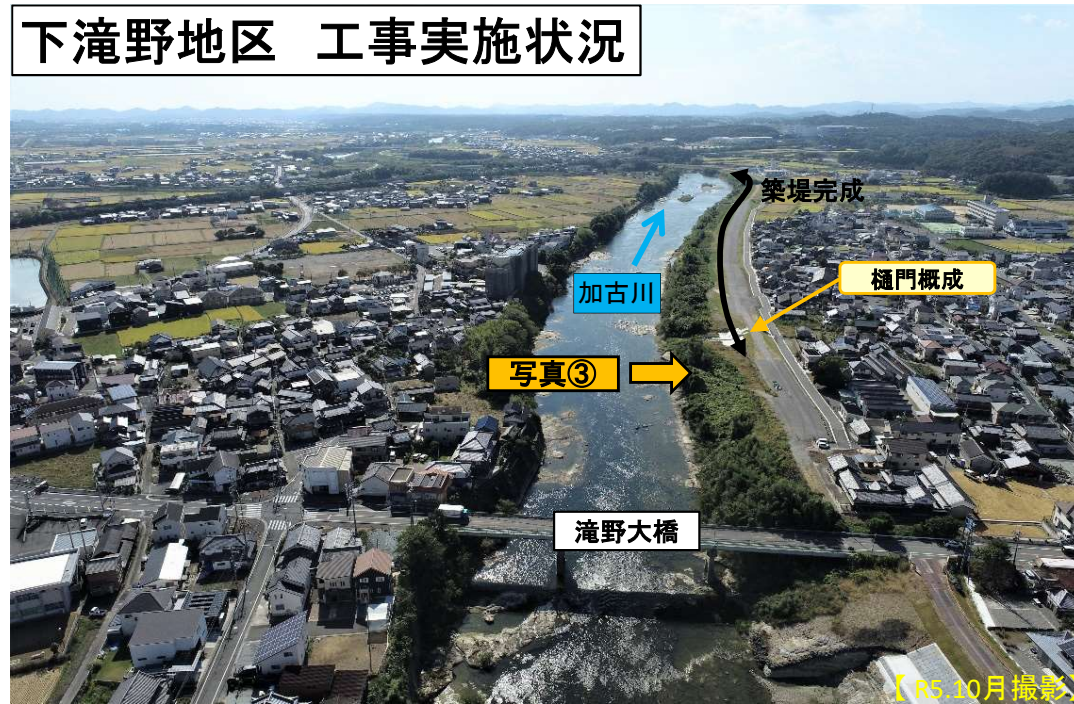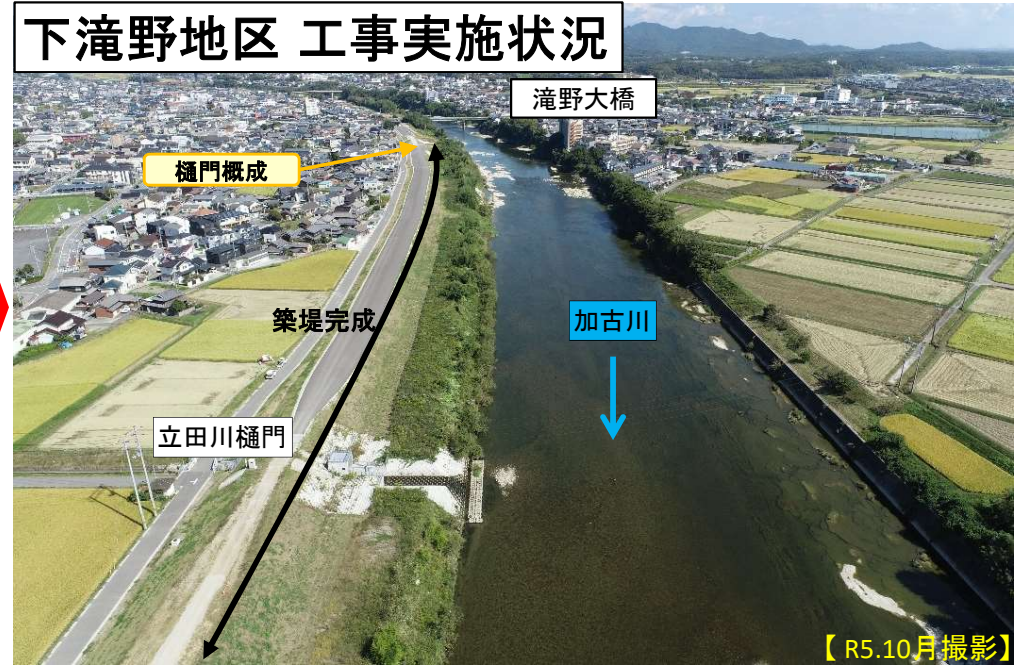


整備前



上滝野地区 工事实施状況

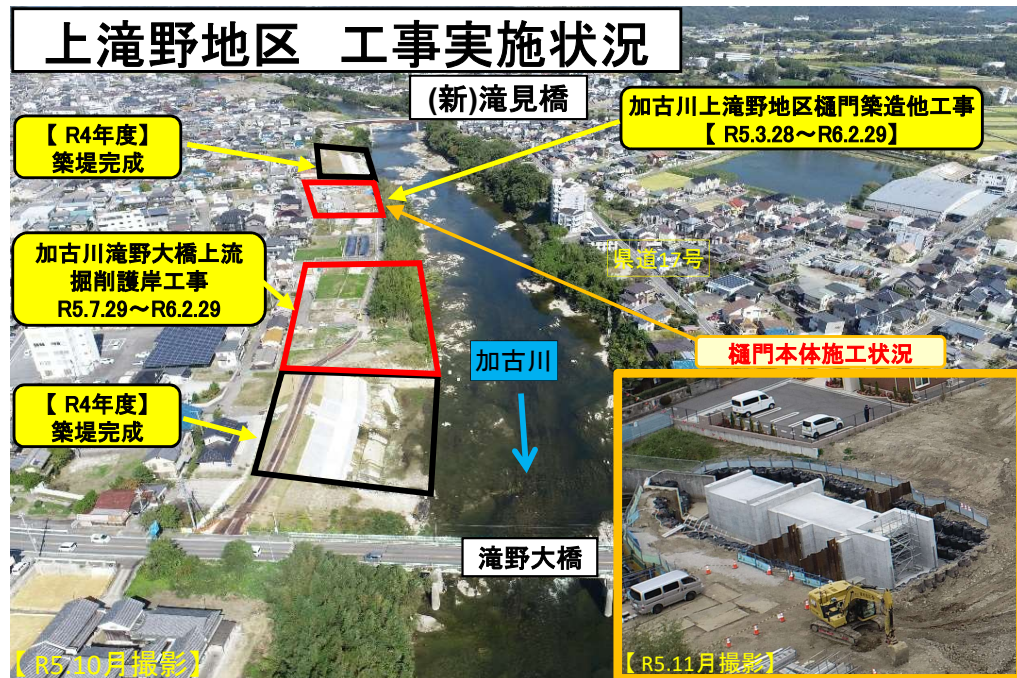

上滝野地区 工事实施状況

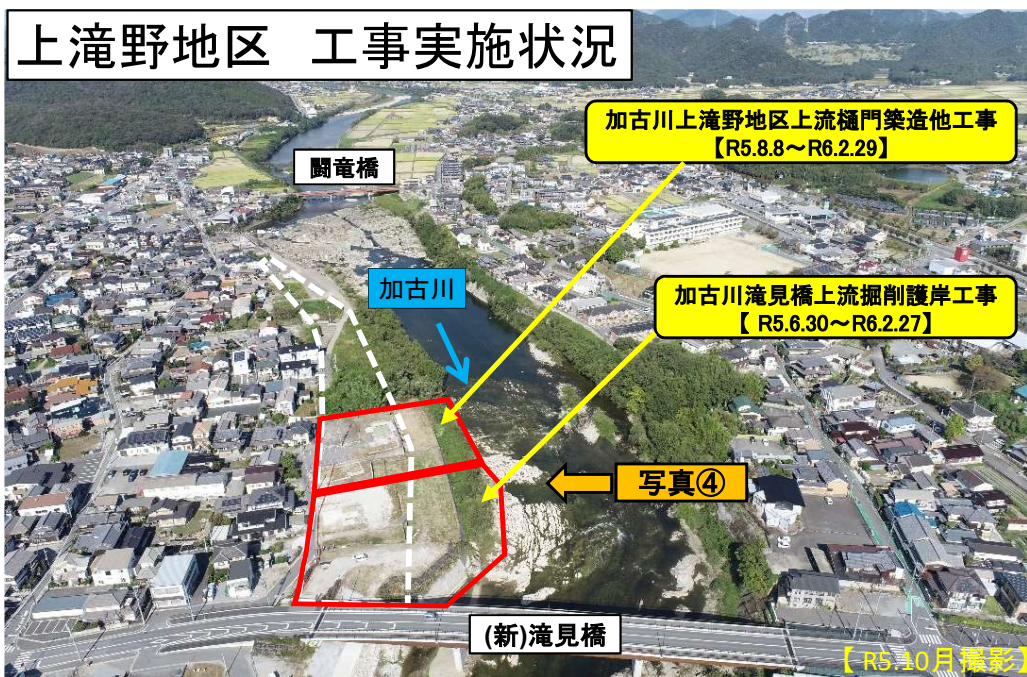

写真④加古川滝見橋上流掘削護岸工事

