

【すさみ串本道路工事進捗状況】

令和7年3月31日時点



①すさみ町里野(里野西池川橋)



②串本町和深(熊谷川第二橋)




③すさみ町里野(小河瀬谷川橋)

- ・A1橋台掘削中(R6年7月)、地盤のひび割れを発見し、A1橋台の工事を中断
- ・地盤調査(ボーリング調査)を実施のうえ対策工法を検討した結果、直接基礎から杭基礎(深礎杭)へ構造変更。現在、修正設計中。



④串本町和深(安指川橋)

- ・P1橋脚場所打ち杭掘削中(R6年4月)、多数の硬質岩が出現し、時間を要したが硬質岩の対策が完了

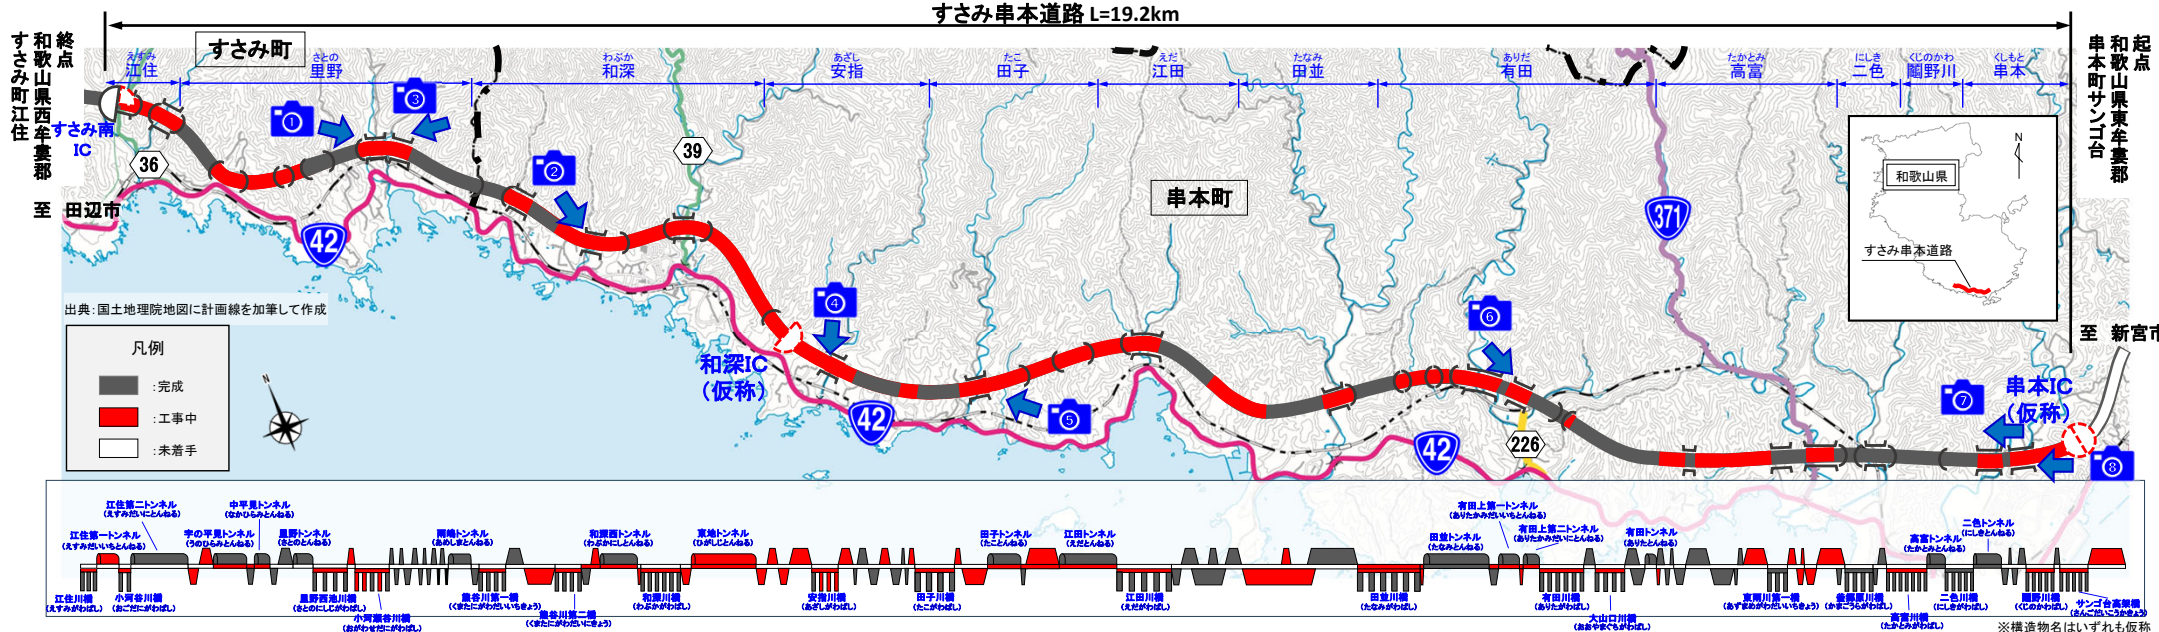

⑤串本町田子(田子川橋)



⑥串本町有田(大山口川橋)



⑦串本町鬩野川(鬩野川橋)



⑧串本町サンゴ台(サンゴ台高架橋)
