

国道163号 木津東バイパス 工事ニュース

平成30年2月 第1号

国土交通省 京都国道事務所です。

平成28年度より地盤改良工事に着手し、地元の皆様のご理解とご協力によりまして、平成29年12月3日には無事「木津東バイパス事業の起工式」が執り行われました。改めてここに御礼申し上げます。

さて、これから工事が本格化することから、皆様に「木津東バイパス 工事ニュース」として、定期的に工事の状況等についてお知らせします。


今回は(株)河野建設が工事している「木津跨線橋下部他工事」と玉井建設(株)が工事している「天神山地区改良工事」の紹介及び工事状況についてお知らせします。

「木津跨線橋下部他工事」については、1月末時点で橋の脚（下部）の下の杭と橋台の底版が完了し、2月からは橋台の縦壁の工事に入ります。

「天神山地区改良工事」については、1月末時点で工事用道路の掘削土工（全体で48,000m³）の80%（約39,000m³）を搬出運搬し、2月からは引き続き残りの土量（約9,000m³）を搬出運搬します。

地域の安全を最優先して施工いたしますので、引き続き地域の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

工事箇所位置

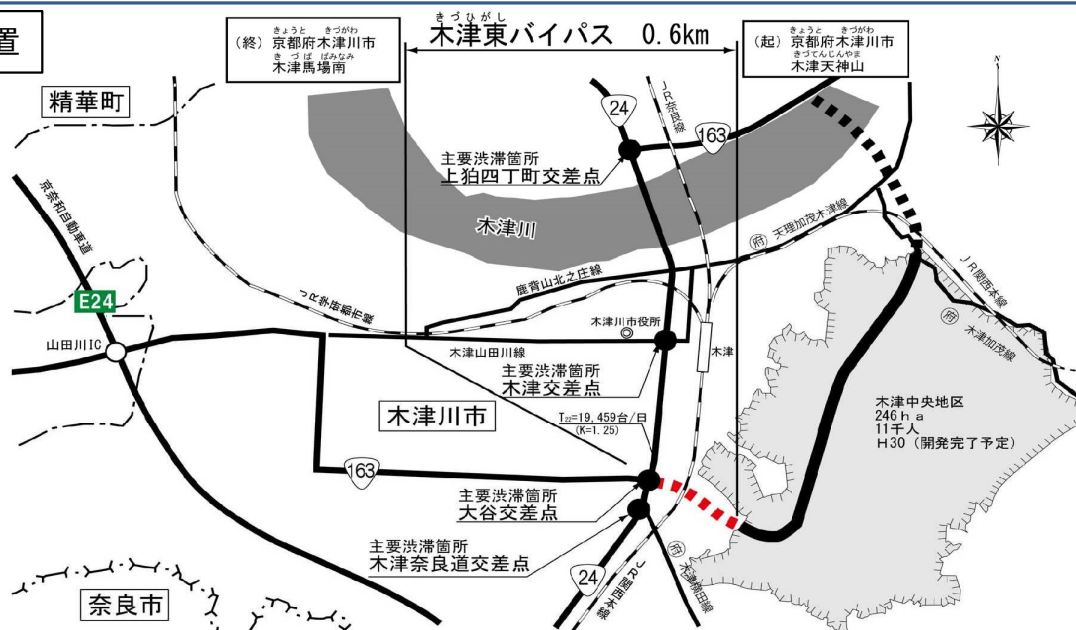

工事区間平面図



工事名:木津東バイパス木津跨線橋下部他工事

(木津東バイパス木津跨線橋の西側の橋台1基とその背面の地盤を改良する工事です)

工事進捗率 94.4% (※事業進捗率とは異なります) 平成30年1月31日現在

工 事 概 要 …… 地盤改良工 1式 橋台工 1式 (1基) 仮設工 1式

工 期 …… 平成29年3月8日 ~ 平成30年3月30日

工 事 の 状 況 …… 本工事は、当初から埋蔵文化財調査との調整を行い工事用道路を振替えなどをしながら橋台背面の地盤改良を11月中旬に完了しました。その後に、12月3日に木津東バイパス事業の起工式が場内で開催されるので場内の整備、式典の段取りを行い無事終えることができました。

起工式後から橋台工を順次施工しています。

本工事進捗状況写真



道路振替作業状況(平成29年7月中旬)



地盤改良作業状況(平成29年9月中旬)



橋台工作業状況(平成30年1月中旬)

起工式



国会議員、木津川市長、近畿地方整備局長など多くの方々が参列されました。




施工中



完成

盛砂は事業内の土砂を使用しました。

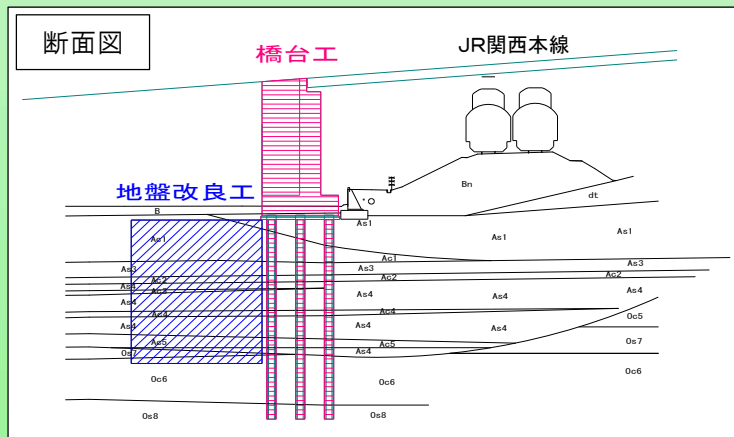

昨年12月3日に木津東バイパス事業の起工式が開催された後から橋台工の施工を始め現在進行中です。早期完工をめざして努力いたしますのでご理解とご協力をよろしくお願いいたします。株式会社 河野建設 現場代理人 田畑 陽一郎

《お問い合わせ先》



京都国道事務所 建設監督官 宮 本 TEL 075-313-0009
(株)河野建設 木津東バイパス現場事務所 TEL 0774-73-2512

工事名：木津東バイパス天神山地区改良工事

◆◆国道163号木津東バイパス道路事業の内、城山台入口からJR奈良線までの工事用道路掘削工事です。◆◆

工事進捗率 88.0% (※事業進捗率とは異なります) 平成30年01月31日現在	
工事概要	- 道路土工 1式(掘削46,400m³) - 伐木工 1式 - 仮設工 1式
工期	平成29年03月09日 ～ 平成30年03月31日
工事の状況	- 現在の当工事進捗状況は、城山台入口からの約400mの工事用道路掘削が、残り50m程度でJR奈良線側まで到達し、その後整形・仕上げの作業となっています。 1月18日に開催した【ICT現場説明会】では、関係機関より多数のご参加をいただき、誠にありがとうございました。

進捗状況写真



6月着工前



9月末進捗



12月末進捗

ICT現場説明会(平成29年1月18日開催)



ICTの施工概要説明



ICT建機の説明と操作体験



UAV測量に関する説明



TLS・測量機器の操作体験



参加者全員での記念撮影



現場代理人から
当工事現場代理人の檜内です。
近隣及び地域住民様のご理解・ご協力のおかげで工事も終盤を迎えております。
無事故・無災害・苦情無しで工事完了できるよう、気を抜かずにご協力をお願いします！

【お問い合わせ先】



京都国道事務所 建設監督官 宮本

TEL: 075-313-0009



玉井建設(株) 木津東バイパス天神山地区作業所

TEL: 0774-46-9731
