

熊野川流域における民有林直轄治山事業の 取組状況について

近畿中国森林管理局
計画保全部 治山課



国民の森林・国有林

近畿中国森林管理局



十津川地区民有林直轄治山事業の取組状況①

- 本地区では、平成23年9月の台風12号に伴う豪雨により多数の大規模な崩壊が発生し、甚大な被害となったことから、被災箇所の早期復旧を図るため、奈良県吉野郡十津川村、天川村、五條市大塔町において緊急かつ計画的に復旧事業を実施中。
- 令和4年度は11箇所において溪間工5基、山腹工7箇所を計画しており、現在6箇所において溪間工3基、山腹工4箇所を実行中。




①赤谷b(被災時)



②檜股(被災時)



③五百瀬2号地(被災時)

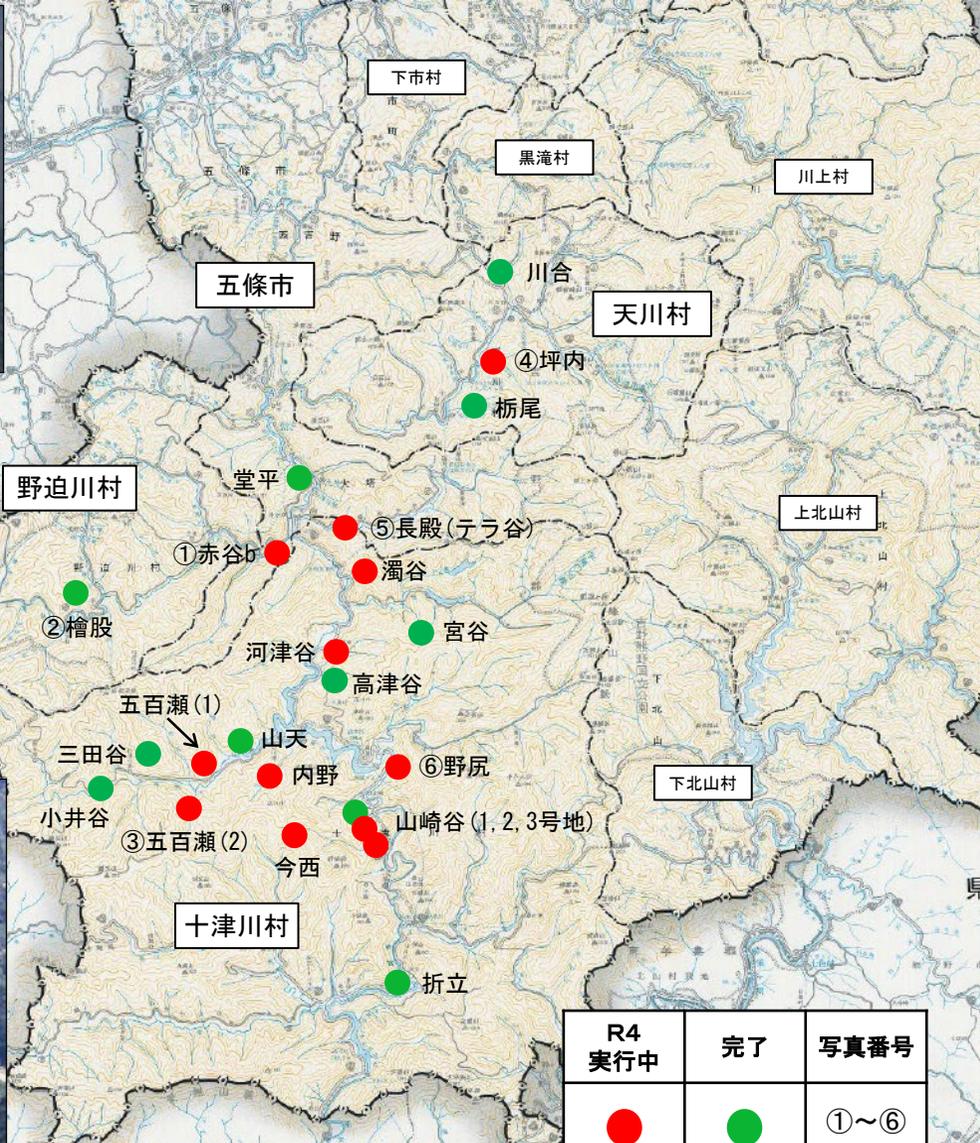

④坪内(被災時)



⑤テラ谷(被災時)



⑥野尻(被災時)

R4 実行中	完了	写真番号
●	●	①～⑥

十津川地区民有林直轄治山事業の取組状況②

OR 4. 1 1 実行状況

① テラ谷 (R4. 11月撮影)



山腹工(簡易法柱吹付工・モルタル吹付工)

② 河津谷 (R4. 10月撮影)




溪間工(床固工)



③ 赤谷b (R4. 10月撮影)

山腹工(航空緑化工・吹付工)

R4 実行中	完了	写真番号
●	●	①～⑥

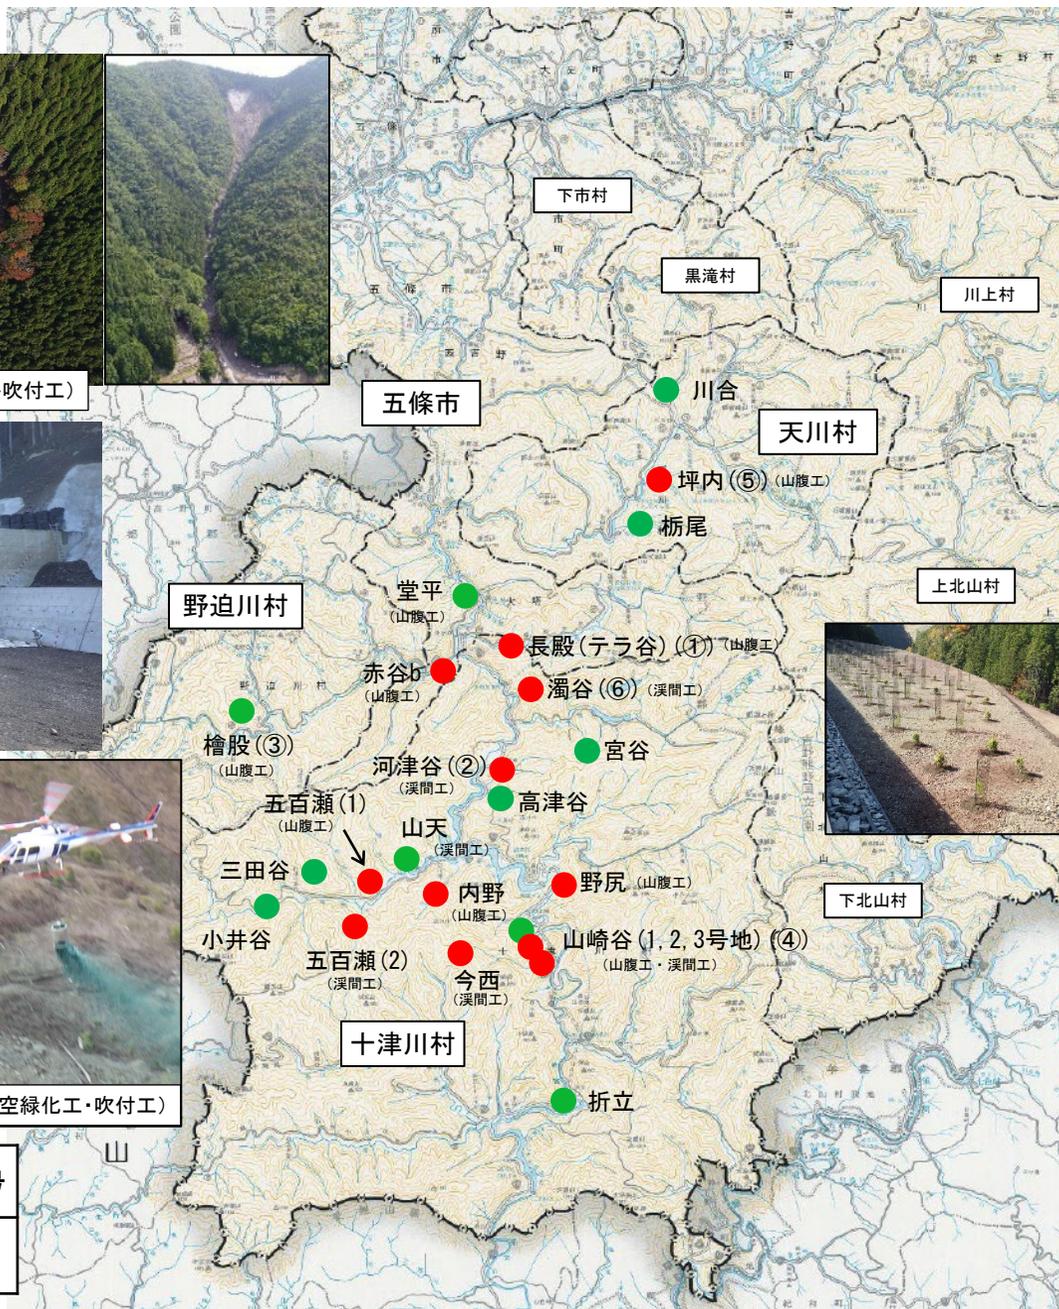

④ 山崎谷 (R4. 10月撮影)



溪間工(谷止工)

⑤ 坪内 (R3. 11月撮影)



山腹工(排土工・植栽工)

⑥ 濁谷 (R4. 11月撮影)



溪間工(谷止工)

十津川地区民有林直轄治山事業の取組状況③

○完了箇所

①檜股 (完了)



溪間工(コンクリート谷止工・かご枠護岸工・鋼製枠帯工)
山腹工(土留工・法枠工・緑化工)

②堂平 (完了)



山腹工(アンカー工)

③山天 (完了)



溪間工(谷止工)

④川合 (完了)



山腹工(土留工・法枠工・緑化工)

⑤山崎谷 1号地 (完了)



山腹工(法枠工・モルタル吹付工・緑化工)
溪間工(護岸工)

⑥折立 (完了)




山腹工(法枠工・土留工・緑化工)



R4 実行中	完了	写真番号
●	●	①~⑥


紀伊田辺地区民有林直轄治山事業の取組状況①

- 本地区では平成23年9月の台風12号災により発生した荒廃箇所の早期復旧を図るため、平成25年度より、和歌山県田辺市内の6箇所について民有林直轄治山事業として事業着手。平成27年度には事業が完了した菖蒲谷区域を和歌山県へ移管し、また、平成29年度より上秋津区域を追加、令和2年度には事業が完了した八升前区域、愛賀合区域を和歌山県へ移管し、現在4区域において事業を実施中。
- 令和4年度は4箇所において山腹工4箇所を計画しており、現在全て実行中。

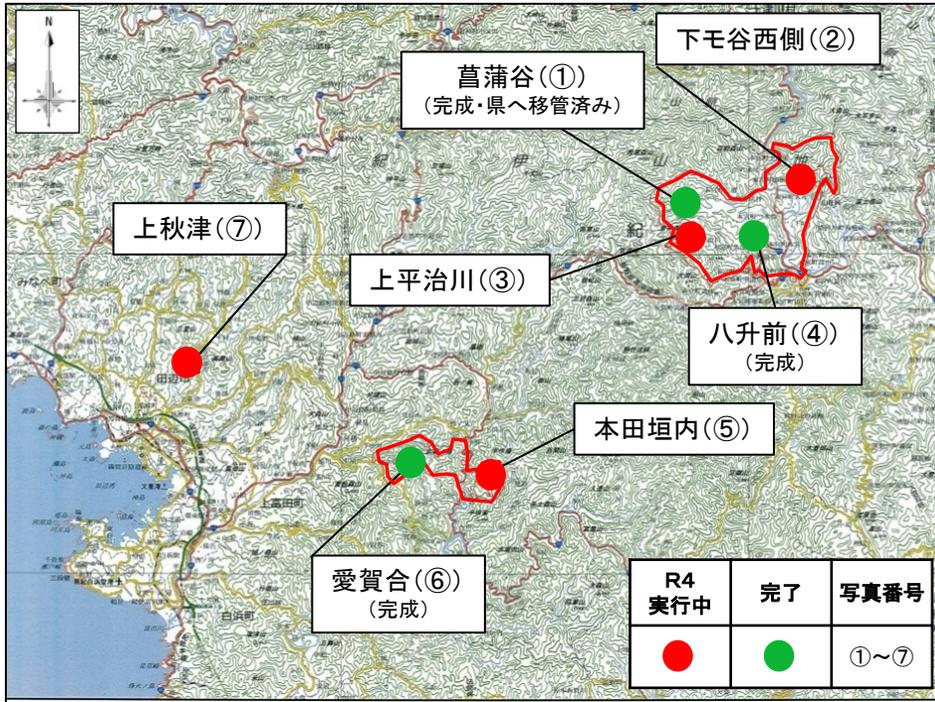

紀伊田辺地区民有林直轄治山事業の取組状況②

OR 4 実行状況

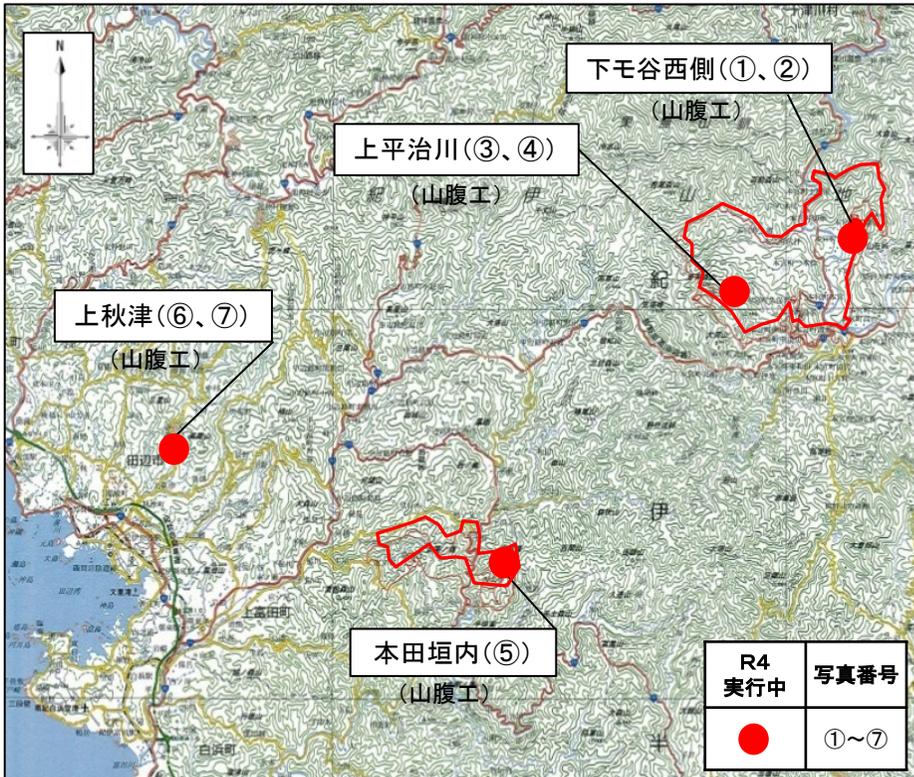

③上平治川 (R4. 10月撮影)



①下モ谷西側 (R4. 3月撮影)



④上平治川 (R4. 10月撮影)



②下モ谷西側 (R4. 8月撮影)



⑦上秋津 (R4. 8月撮影)



⑥上秋津 (R4. 10月撮影)



⑤本田垣内 (R4. 10月撮影)

