

地域整備実施計画に係る 令和6年度実施状況及び令和7年度実施予定

令和7年5月29日

独立行政法人水資源機構
関西・吉野川支社淀川本部
丹生事務所

実施内容について（水機構）

①-1 工事用道路として利用した県道中河内木之本線の整備（道路原形復旧及び改良）

- ・道路整備: R7年度 針川～中河内工区 約 1.7km は引き続き災害復旧工事等の中で対応予定
- ・斜面对策: R7年度 鷺見地区 1箇所完了予定。
- ・橋梁整備: R6年度 本設橋の取り付け部の施工、仮設橋の撤去及び左岸の護岸工が完了。
R7年度 右岸の護岸工及び県道取り付け部等の施工を行い完了予定。

⑭-1 残存山林の補償

- ・補償対象地の権利関係確認のため関係者の意向確認を行い、地権者との補償協議を実施中。
引き続き、補償契約の進捗を図る。（R7年4月末現在:進捗率:約97%（3,049ha／3,150ha））

⑭-4 集落跡地の整備（道路原形復旧の一環）

- ・R7年度: 半明、尾羽梨、奥川並及び鷺見地区を整備予定。

⑭-6 付替県道妙理谷工区の実施


- ・水機構にて管理を継続中（R1年度～）
- ・R6年度に安全対策工事が完了し、滋賀県、長浜市との現地立会いを実施。
- ・R7年度に滋賀県、長浜市に引渡し予定。

⑮-1 発生土受入地の利活用策に沿った基盤整備等

- ・八田部: 跡地の利活用計画を踏まえた基盤整備（整地、構造物撤去、法面除草）をR7年度中を目途に実施予定。

①ー１ 工事用道路として利用した県道中河内木之本線の整備

- ・滋賀県の拡幅工事(水機構が滋賀県より施工受託)と併せ道路原形復旧を実施。
- ・針川～中河内工区の約1.7kmの道路整備については、引き続き災害復旧工事等の中で対応予定。

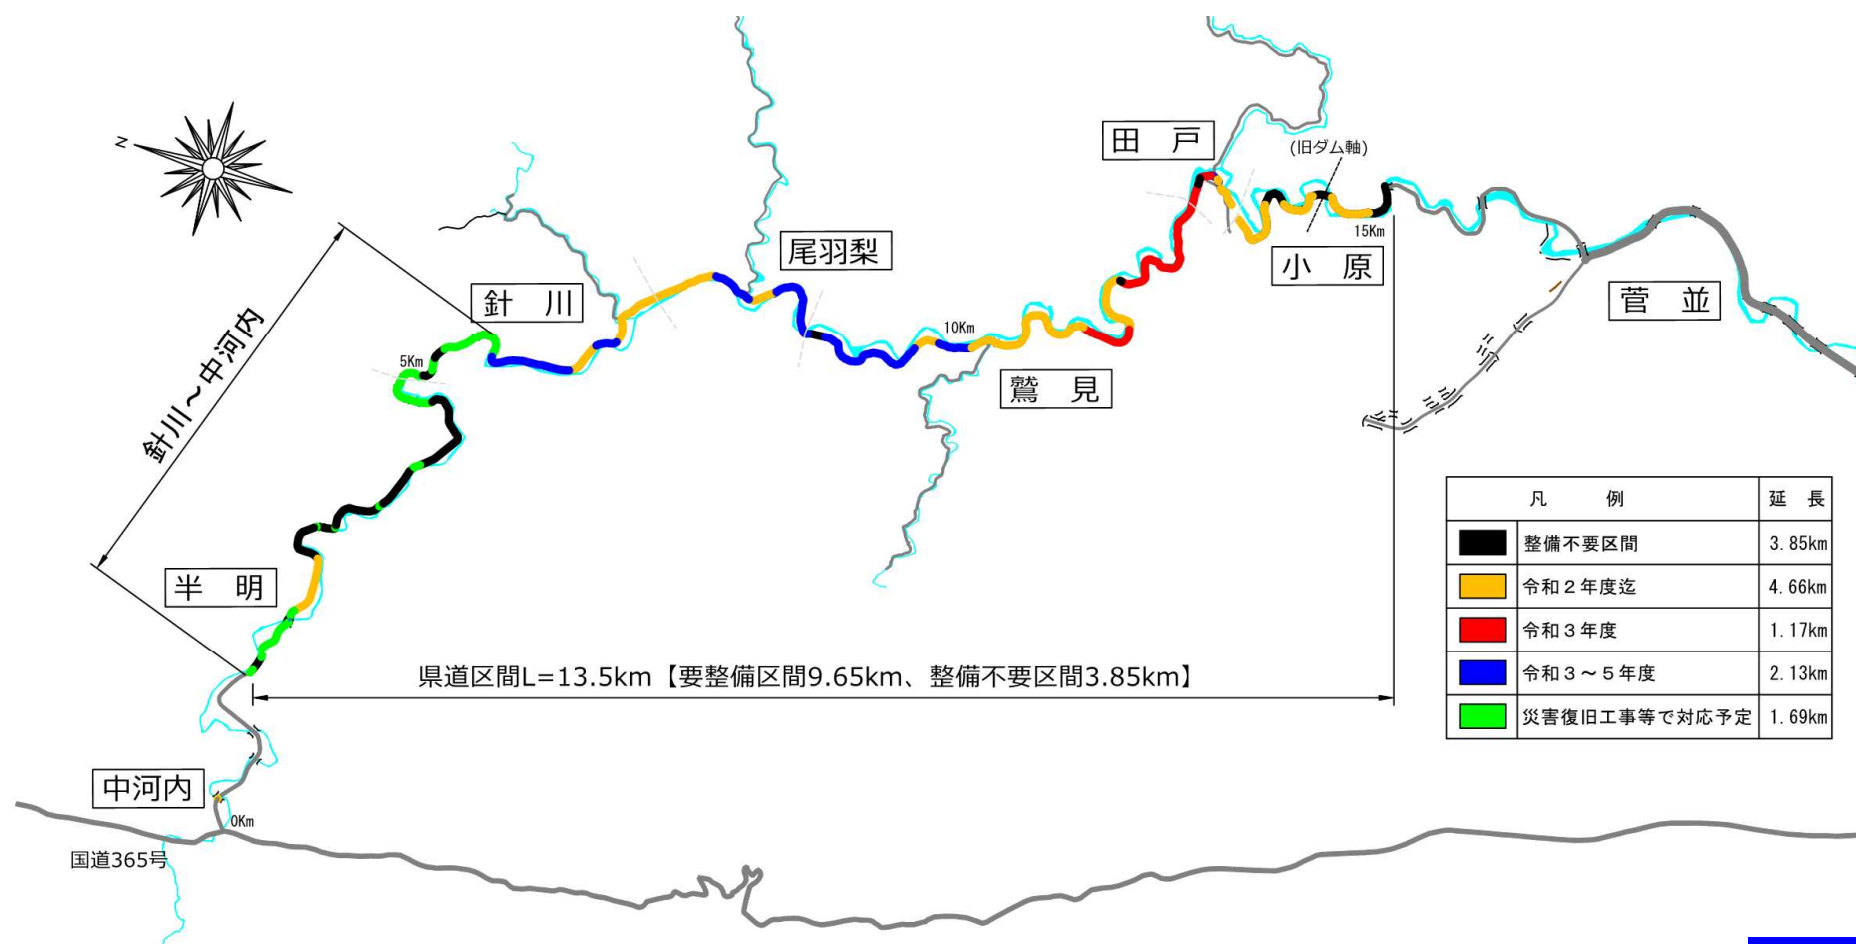

①ー1 工事用道路として利用した県道中河内木之本線の整備 (工事用道路2号線の引き渡しのため)

R6年度～R7年度

- ・R6年度 本設橋の取り付け部の施工、仮設橋の撤去及び左岸の護岸工が完了。
- R7年度 県道取り付け部及び右岸の護岸工等の施工を行い完了予定。


工事内容

- ・R6年度 橋梁取り付け部、仮橋撤去及び左岸の護岸工を完了
- ・R7年度 県道取り付け部及び右岸の護岸工等を施工



①ー1 工事用道路として利用した県道中河内木之本線の整備


R5年度～R7年度

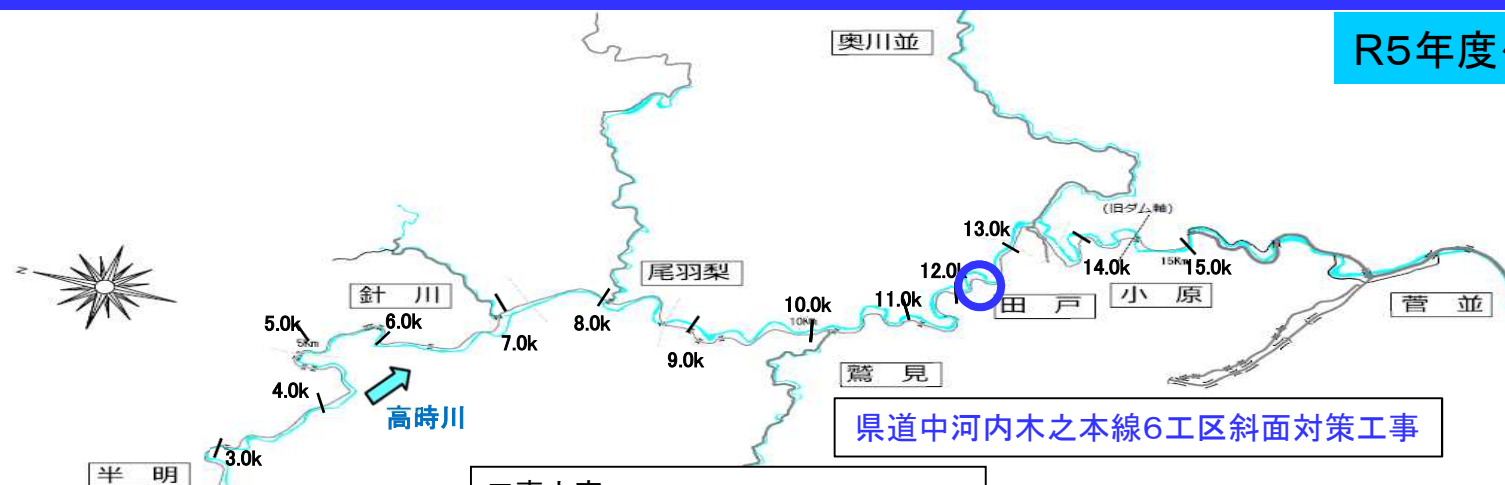

工事内容


- ・法面工(モルタル吹付) 1式
- ・落石防止網工 1式
- ・落石防護柵工 1式
- ・迂回路(仮設) 1式

—凡例—

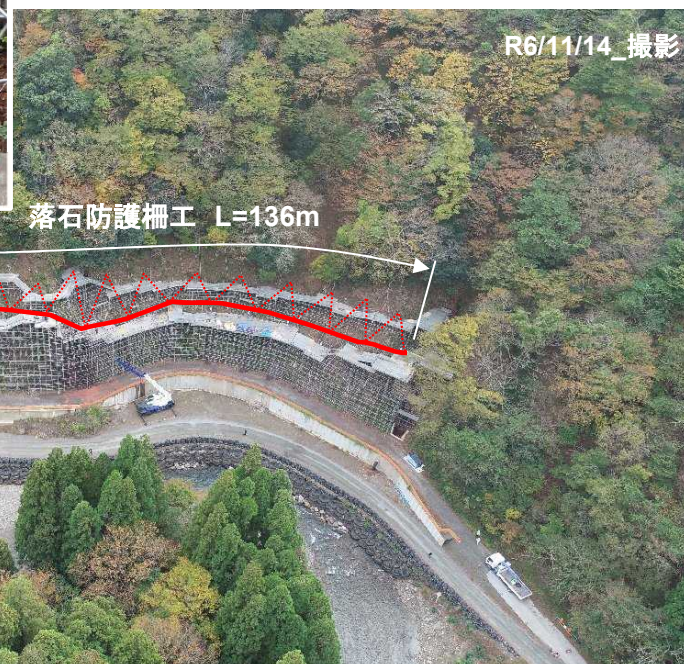

⑭－1 残存山林の補償

- ・残存山林については、R2年度より補償手続きを開始。R7年度も引き続き、補償契約の進捗を図る。
(補償対象面積：約3,150ha、R7年4月末現在：契約済面積：約3,049ha、進捗率：約97%)

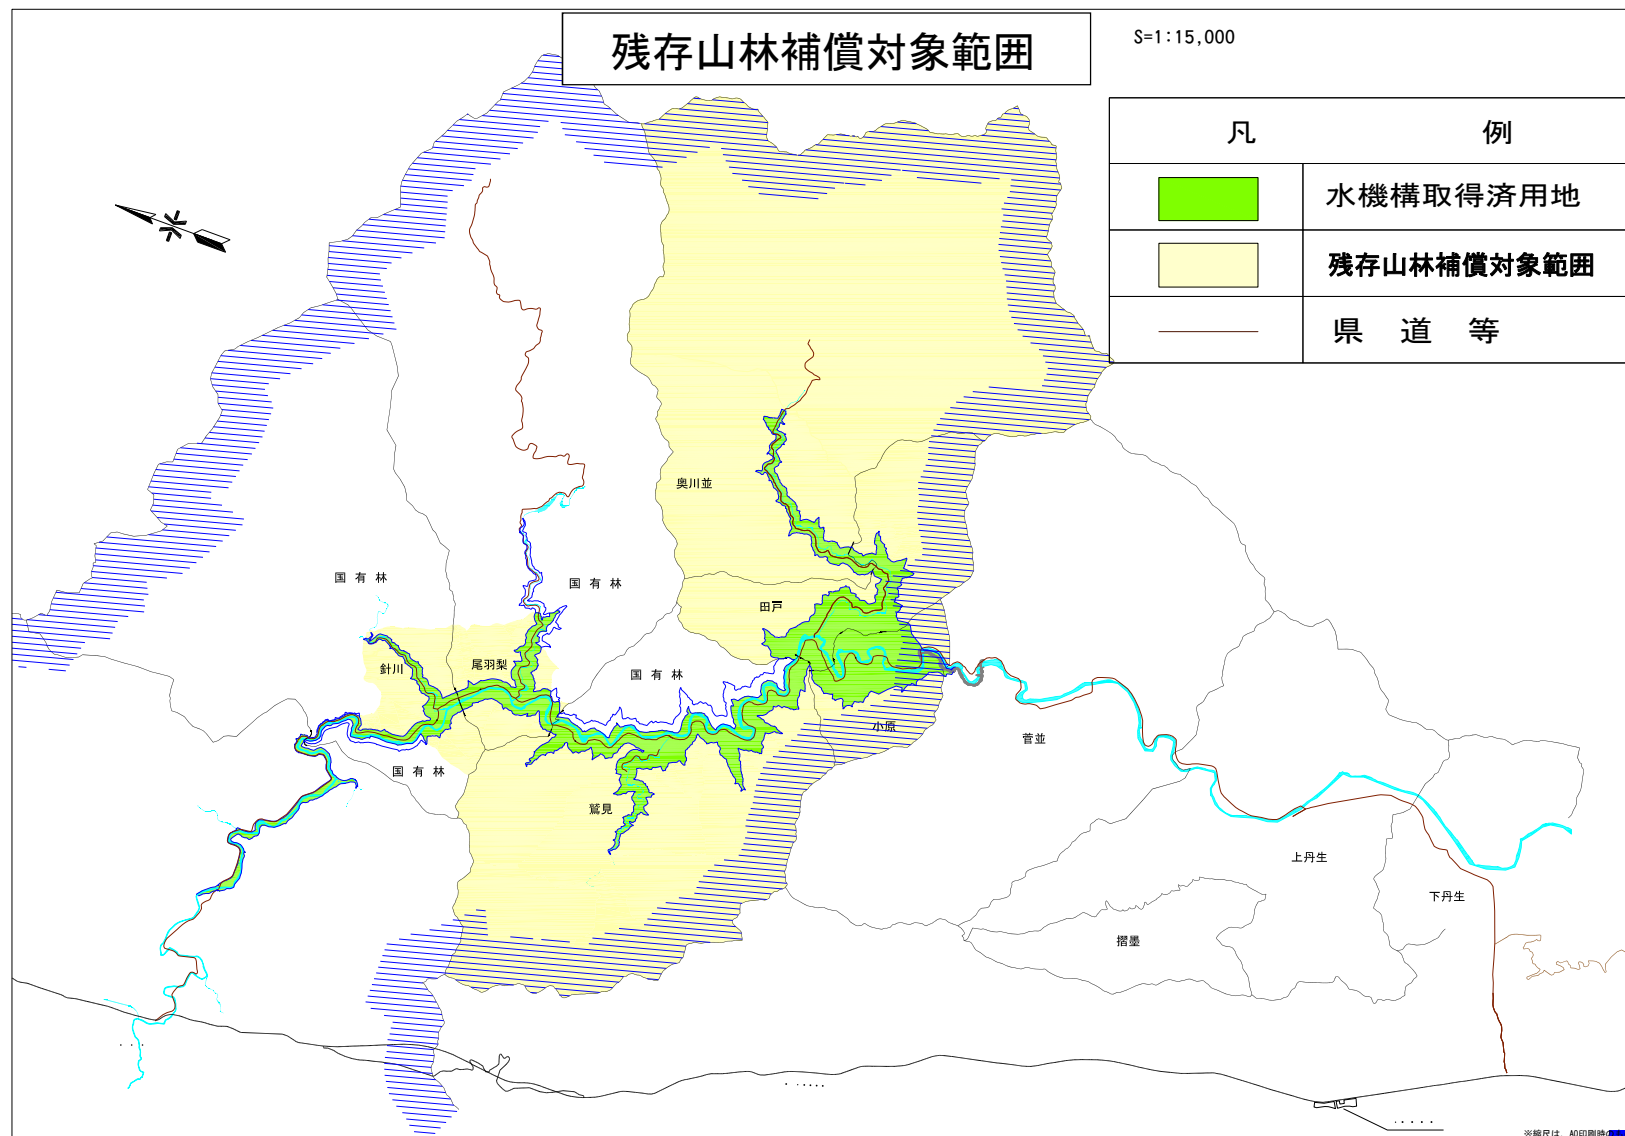

⑭ー4 集落跡地の整備（道路原形復旧の一環）

R5年度～施工中


・R7年度は、半明、尾羽梨、奥川並及び鷺見地区の整備を予定。



⑭ー6 付替県道妙理谷工区の管理

R5年度～R7年度

- ・水機構にて管理を継続中(R1年度～)
- ・R6年度に安全対策工事が完了し、滋賀県、長浜市との現地立会いを実施。
- ・R7年度に滋賀県、長浜市に引き渡し予定。

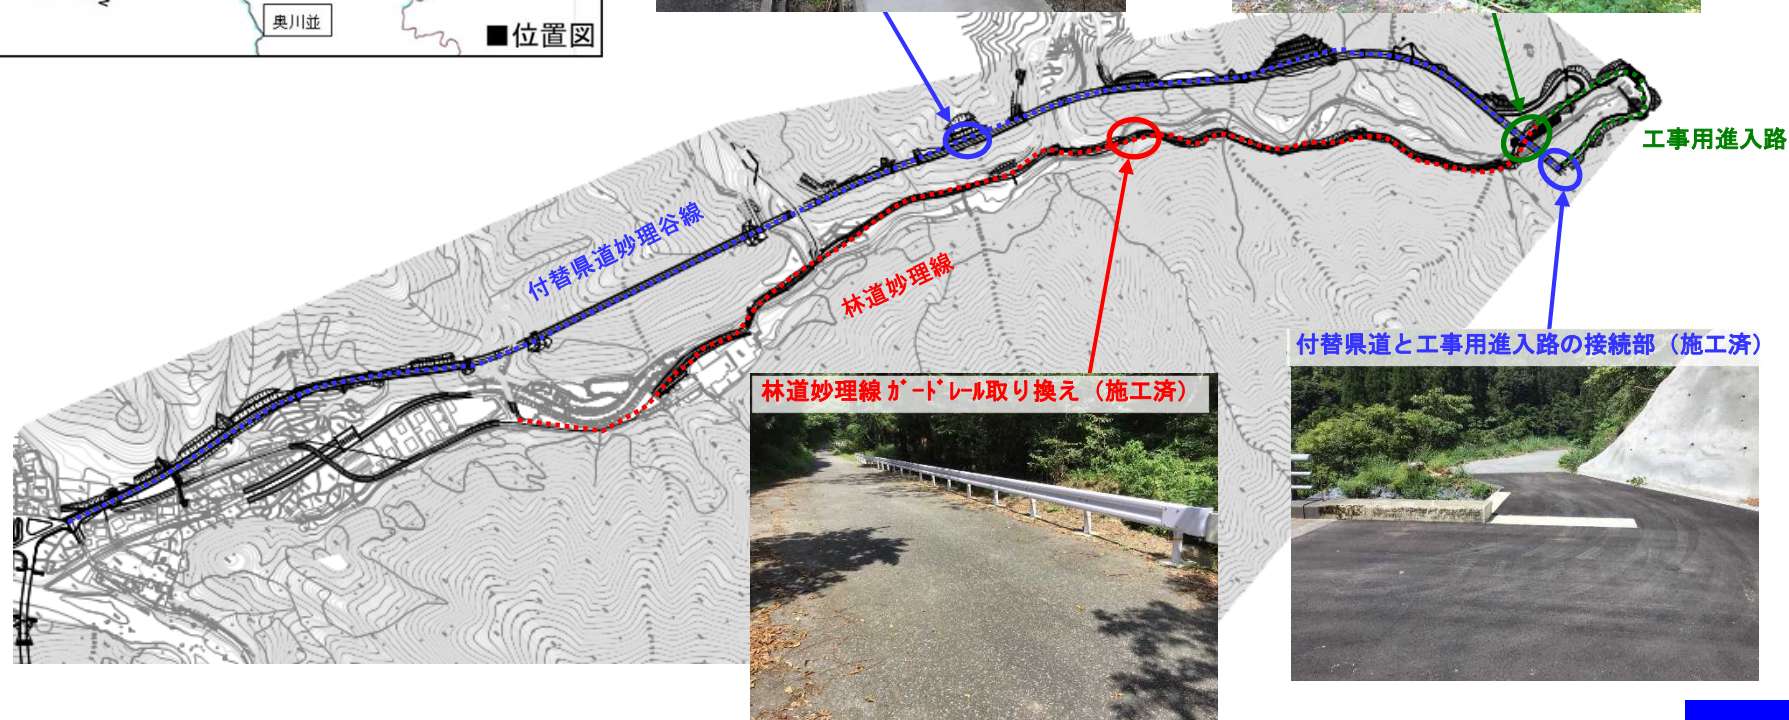

林道妙理線ガードレール取り換え (施工済)

付替県道と工事用進入路の接続部 (施工済)

工事用進入路

⑮－１ 発生土受入地の利活用策に沿った基盤整備等

- ・八田部発生土受入地については、跡地の利活用計画を踏まえた基盤整備（整地、構造物撤去、法面除草）をR7年度中を目途に実施予定。

