

平成27年11月11日


堆積土砂対応の状況について

奈良県 県土マネジメント部 河川課

1. 堆積土砂撤去の進捗状況

(奈良県・電源開発・関西電力・国土交通省)

全体図

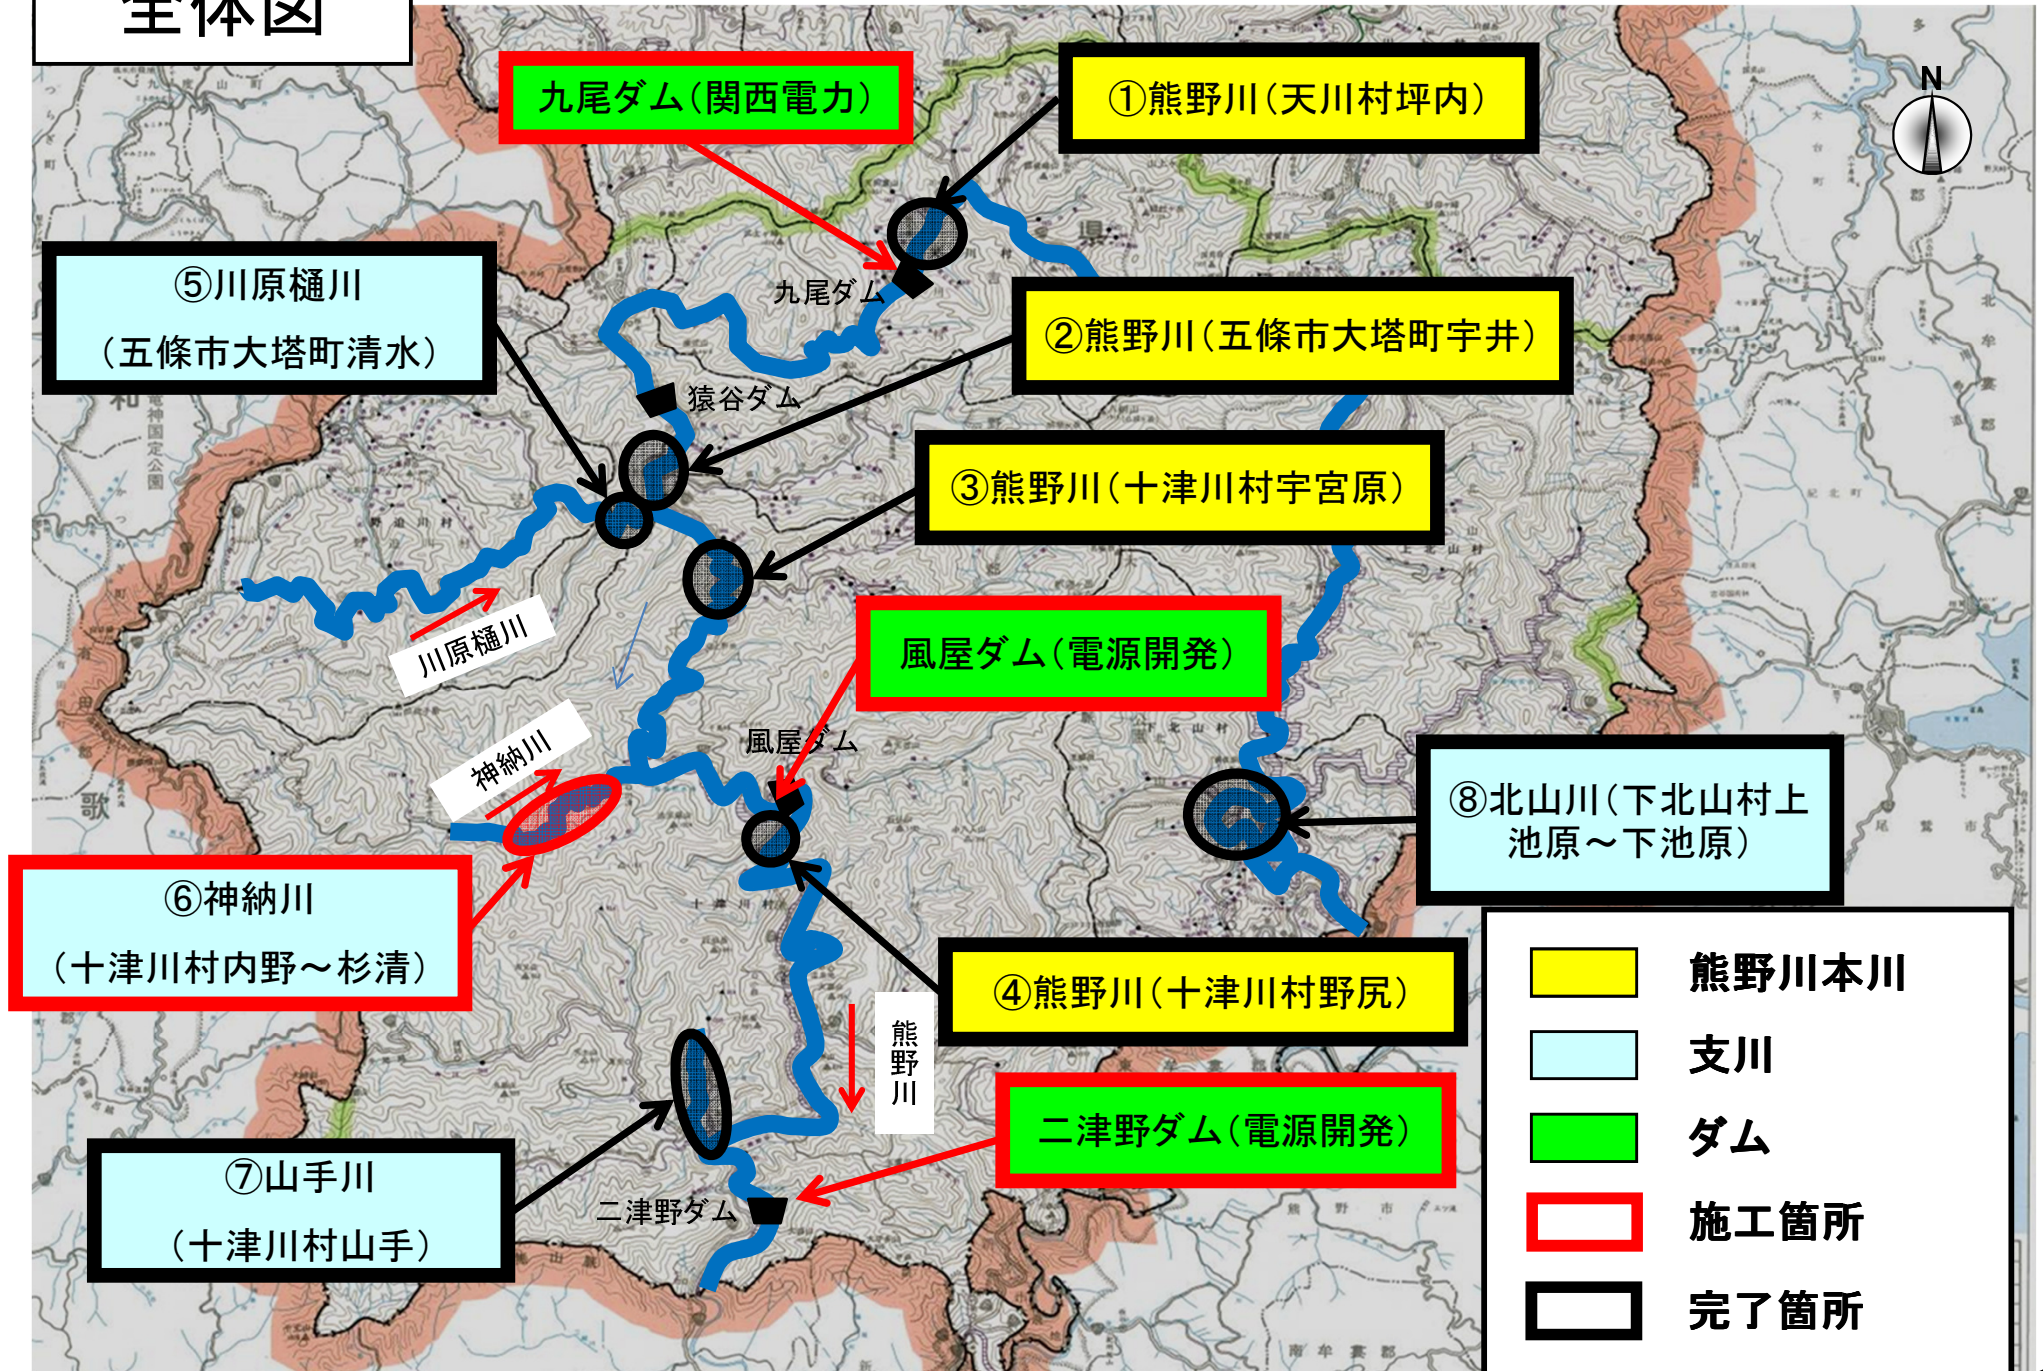

堆積土砂撤去 工程表(奈良県施行分)

| 河川名 | 箇所 | 撤去土砂量 | | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 |
|------------------|--------------------------------|-------|-------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 熊野川 | ① 天川村 坪内 (つぼのうち) | H23 | 8万m ³ | ■ 完了 | | | | |
| | ② 大塔町 宇井 (うい) | H23 | 47万m ³ | ■ | ■ | ■ | 完了 | |
| | ③ 十津川村 宇宮原 (うぐはら) | H23 | 112万m ³ | | ■ | ■ | ■ | 完了 |
| | | H25 | 台風18号分12万m ³ | | | | ■ | 完了 |
| | ④ 十津川村 野尻 (のじり) | H23 | 6万m ³ | | ■ | ■ | 完了 | |
| 川原樋川 (かわらびがわ) | ⑤ 大塔町 清水 | H23 | 14万m ³ | | ■ | ■ | 完了 | |
| 神納川 (かんのがわ) | ⑥ 十津川村 内野～杉清 (うちの) (すぎせ) | H23 | 21万m ³ | | | ■ | 完了 | |
| | | H25 | 台風18号分17万m ³ | | | | ■ | |
| | | H26 | 台風11号分10万m ³ | | | | | ■ |
| 山手川 (やまてがわ) | ⑦ 十津川村 山手 (やまて) | H23 | 4万m ³ | ■ 完了 | | | | |
| 北山川 | ⑧ 下北山村 下池原～上池原 | H23 | 9万m ³ | ■ 完了 | | | | |

平成27年度
完了予定

平成28年度
完了予定

23年災害は26年度完了
25、26年災害は引き続き実施

| | | |
|----------------|-----|------|
| 全体 | 85% | 100% |
| (H25台風18号分は除く) | | |

⑥神納川(十津川村内野～杉清)

