


新宮川水系の砂防事業の状況【三重県】

H27.11.11

平成 27 年度の対応

1. 熊野川支川堆積土砂撤去予定 約 5,500 m³
2. 熊野川本川和気地区で約 10,000 m³の土砂撤去実施中
(災害対策等緊急事業推進費)
3. 熊野川本川浅里地区で、約 5,000 m³の砂利採取実施
引き続き約 7,900 m³の砂利採取実施予定
4. **砂防事業による河川への土砂流出抑止 (3 溪流で事業実施中)**
5. 熊野川浅里地先に設置した水位計による水位観測の実施
6. 熊野川本川 (北檜杖地区、瀬原地区)、清水本川 (浅里地区) で量水標を設置予定

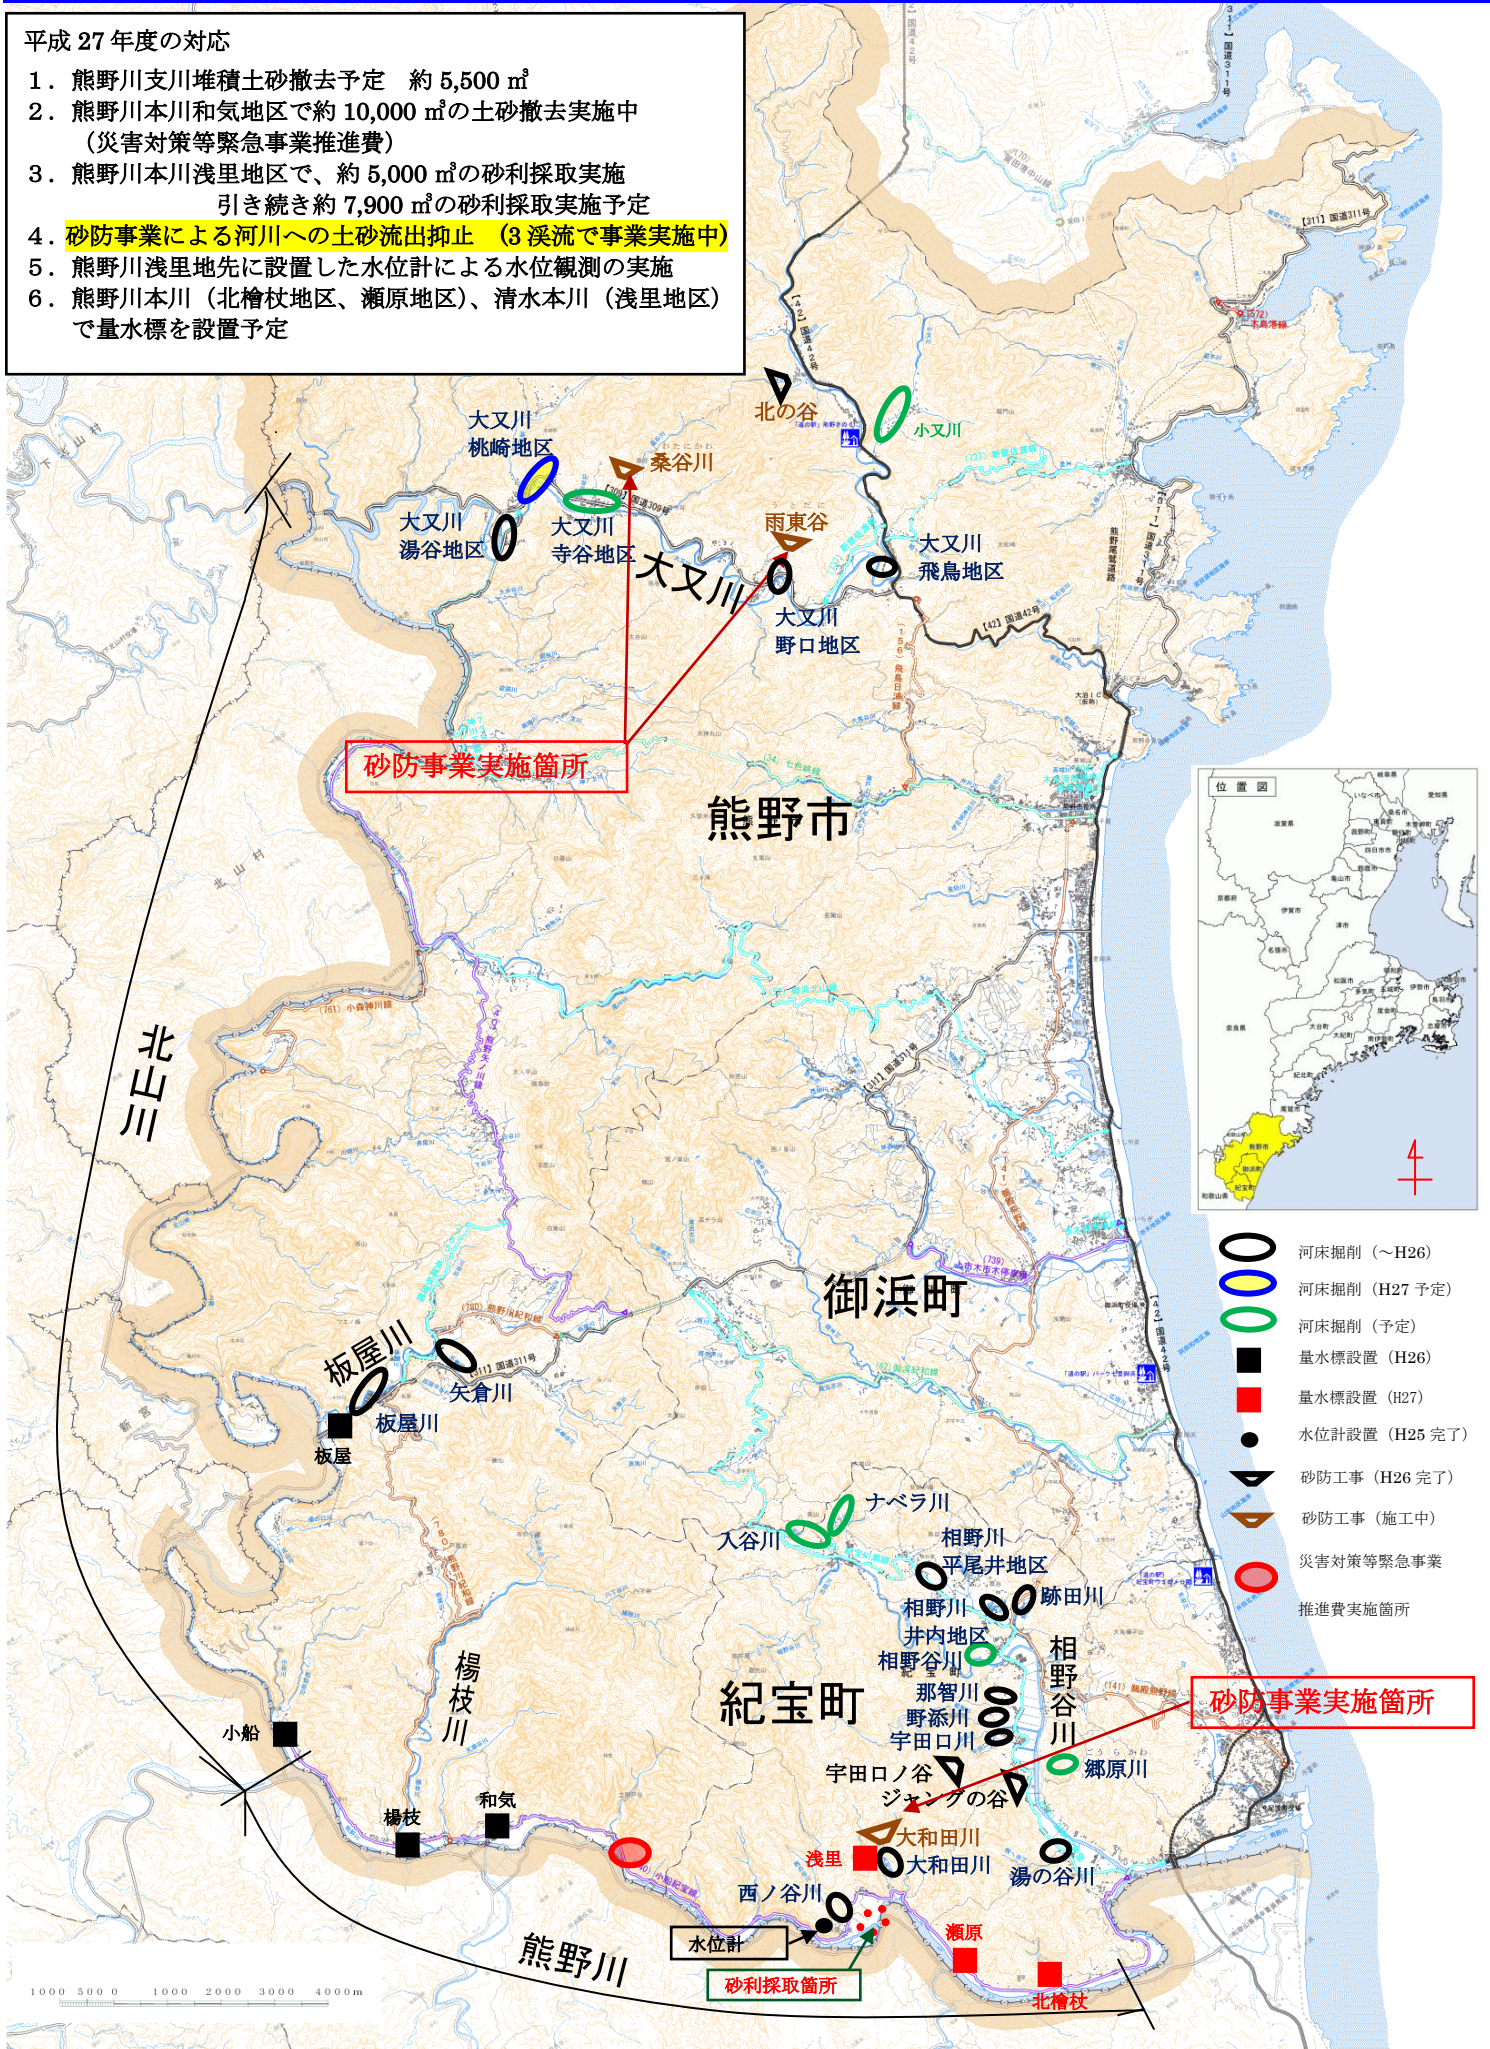

- 河床掘削 (～H26)
- 河床掘削 (H27 予定)
- 河床掘削 (予定)
- 量水標設置 (H26)
- 量水標設置 (H27)
- 水位計設置 (H25 完了)
- 砂防工事 (H26 完了)
- 砂防工事 (施工中)
- 災害対策等緊急事業推進費実施箇所

砂防事業実施箇所

1000 500 0 1000 2000 3000 4000m

砂防堰堤整備状況写真

○ジャングの谷



○桑谷川

