

激特事業等の実施状況について


近畿地方整備局

紀南河川国道事務所

熊野川激特事業等工程

工事内容		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度
激特事業	掘削工 根固め工含む						
	築堤工 堤防補強含む						
	排水機場耐水化						
	橋梁対策 JR熊野川橋梁 新熊野大橋の補強						
災害事業	河川管理施設復旧						
	熊野川護岸 等						
	相野谷川輪中堤嵩上げ 等						
改修事業	矢湍地区高潮堤						
	あけぼの地区高潮堤						
	水門・排水機場等耐震対策						
	光ファイバ・CCTV設置 (津波・浸水対策)						

熊野川激特事業実施状況(河道掘削)

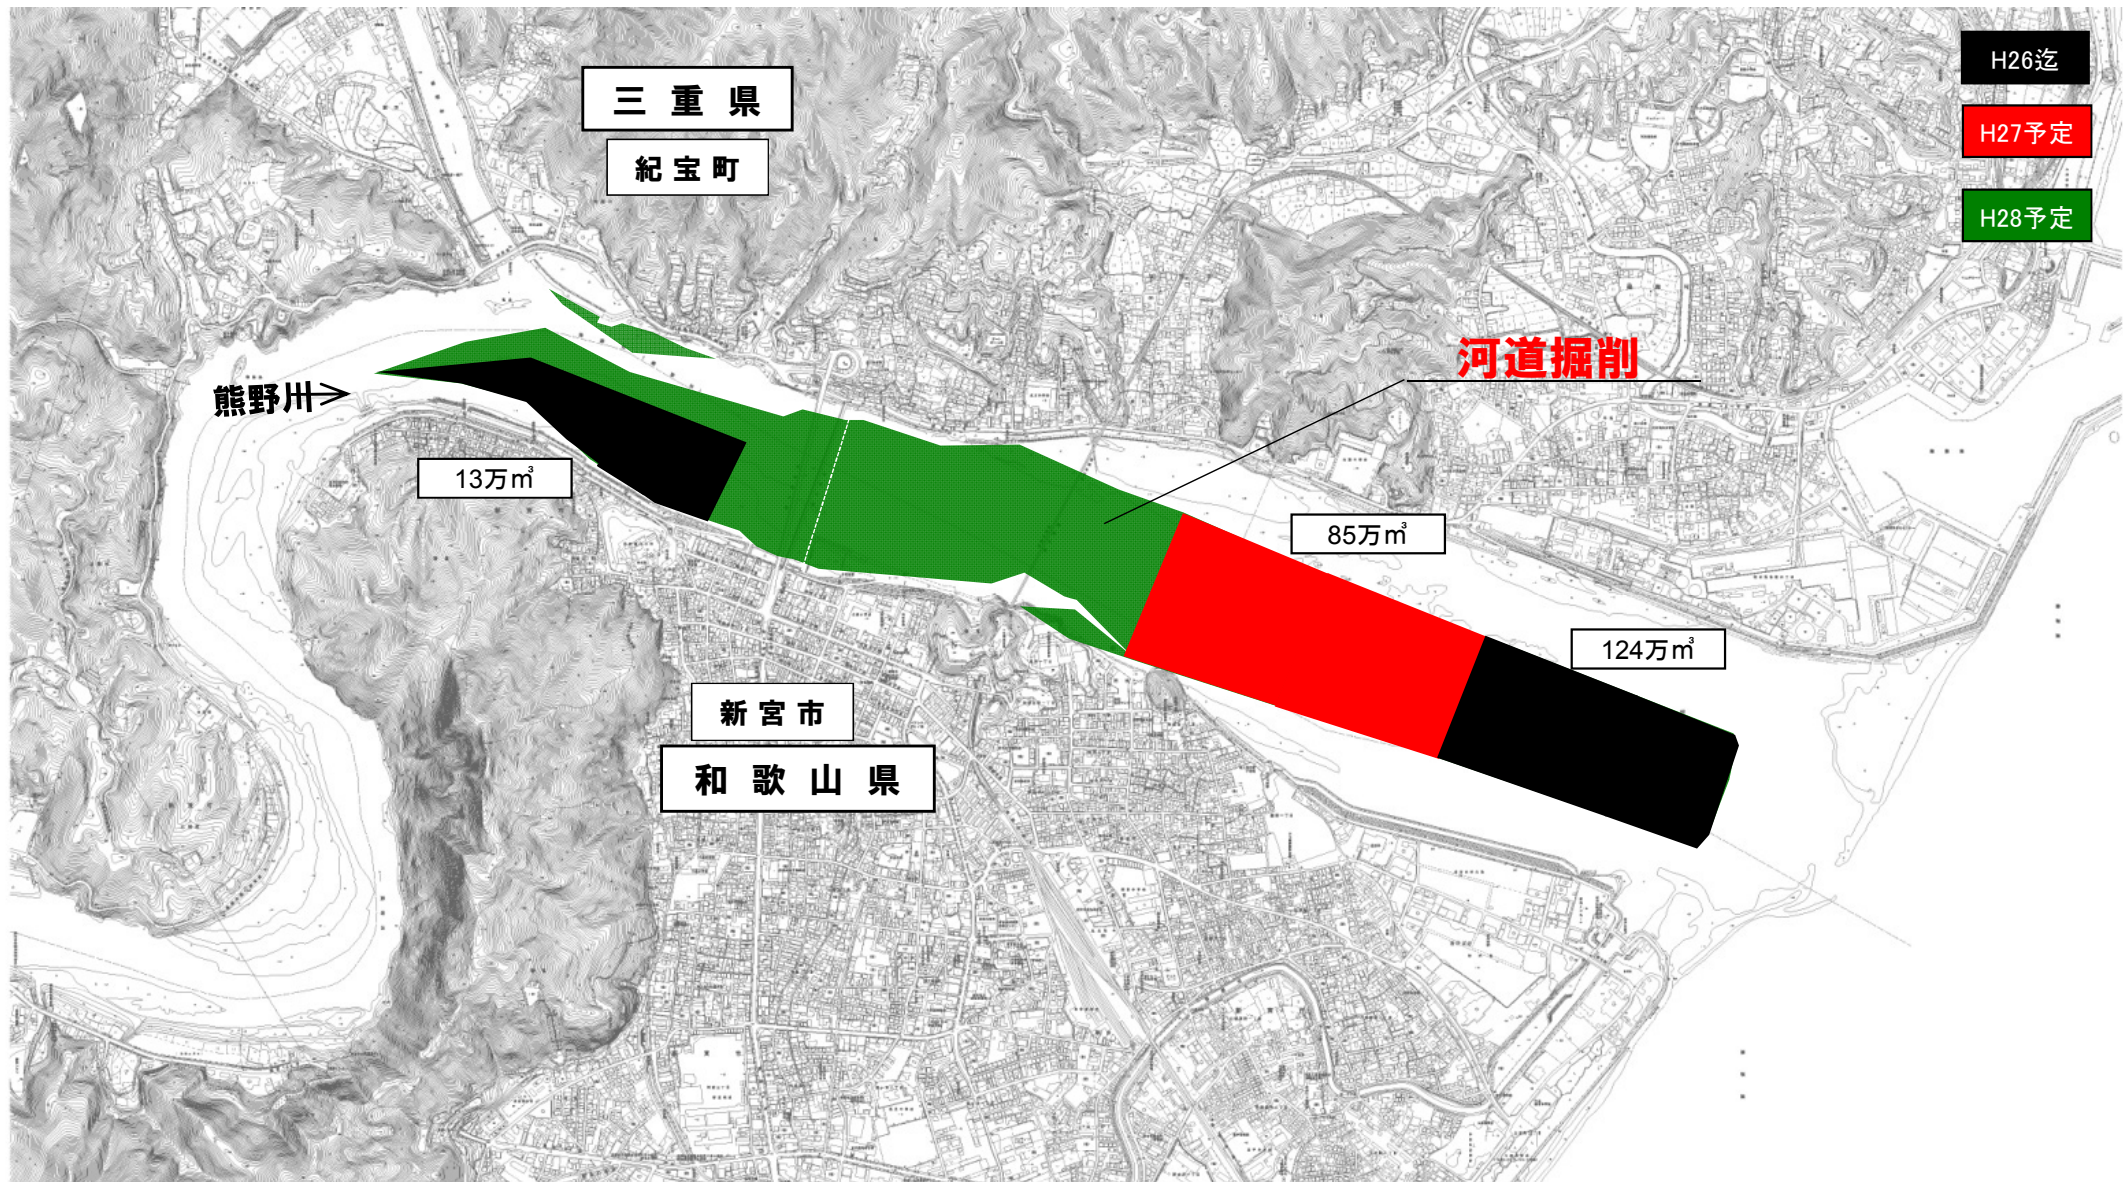

熊野川激特事業実施状況（河道掘削）

掘削状況

H26年度末まで : 約137万 m^3
H27年度（5月末現在） : 約 3万 m^3



【バックホウ浚渫船】 河道掘削状況

掘削土砂の有効活用（七里御浜【^うどのの鵜殿】海岸侵食対策）



H27年6月状況

砂利採取事業者による土砂搬出

これまでの経過

- ・H25/10/22
河川法第25条及び砂利採取法第16条
許可及び認可
(鷺熊砂利生産販売協同組合)
- ・H25/10/28 砂利採取事業者 搬出開始
- ・H27年度末までに「約44万m³」搬出。

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	全体
予定土石量	30万m ³	70万m ³	50万m ³	50万m ³	200万m ³
実績数量	12万m ³	32万m ³			


実績数量は平成27年3月末時点

- ・土石採取事業者 : 鷺熊砂利生産販売協同組合 (紀宝町鮎田)
代表理事 岡本 一彦

※今回 (H27年度当初) の許可・認可

- ・土石採取量 : 5万m³
- ・許可及び認可期間 : 平成27年5月12日～平成27年8月12日
(当初許可日平成25年10月22日)

◆土石採取場所

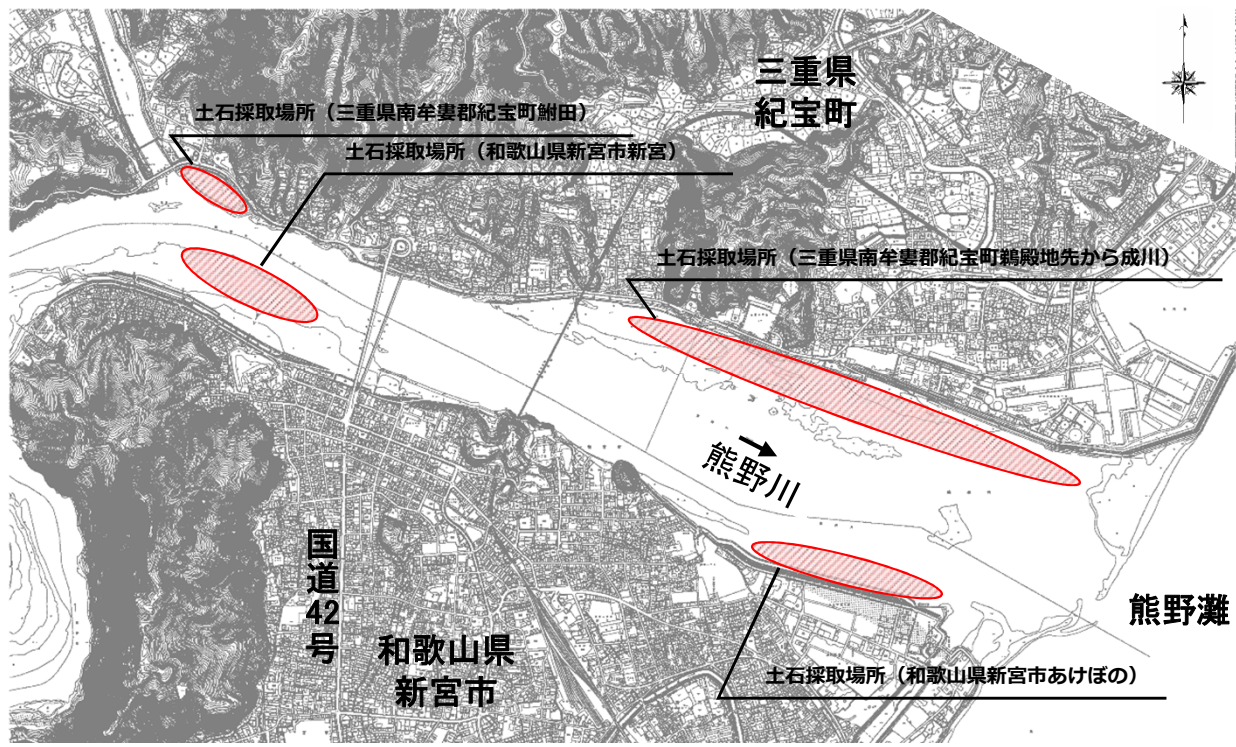

土砂採取場所 (和歌山県新宮市新宮)

※採取は、河川管理者が土石採取場所に仮置した掘削土石を土石採取者に採取させるものです。
