

国土交通省近畿地方整備局
資料配布

配布日時	平成23年9月29日(木) 21時00分
------	-------------------------

件名	平成23年台風12号により発生した 河道閉塞箇所における緊急工事の実施状況について
----	--

概要	<p>奈良、和歌山両県知事からの要請を受け、国土交通省近畿地方整備局は土砂災害防止法に基づく緊急調査の結果を踏まえ、決壊や氾濫のおそれが特に高い河道閉塞箇所について、地域の安全・安心確保のための緊急工事を実施しています。</p> <p><b>赤谷地区、熊野地区の9/29の作業状況 現地作業実施状況資料(別紙参照)</b></p> <p>現地作業写真の電子データ保存について(近畿建設記者クラブ内のパソコンのデスクトップに保存)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>保存フォルダ名 : 20110929 赤谷・熊野 対策工事</li> </ul> <p>データを取得される際は備え付けの名簿に社名等を記載願います。</p>
----	--

取扱い	_____
-----	-------

配布場所	<p>近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ 和歌山県政記者クラブ、和歌山県政放送記者クラブ 和歌山県地方新聞協会、田辺記者クラブ 奈良県政・経済記者クラブ</p>
------	---

問い合わせ先	<p>国土交通省 近畿地方整備局 河川部</p> <p>河川調査官 中込 淳 (内線86-3624)</p> <p>河川計画課長 吉田 一亮(内線86-3611)</p> <p>河川工事課長 下野 公仁(内線86-3711)</p> <p>代表 06-6942-1141</p> <p>直通 06-6945-6355</p>
--------	--

## 赤谷地区(土砂ダム)緊急対策工事

### ヘリコプターによる発動発電機搬入状況




#### 9月29日(木)の作業内容

- ・工事用道路整備工事(クローラ車のみの進入可能) 完了
  - ・工事用道路整備工事(車輛進入可能) 全3000mのうち2700m整備完了(90%)
  - ・進入路設置工事 全1200mのうち800m整備完了(67%)
  - ・排水ポンプ(2.5m<sup>3</sup>/分)、発動発電機搬入
  - ・現況測量
- |             |                     |     |
|-------------|---------------------|-----|
| バックホウ       | 0.7m <sup>3</sup> 級 | 6台  |
| 10t級クローラダンプ |                     | 2台  |
| 7t級ブルドーザ    |                     | 1台  |
| 作業員         |                     | 30名 |

### 進入路設置作業



### 位置図

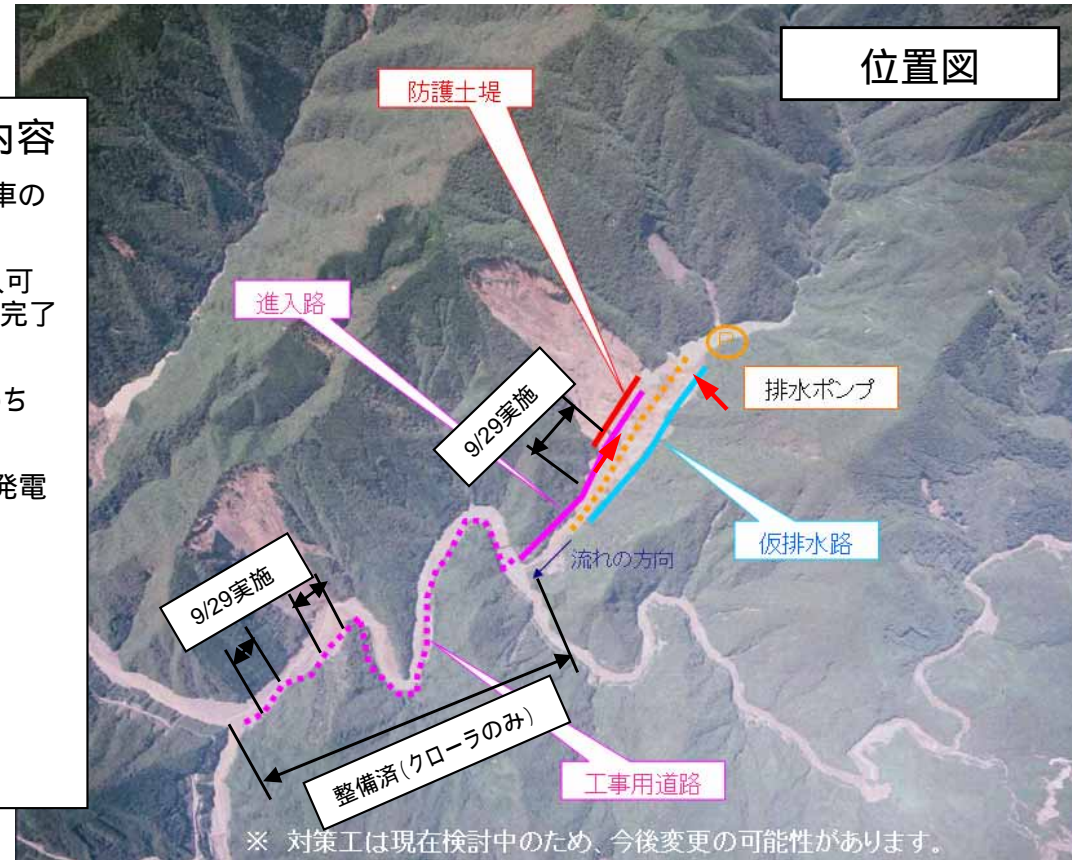

写真内 矢印は撮影方向を示す。

### (今後の予定)

#### 9/30(金)の予定

- ・工事用道路整備工事(車輛進入可能)、進入路設置工事
- ・排水ポンプ(2.5m<sup>3</sup>/分)設置準備作業
- ・0.7m<sup>3</sup>級バックホウ2台、1.2m<sup>3</sup>級バックホウ1台、10t級クローラダンプ1台搬入予定

#### 9/30以降の予定

- ・進入路の完成後、防護土堤及び仮排水路の設置工事に入る予定
  - ・準備完了後、ポンプ排水(2.5m<sup>3</sup>/分)予定
- 天候に大きく左右されることに留意してください。

# 熊野地区(土砂ダム)緊急対策工事

ポンプ用イカダ設置状況



防護土堤作業状況



排水管の敷設状況



## 9月29日(木)の作業内容

- ・進入路整備工事(クローラ車のみ進入可能) 完了
  - ・進入路路盤改良工事(100%)
  - ・ポンプ排水(4m<sup>3</sup>/分)
  - ・防護土堤工事(20%)
  - ・排水設備(30%)
- 排水ホース敷設、ポンプの設置準備
- バックホウ 0.45m<sup>3</sup>級 5台  
不整地運搬車 6t級 1台  
作業員 27名

写真内 矢印は左の写真番号を示し、矢印は撮影方向を示す。

## (今後の予定)

- 9/30(金)の予定
- ・防護土堤工事
  - ・排水ホース敷設、ポンプ(2.5m<sup>3</sup>/分 × 8台)設置作業。
  - ・ポンプによる湛水部の排水(排水量4m<sup>3</sup>/分)を継続。
- 9/30以降の予定
- 防護土堤工事を進める予定
  - 天候に大きく左右されることに留意してください。
