


野洲栗東バイパス事業 工事進捗レポート

令和6年11月

TOPICS 野洲栗東バイパス七間場高架橋P32橋脚他工事 アスベストの撤去状況

R6.11月 撮影

橋梁下部工事、改良工事をするため、アスベスト混じり土を撤去処分し、良質土に置き換える作業を進めています。

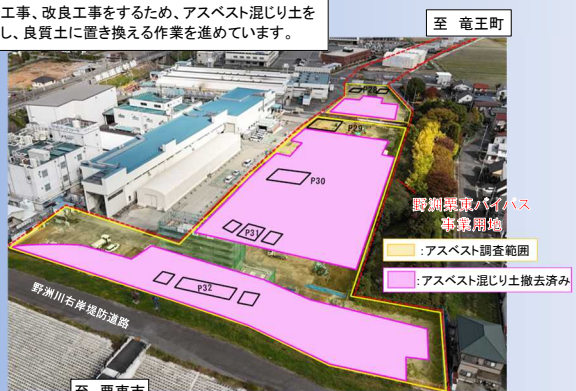

TOPICS 1 野洲栗東バイパス出座地区橋断面異他設置工事、野洲栗東バイパス出座西地区断面異他設置工事、野洲栗東バイパス出座地区道路改良(2期)工事、野洲栗東バイパス中地区断面異他設置工事、野洲栗東バイパス中地区道路改良工事、野洲栗東バイパス宅屋地区道路改良工事

R6.11月 撮影




TOPICS 2 野洲栗東バイパス出座3号高架橋橋脚上部工事、野洲栗東バイパス大橋北地区護壁設置他工事、野洲栗東バイパス大橋北地区道路改良工事、野洲栗東バイパス大橋高架橋橋脚上部工事、野洲栗東バイパス手原地区道路構造物他工事

R6.11月 撮影




TOPICS 3 野洲栗東バイパス手原高架橋下部他工事、野洲栗東バイパス名神OFFランプ橋脚上部工事、野洲栗東バイパス手原地区排水構造物他工事、野洲栗東バイパス手原高架橋橋脚上部工事

R6.11月 撮影

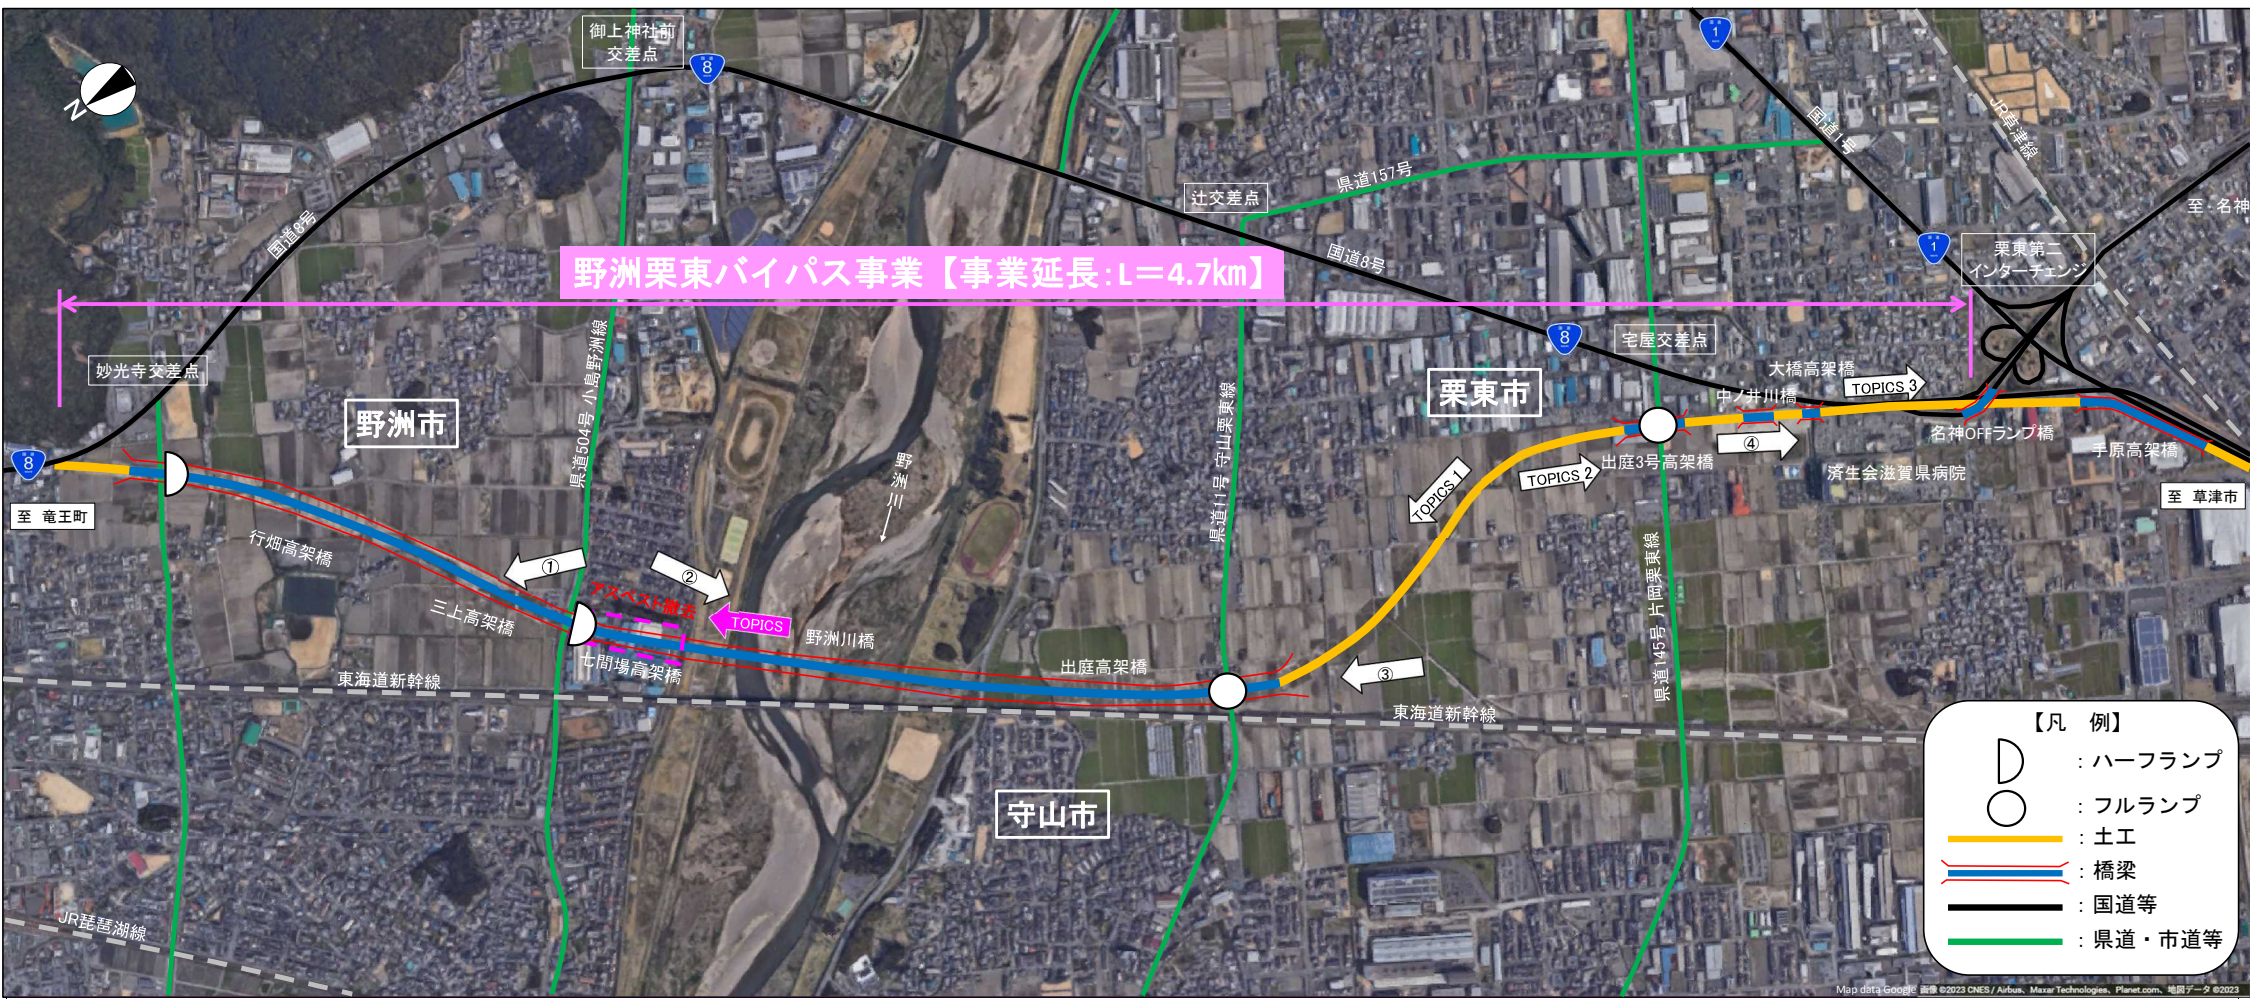

地区名	野洲市	守山市	栗東市
小橋原地区	妙光寺地区	行畑地区	三上地区
延長	1.90 km	0.60 km	2.20 km
道路構造	土工	PC橋	PC橋
橋梁	行畑高架橋	三上高架橋	七間場高架橋
橋脚	野洲川橋	出庭高架橋	中ノ井川橋
橋脚上部工事	大橋高架橋	名神OFFランプ橋	手原高架橋
橋脚下部工事	野洲栗東バイパス手原高架橋下部他工事	野洲栗東バイパス名神OFFランプ橋脚上部工事	野洲栗東バイパス手原地区排水構造物他工事
橋脚上部工事	野洲栗東バイパス手原高架橋橋脚上部工事	野洲栗東バイパス手原地区排水構造物他工事	野洲栗東バイパス手原高架橋橋脚上部工事

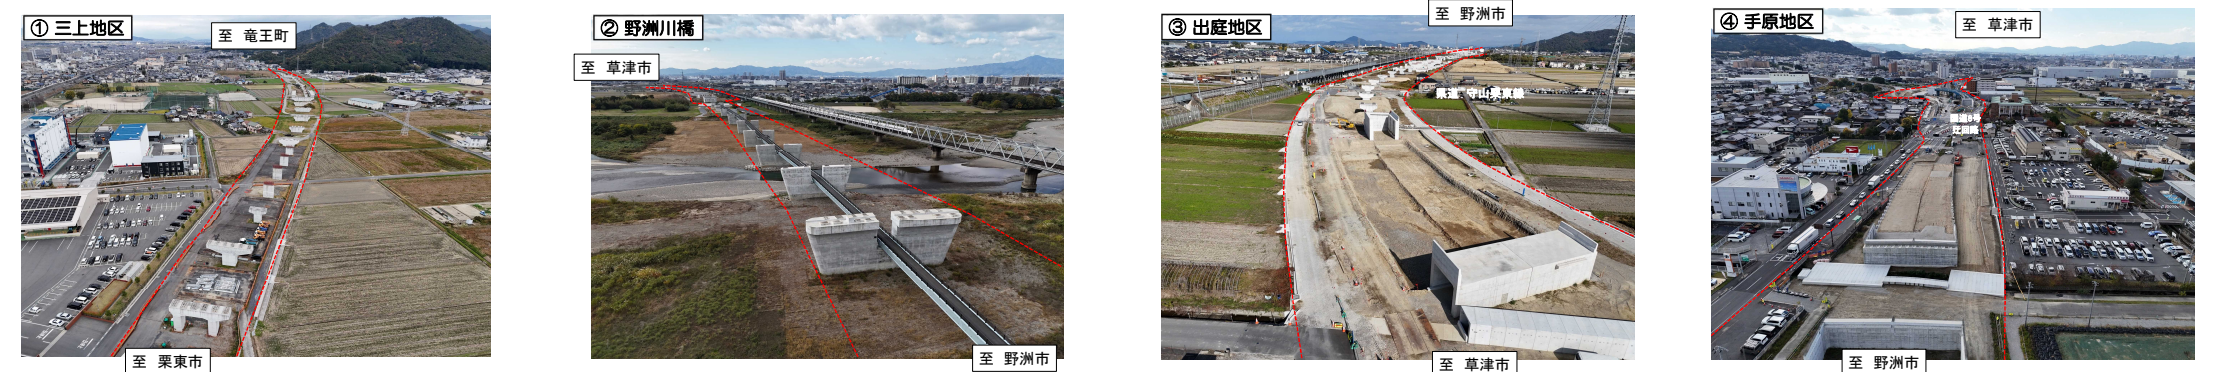

※アスベスト処分量の増加により、令和7年秋全線開通は遅延するものの、工事工程を精査し、できる限り早期に開通できるよう検討してまいります。
