

小松拡幅(14工区)事業 工事進捗レポート


令和6年4月

TOPICS 1

小松拡幅北小松トンネル舗装他工事
小松拡幅北小松跨道橋下部他道路改良工事
小松拡幅荻野北地区道路改良工事

R6.4月 撮影

北小松跨道橋の下部工が完成後、上部工のPC桁を架設します。跨道橋が完成すれば、道路改良工事を行います。並行して、トンネル区間は舗装作業を行っています。

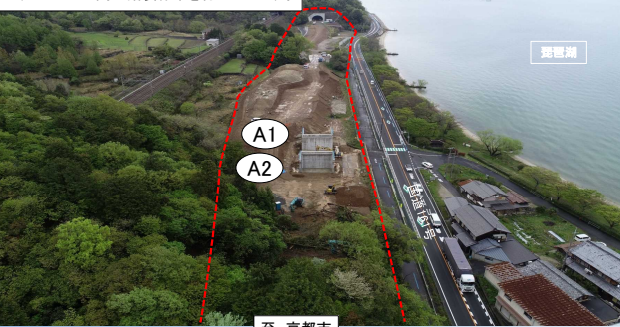

至 高島市

至 京都市

TOPICS 2

小松拡幅荻野北地区道路改良工事、小松拡幅牛山地区改良工事
小松拡幅荻野南地区道路改良工事

R6.4月 撮影

道路改良工事
水路の一部が整備完了しました。引き続き、水路と構造物の整備を進めて、盛土作業を行う予定です。



至 京都市


至 高島市

TOPICS 3

小松拡幅北小松高架橋(P8～P12)PC上部工事
小松拡幅北小松高架橋(P22～A2)PC上部工事

R6.4月 撮影

橋脚上部工事
現在、P8～P12橋脚間の橋梁桁を製作しています。新しく、P22橋脚～A2橋台間の上部工事の施工準備が始まっています。

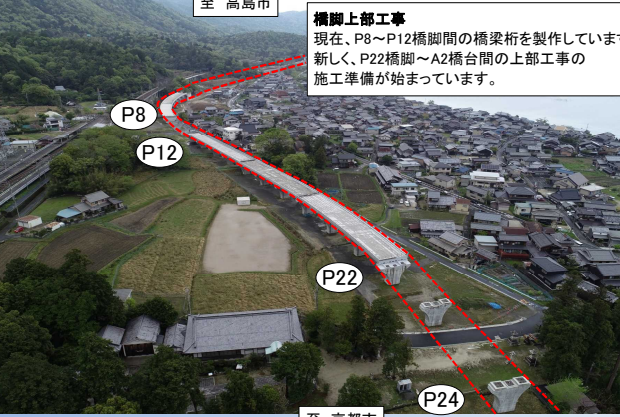

至 高島市


至 京都市

TOPICS 4

小松拡幅滝川橋他PC上部工事
小松拡幅滝川地区改良工事



R6.4月 撮影

今後、滝川橋の拡幅を行い、切り回り道路の整備を行います。

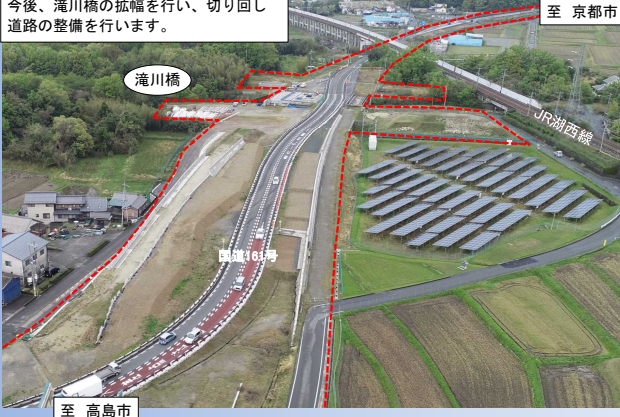

至 京都市

至 高島市

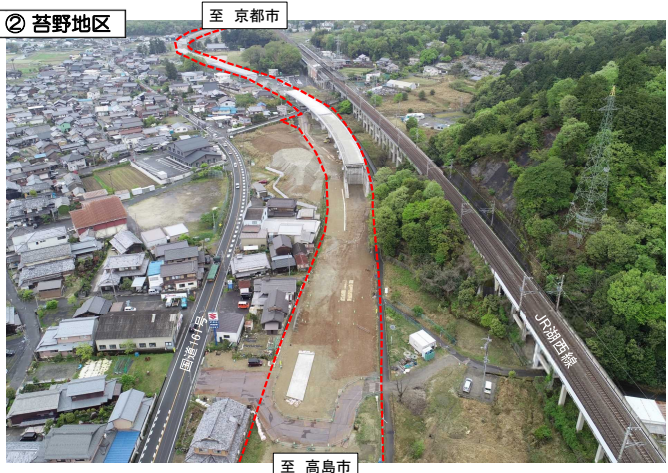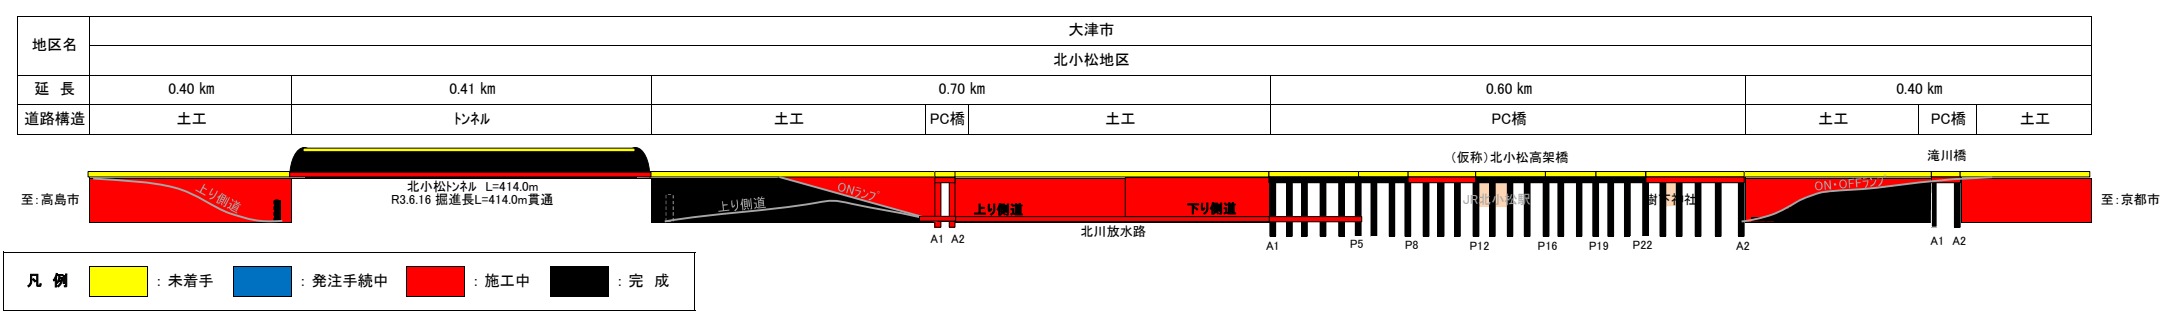

小松拡幅(14工区)事業 工事進捗レポート

令和6年5月

TOPICS 1

小松拡幅北小松トンネル舗装他工事、小松拡幅北小松跨道橋下部他道路改良工事
小松拡幅荻野北地区道路改良工事、小松拡幅滝川橋他PC上部工事

R6.5月 撮影

舗装工事
トンネル内の舗装を施工しています。

至 高島市

至 京都市

至 琵琶湖

TOPICS 2

小松拡幅荻野北地区道路改良工事、小松拡幅牛山地区改良工事
小松拡幅荻野南地区道路改良工事

R6.5月 撮影

道路改良工事
水路の一部が整備完了しました。
引き続き、水路と構造物の整備を進めて、
盛土作業を行う予定です。

至 京都市

至 高島市

TOPICS 3

小松拡幅北小松高架橋(P8～P12)PC上部工事
小松拡幅北小松高架橋(P22～A2)PC上部工事

R6.5月 撮影

橋脚上部工事
現在、P8～P12橋脚間の橋梁桁を製作しています。
新しく、P22橋脚～A2橋台間の上部工事の
施工準備が始まっています。

至 高島市

至 京都市

TOPICS 4



小松拡幅滝川橋他PC上部工事
小松拡幅滝川地区改良工事

R6.5月 撮影



今後、滝川橋の拡幅を行い、切り直し
道路の整備を行います。

至 京都市

至 高島市

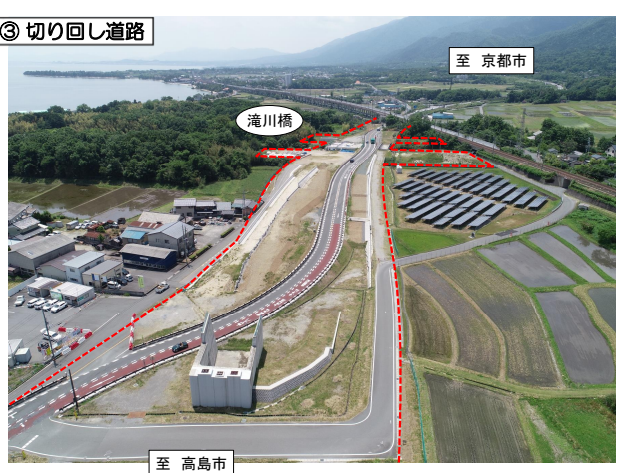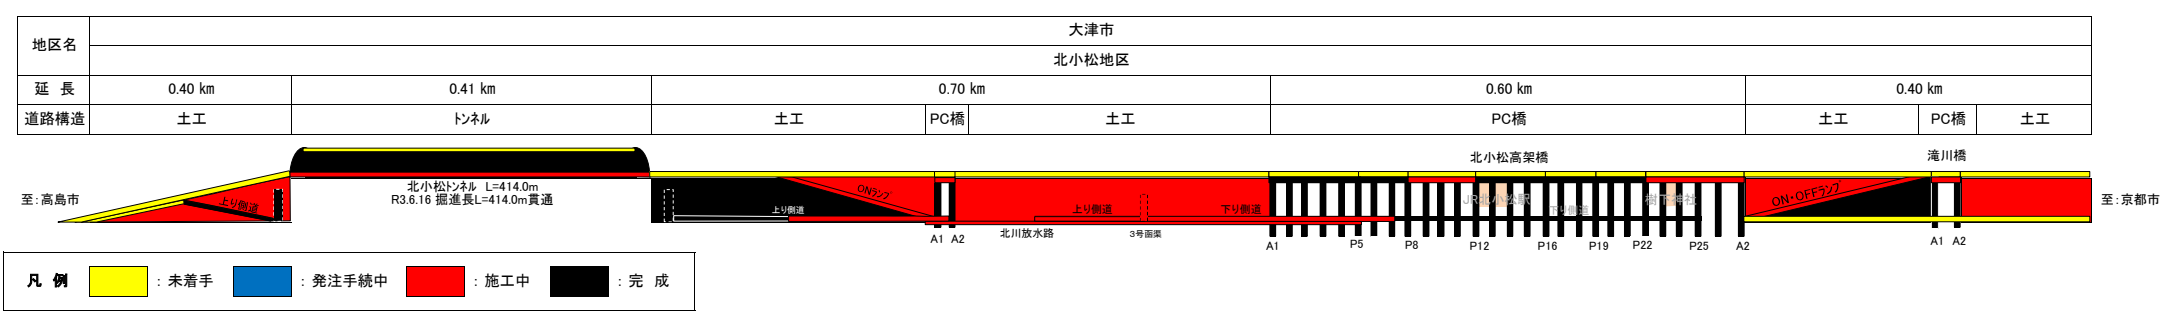

令和6年6月

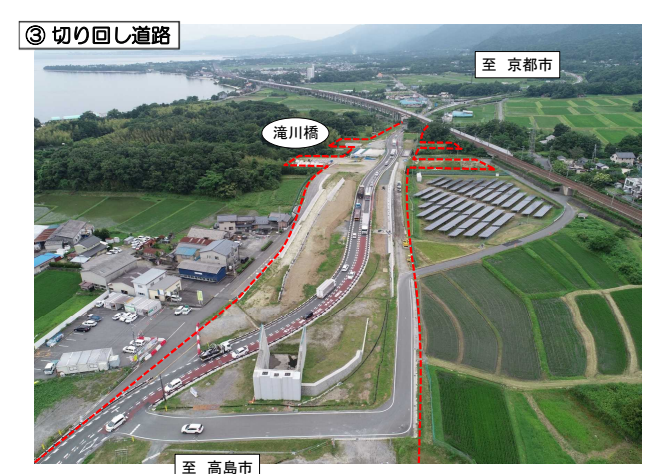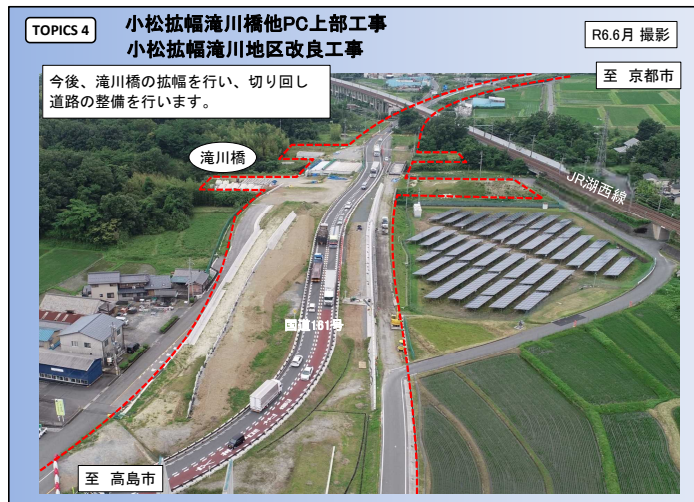

小松拡幅(14工区)事業 工事進捗レポート


令和6年7月

TOPICS 1 小松拡幅北小松跨道橋下部他道路改良工事、小松拡幅苔野北地区道路改良工事

R6.7月撮影

舗装工事、跨道橋
トンネル内の舗装及び上部工の施工
が完了しました。


道路改良工事
跨道橋の施工が終わり、道路
盛土を施工しています。

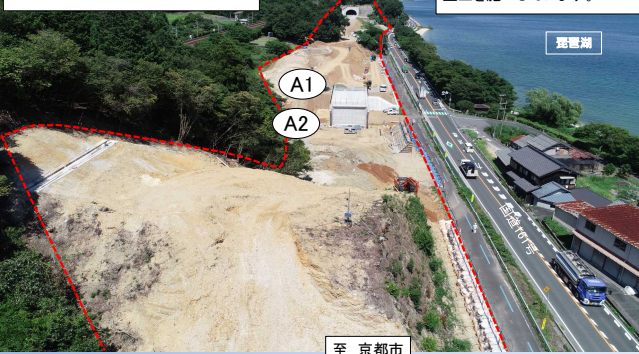

TOPICS 2 小松拡幅苔野北地区道路改良工事、小松拡幅牛山地区改良工事 小松拡幅苔野南地区道路改良工事

R6.7月撮影

道路改良工事
水路の一部が整備完了しました。
引続き、水路と構造物の整備を進めて、
盛土作業を行う予定です。

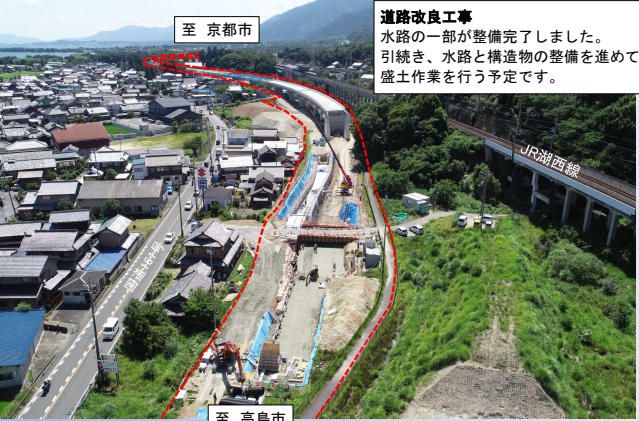

TOPICS 3 小松拡幅北小松高架橋(P8～P12)PC上部工事 小松拡幅北小松高架橋(P22～A2)PC上部工事


R6.7月撮影



上部工事
現在、P8～P12橋脚間及びP22～P24橋脚間の
上部工を施工しています。

TOPICS 4 小松拡幅滝川地区改良工事 小松拡幅北小松高架橋(P22～A2)PC上部工事



R6.7月撮影

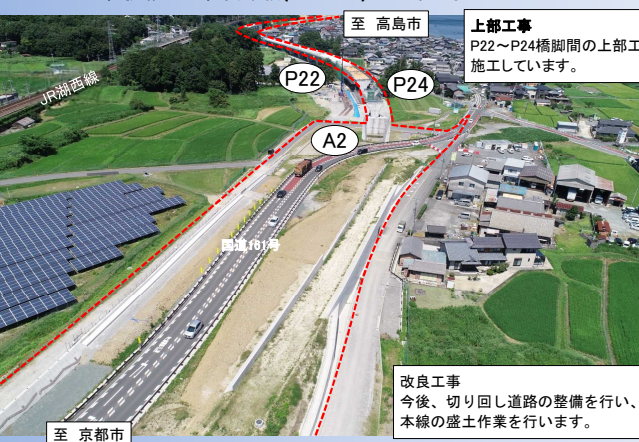

改良工事
今後、切り直し道路の整備を行い、
本線の盛土作業を行います。




- 【凡 例】
- 土工
 - 橋 梁
 - トンネル
 - 国 道
 - 県道・市道等

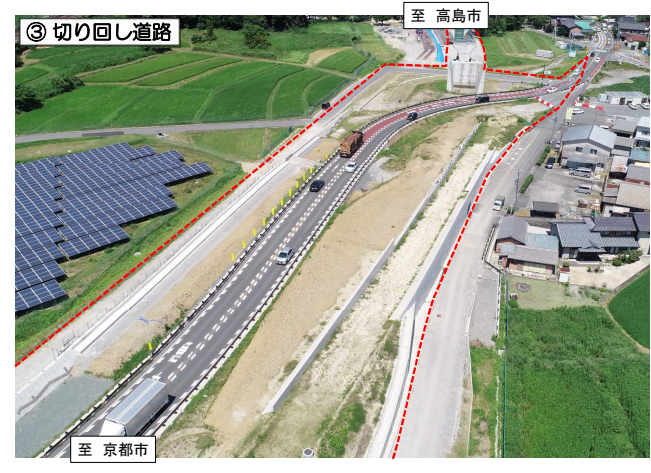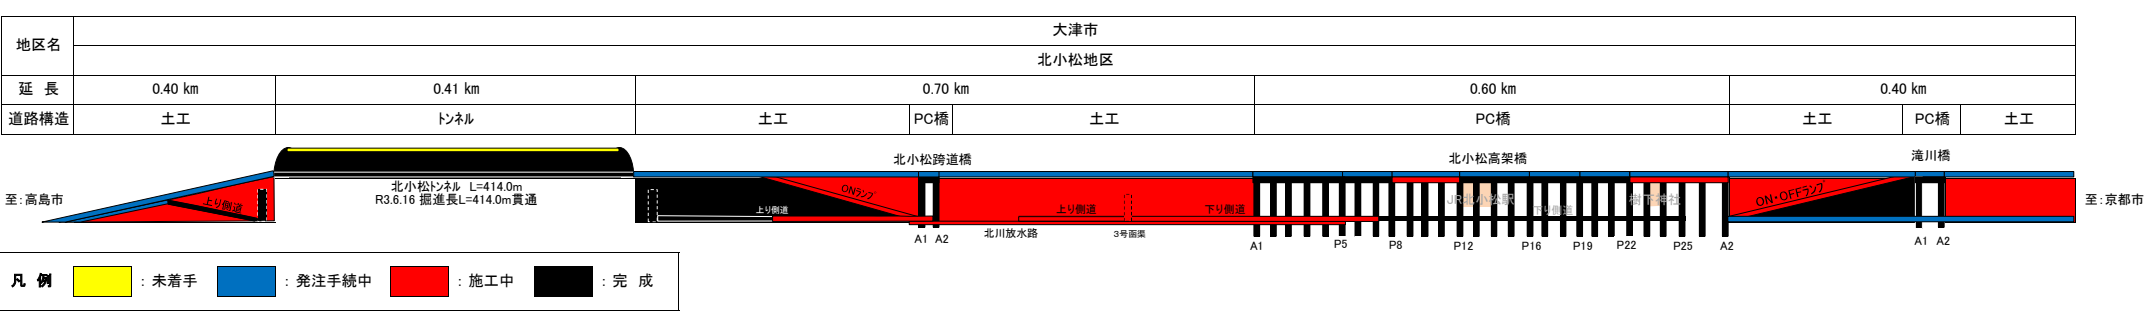

小松拡幅(14工区)事業 工事進捗レポート

令和6年8月

TOPICS 1 小松拡幅北小松跨道橋下部他道路改良工事
小松拡幅苜蓿野北地区道路改良工事 R6.8月撮影

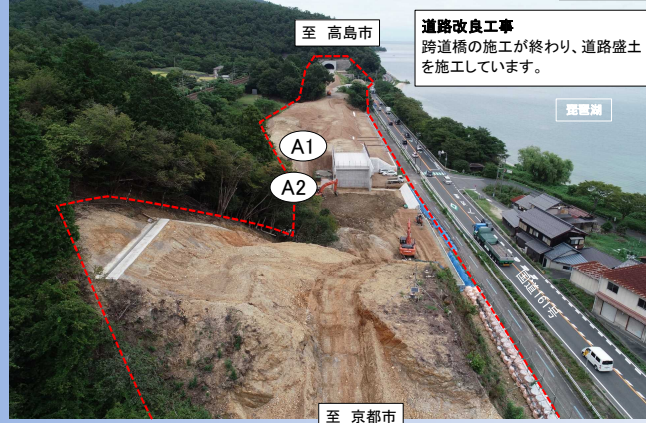






TOPICS 2 小松拡幅苜蓿野北地区道路改良工事、小松拡幅牛山地区改良工事
小松拡幅苜蓿野南地区道路改良工事 R6.8月撮影



TOPICS 3 小松拡幅北小松高架橋(P8～P12)PC上部工事
小松拡幅北小松高架橋(P22～A2)PC上部工事 R6.8月撮影



TOPICS 4 小松拡幅滝川地区改良工事
小松拡幅北小松高架橋(P22～A2)PC上部工事 R6.8月撮影

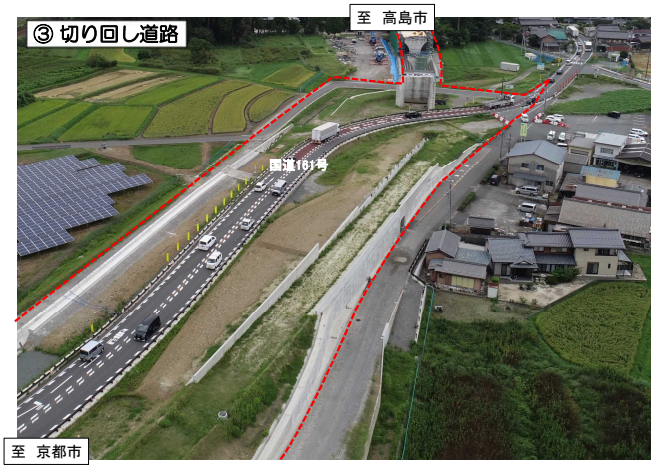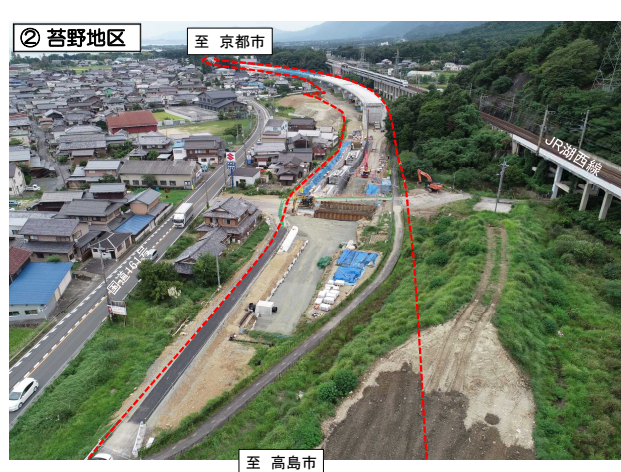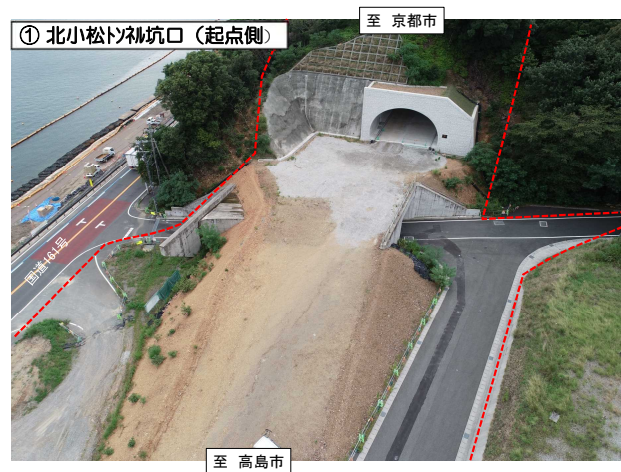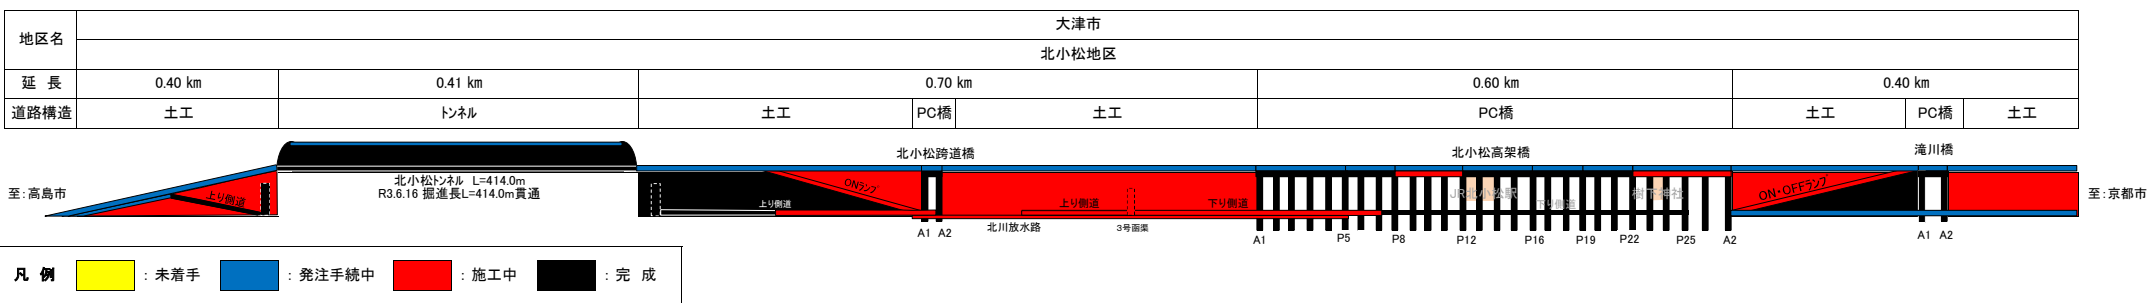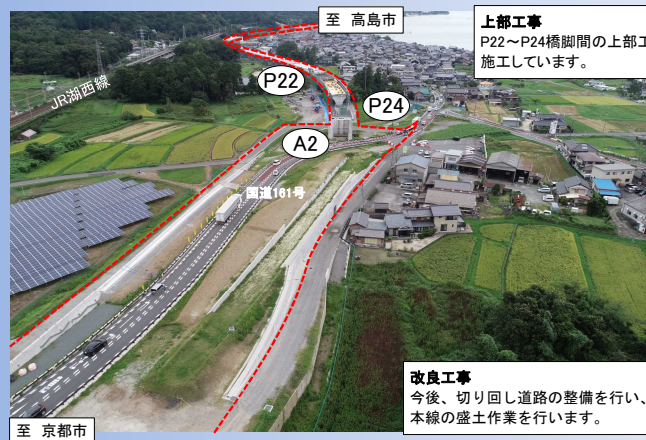

小松拡幅(14工区)事業 工事進捗レポート

令和6年9月

TOPICS 1 小松拡幅荳野北地区道路改良工事
小松拡幅北小松地区道路改良他工事

R6.9月撮影

道路改良工事
道路盛土を施工しています。

至 高島市

至 京都市

琵琶湖

TOPICS 2 小松拡幅荳野北地区道路改良工事、小松拡幅牛山地区改良工事
小松拡幅荳野南地区道路改良工事

R6.9月撮影

道路改良工事
水路の一部が整備完了しました。引き続き、水路と構造物の整備を進めて、盛土作業を行う予定です。

至 京都市

至 高島市

TOPICS 3 小松拡幅北小松高架橋(P8～P12)PC上部工事
小松拡幅北小松高架橋(P22～A2)PC上部工事

R6.9月撮影

上部工事
現在、P8～P12橋脚間及びP22～P24橋脚間の上部工を施工しています。

至 京都市

至 高島市

TOPICS 4 小松拡幅滝川地区改良工事
小松拡幅北小松高架橋(P22～A2)PC上部工事



R6.9月撮影

上部工事
P22～P24橋脚間の上部工を施工しています。

至 高島市

至 京都市

改良工事
今後、切り直し道路の整備を行い、本線の盛土作業を行います。

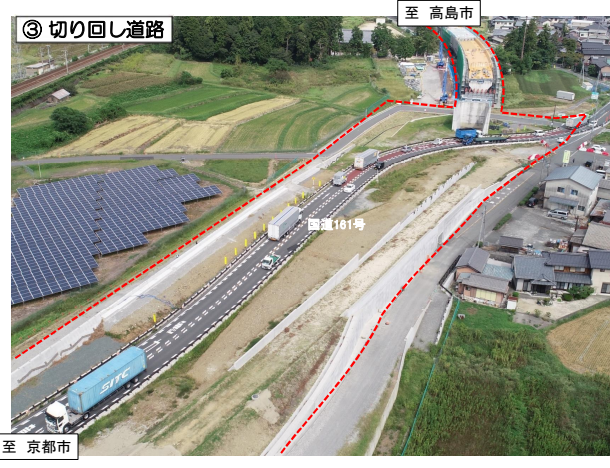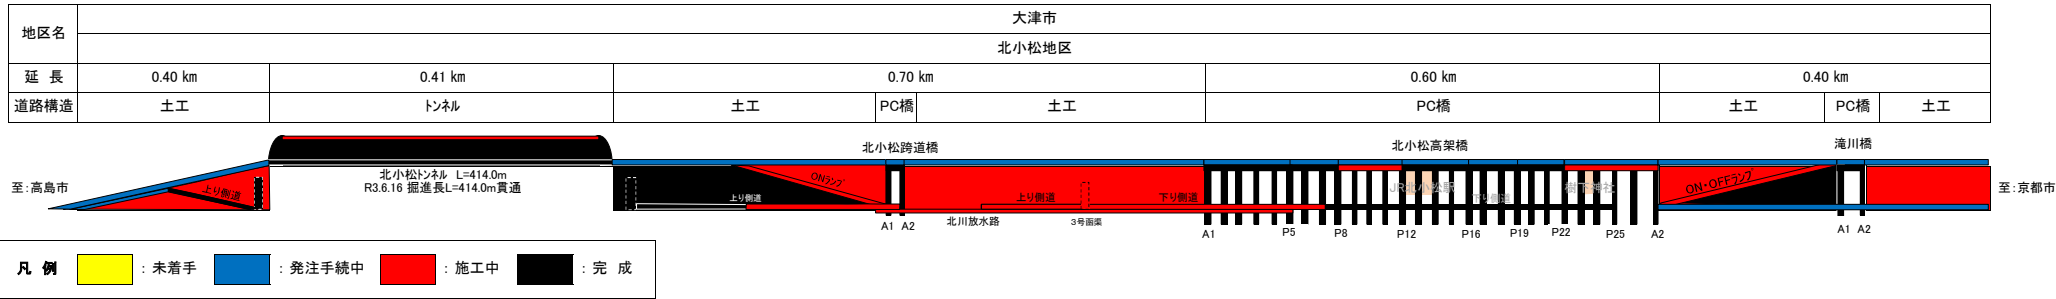

小松拡幅(14工区)事業 工事進捗レポート

令和6年10月

TOPICS 1 小松拡幅苜蓿野北地区道路改良工事、小松拡幅牛山地区他舗装工事 小松拡幅北小松地区道路改良他工事

R6.10月 撮影



道路改良工事
道路盛土を施工しています。

琵琶湖

TOPICS 2 小松拡幅苜蓿野北地区道路改良工事、小松拡幅牛山地区改良工事 小松拡幅苜蓿野南地区道路改良工事、小松拡幅牛山地区他舗装工事

R6.10月 撮影



道路改良工事
水路の一部が整備完了しました。
引き続き、水路と構造物の整備を進めて、盛土作業を行う予定です。

至高島市

TOPICS 3 小松拡幅北小松高架橋(P8～P12)PC上部工事 小松拡幅北小松高架橋(P22～A2)PC上部工事 小松拡幅苜蓿野地区他舗装工事

R6.10月 撮影




上部工事
現在、P8～P12橋脚間及びP22～P24橋脚間の上部工を施工しています。

至高島市


TOPICS 4 小松拡幅滝川地区改良工事、小松拡幅滝川地区他舗装工事 小松拡幅北小松高架橋(P22～A2)PC上部工事

R6.10月 撮影


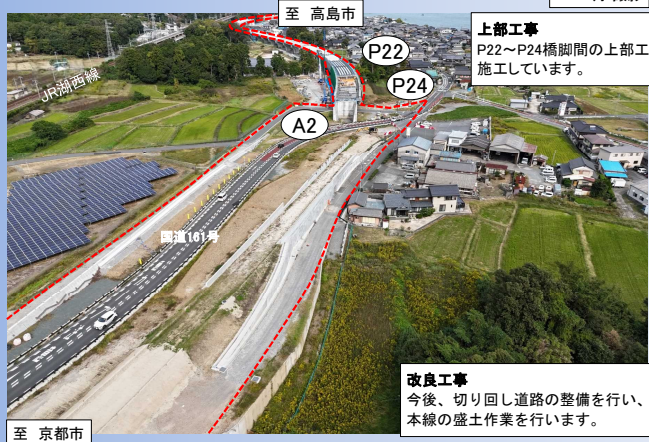


改良工事
今後、切り直し道路の整備を行い、本線の盛土作業を行います。

至京都市



地区名	大津市									
	北小松地区									
延 長	0.40 km	0.41 km	0.70 km				0.60 km			0.40 km
道路構造	土工	トンネル	土工	PC橋	土工			PC橋	土工	PC橋



TOPICS 1 小松拡幅苔野北地区道路改良工事、小松拡幅牛山地区他舗装工事
小松拡幅北小松地区道路改良他工事 R6.11月撮影

至 高島市

道路改良工事
道路盛土を施工しています。

琵琶湖

至 京都市

TOPICS 2 小松拡幅苔野北地区道路改良工事、小松拡幅牛山地区改良工事
小松拡幅苔野南地区道路改良工事、小松拡幅牛山地区他舗装工事 R6.11月撮影

至 京都市

道路改良工事
水路の一部が整備完了しました。
引き続き、水路と構造物の整備を進めて、盛土作業を行う予定です。

至 高島市

TOPICS 3 小松拡幅北小松高架橋(P8～P12)PC上部工事
小松拡幅北小松高架橋(P22～A2)PC上部工事
小松拡幅苔野地区他舗装工事 R6.11月撮影

至 京都市

至 高島市

上部工事
現在、P8～P12橋脚間及びP22～P24橋脚間の上部工を施工しています。

TOPICS 4 小松拡幅滝川地区改良工事、小松拡幅滝川地区他舗装工事
小松拡幅北小松高架橋(P22～A2)PC上部工事 R6.11月撮影

至 高島市



至 京都市

上部工事
P22～P24橋脚間の上部工を施工しています。

改良工事
今後、切り回し道路の整備を行い、本線の盛土作業を行います。

小松拡幅(14工区)事業 工事進捗レポート

令和6年11月

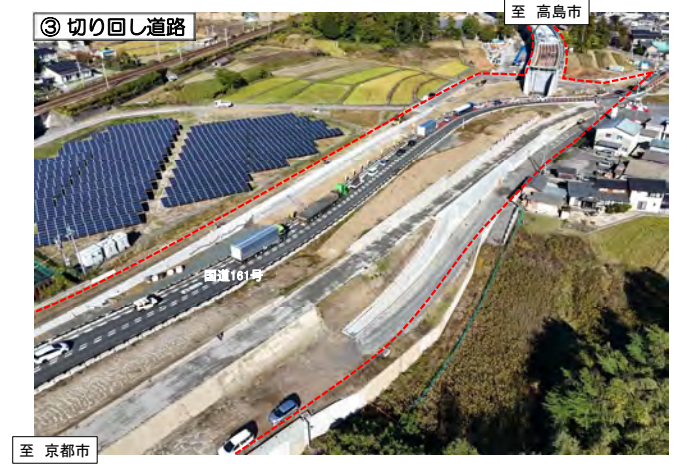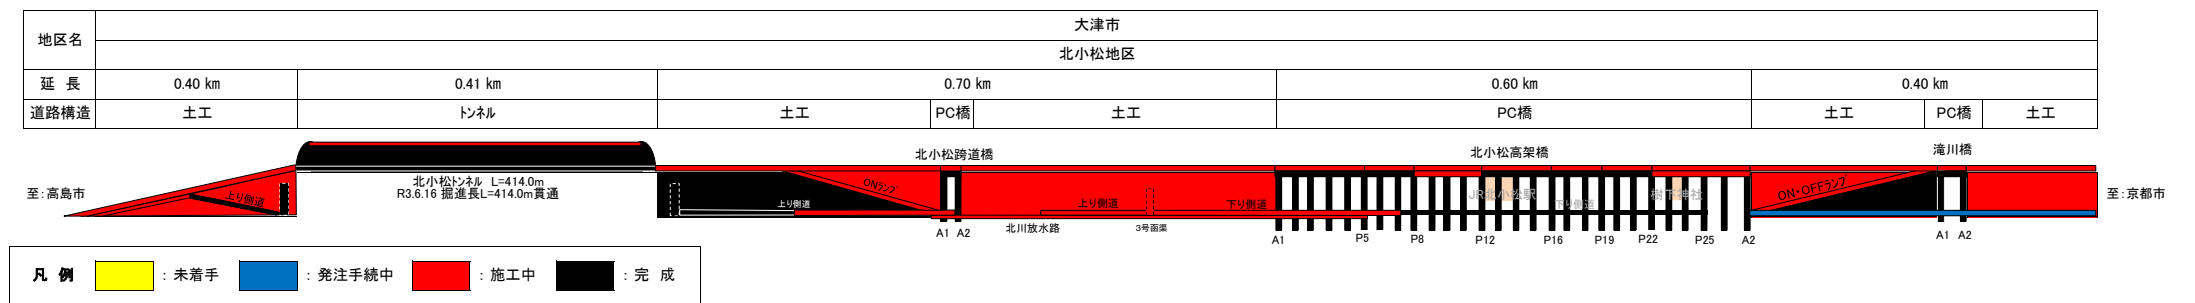

TOPICS 1 小松拡幅荅野北地区道路改良工事、小松拡幅牛山地区他舗装工事
小松拡幅北小松地区道路改良他工事 R6.12月 撮影

至 高島市

現在、本線盛土の施工を進めており、その後、舗装工事を行います。

至 京都市

TOPICS 2 小松拡幅荅野北地区道路改良工事、小松拡幅牛山地区改良工事
小松拡幅荅野南地区道路改良工事、小松拡幅牛山地区他舗装工事 R6.12月 撮影

至 京都市

現在、本線盛土の施工を進めており、その後、舗装工事を行います。

至 高島市

TOPICS 3 小松拡幅北小松高架橋(P8～P12)PC上部工事
小松拡幅北小松高架橋(P22～A2)PC上部工事
小松拡幅荅野地区他舗装工事 R6.12月 撮影

至 京都市

至 高島市

上部工事
現在、P8～P12橋脚間及びP22～A2橋脚間の上部工を施工しています。

TOPICS 4 小松拡幅滝川地区改良工事、小松拡幅滝川地区他舗装工事
小松拡幅北小松高架橋(P22～A2)PC上部工事 R6.12月 撮影

至 高島市


至 京都市

上部工事
P22～A2橋脚間の上部工を施工しています。

改良工事
今後、切り直し道路の整備を行い、本線の盛土作業を行います。

小松拡幅(14工区)事業 工事進捗レポート

令和6年12月

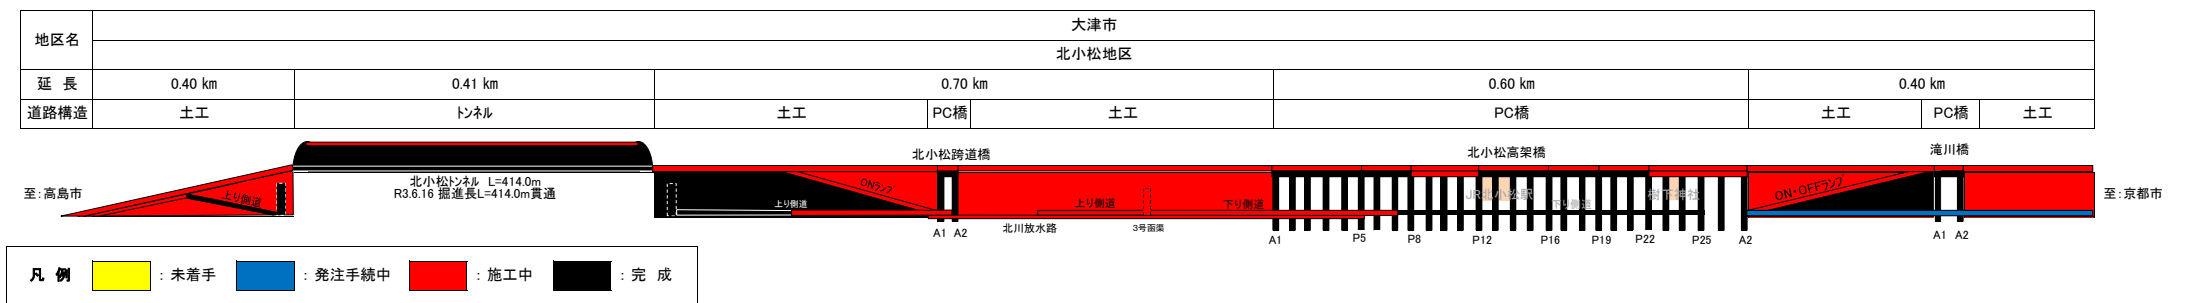

TOPICS 1 小松拡幅荅野北地区道路改良工事、小松拡幅牛山地区他舗装工事
小松拡幅北小松地区道路改良他工事

R7.1月 撮影



現在、本線盛土の施工を進めており、その後、舗装工事を行います。

琵琶湖

至 高島市

至 京都市

TOPICS 2 小松拡幅荅野北地区道路改良工事、小松拡幅牛山地区改良工事
小松拡幅荅野南地区道路改良工事、小松拡幅牛山地区他舗装工事

R7.1月 撮影



現在、本線盛土の施工を進めており、その後、舗装工事を行います。

至 高島市

TOPICS 3 小松拡幅北小松高架橋(P8～P12)PC上部工事
小松拡幅北小松高架橋(P22～A2)PC上部工事
小松拡幅荅野南地区他舗装工事

R7.1月 撮影



上部工事
現在、P8～P12橋脚間及びP22～A2橋脚間の上部工を施工しています。

至 高島市

TOPICS 4 小松拡幅滝川地区改良工事、小松拡幅滝川地区他舗装工事
小松拡幅北小松高架橋(P22～A2)PC上部工事

R7.1月 撮影





上部工事
P22～A2橋脚間の上部工を施工しています。

改良工事
1月31日に道路の切替えをしました。今後、本線の盛土作業を行います。

至 京都市

小松拡幅(14工区)事業 工事進捗レポート


令和7年1月

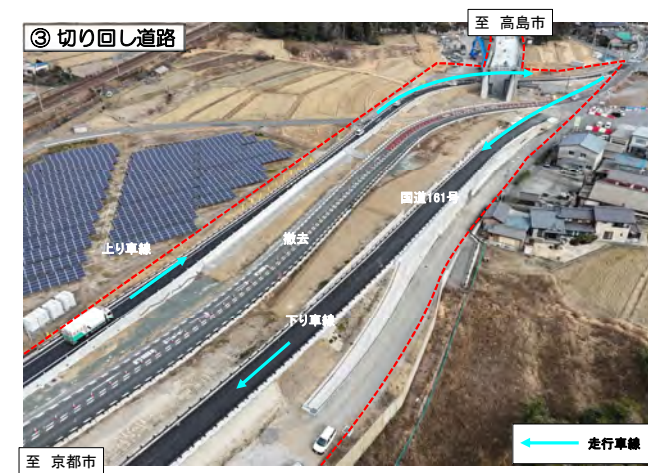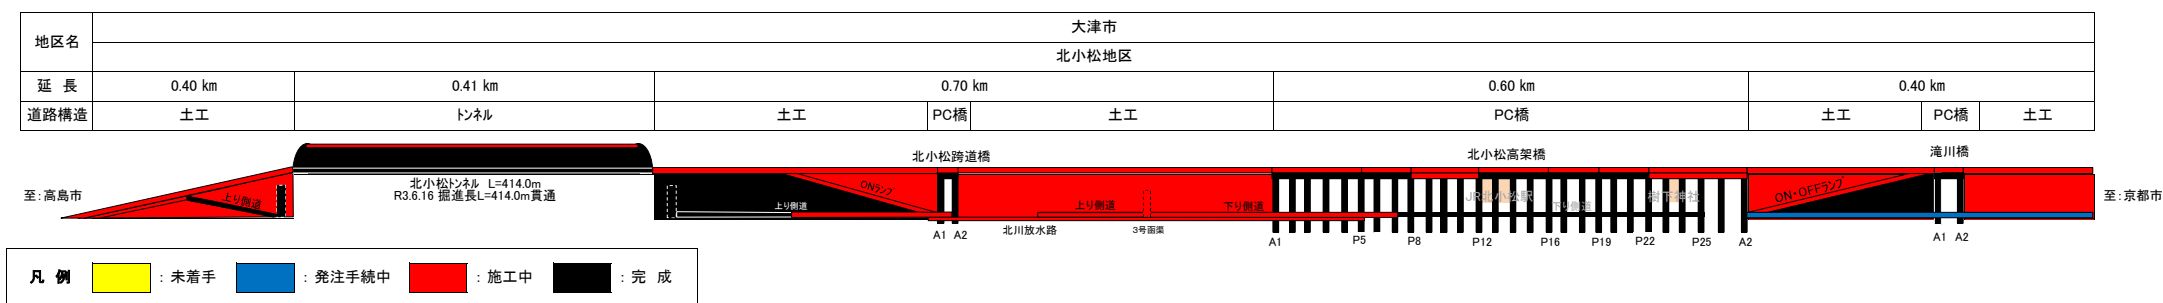

TOPICS 1

小松拡幅若野北地区道路改良工事、小松拡幅牛山地区他舗装工事
小松拡幅北小松地区道路改良他工事

R7.2月 撮影

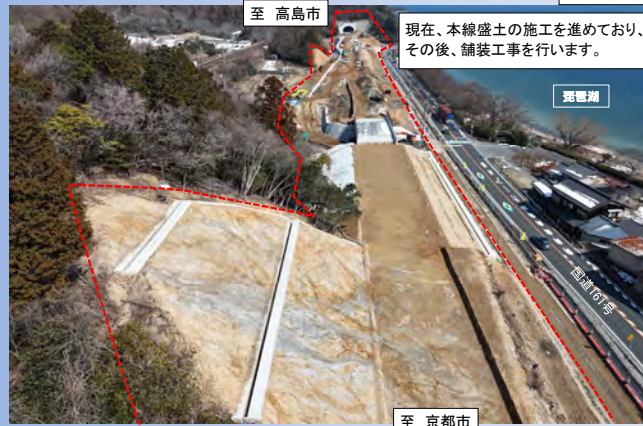

TOPICS 2

小松拡幅苔野北地区道路改良工事、小松拡幅牛山地区改良工事
小松拡幅苔野南地区道路改良工事、小松拡幅牛山地区他舗装工事

R7.2月 撮影



TOPICS 3

小松拡幅北小松高架橋(P8～P12)PC上部工事
小松拡幅北小松高架橋(P22～A2)PC上部工事
小松拡幅苔野地区他舗装工事


R7.2月 撮影



TOPICS 4

小松拡幅滝川地区改良工事、小松拡幅滝川地区他舗装工事
小松拡幅北小松高架橋(P22～A2)PC上部工事

R7.2月 撮影

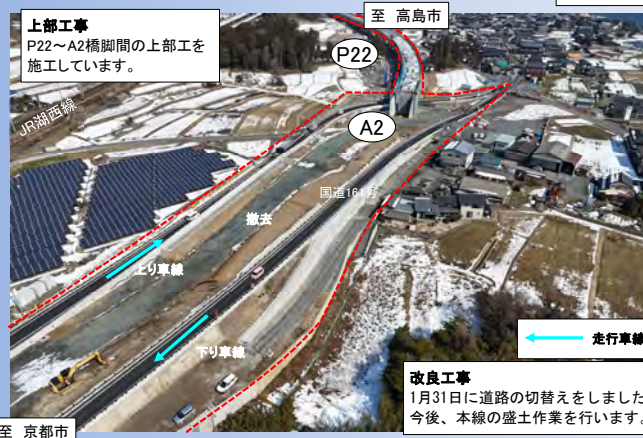

改良工事
1月31日に道路の切替えをしました。
今後、本線の盛土作業を行います。

小松拡幅(14工区)事業 工事進捗レポート

令和7年2月



令和7年秋開通予定

【凡 例】

 : 土 工
 : 橋 梁
 : トンネル
 : 国 道
 : 県道・市道等

地区名	大津市 北小松地区										
延 長	0.40 km	0.41 km	0.70 km			0.60 km			0.40 km		
道路構造	土工	トンネル	土工	PC橋	土工	PC橋			土工	PC橋	土工

至:高崎市

北小松トンネル L=114.0m
R3.6.16 掘進長L=414.0m貫通

北小松跨道橋

北小松高架橋

浅川橋

至:京都市

凡 例

: 未着手

: 発注手続中

: 施工中

: 完 成

小松拡幅(14工区)事業 工事進捗レポート

令和7年3月

TOPICS 1 小松拡幅荻野北地区道路改良工事
小松拡幅牛山地区他舗装工事

R7.3月 撮影

至 高島市

現在、本線盛土の施工を進めており、その後、舗装工事を行います。

琵琶湖

至 京都市

TOPICS 2 小松拡幅荻野北地区道路改良工事、小松拡幅牛山地区改良工事、小松拡幅牛山地区他舗装工事

R7.3月 撮影

至 京都市

現在、本線盛土の施工を進めており、その後、舗装工事を行います。

至 高島市

TOPICS 3 小松拡幅北小松高架橋(P22～A2)PC上部工事
小松拡幅荻野地区他舗装工事

R7.3月 撮影

至 京都市

至 高島市

上部工事
P8～P12橋脚間の上部工については完了しており、P22～A2橋脚間の上部工を施工しています。

TOPICS 4 小松拡幅滝川地区他舗装工事
小松拡幅北小松高架橋(P22～A2)PC上部工事

R7.3月 撮影

至 高島市

至 京都市

上部工事
P22～A2橋脚間の上部工を施工しています。

改良工事
1月31日に道路の切替えをしました。今後、本線の盛土作業を行います。

