

第21回
紀の川流域委員会
平成23年10月27日

資料-4

大滝ダム建設事業について

平成23年10月27日



近畿地方整備局

大滝ダム建設事業

事業の進捗状況

- 大滝ダムは昭和40年4月に建設事業に着手し、本体コンクリート打設は平成14年8月に完了しています。

■大滝ダムの現状

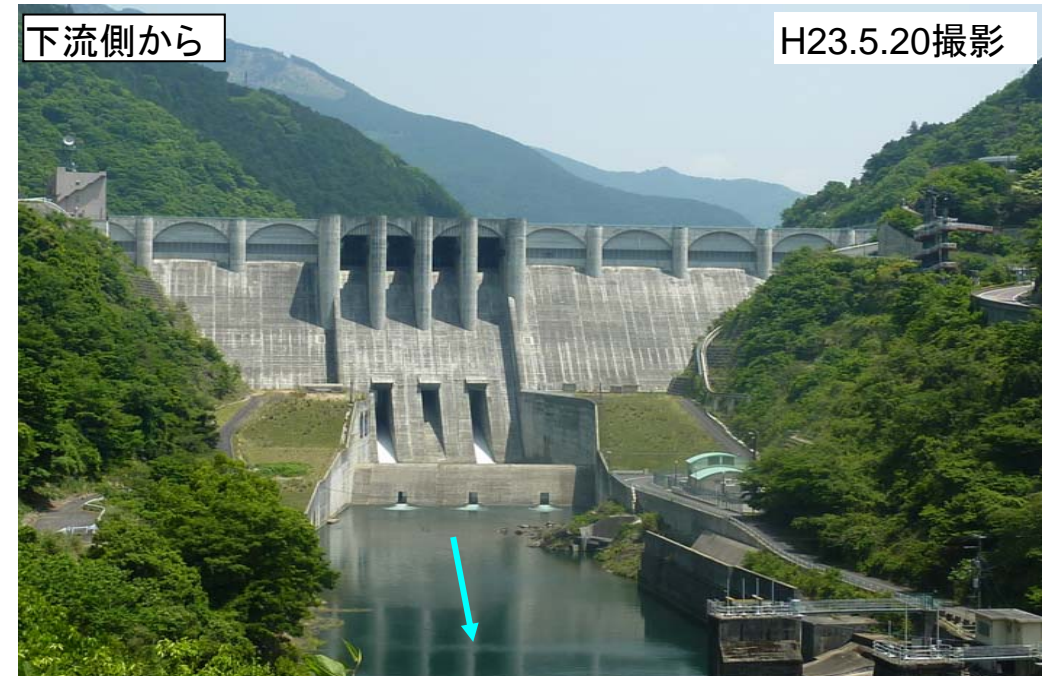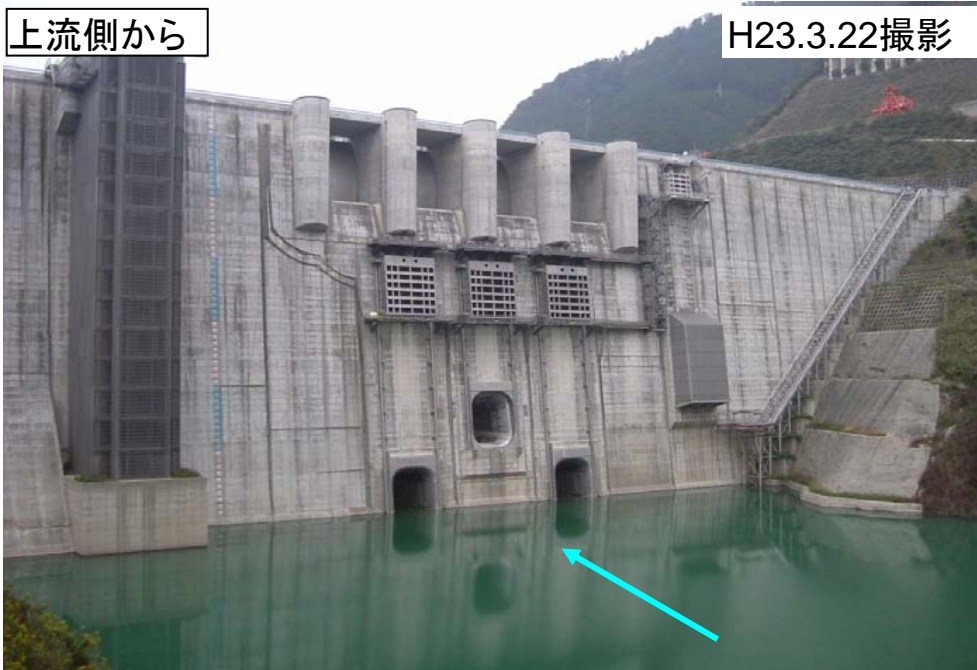

大滝ダム建設事業


事業の進捗状況

迫地区地すべり対策工事
(平成20年8月契約_平成23年3月完成)

全体写真(対策工前) (H19.10撮影)



全体写真(対策工完了後) (H23.3.15撮影)

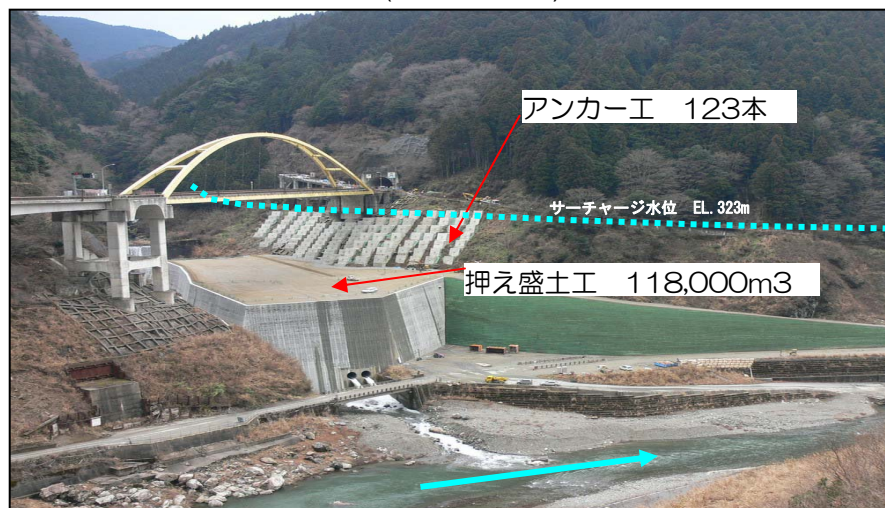

大滝地区地すべり対策工事
(平成20年9月契約_平成23年11月完成予定)

水中コンクリート工、鋼管杭工を完了させ、現在押え盛土工を
H23.11 完了に向け施工中である。

全体写真(対策工前) (H20.9撮影)



全体写真(対策工実施中) (H23.7.26撮影)



大滝ダム建設事業

事業の進捗状況

- 大滝ダム建設事業は、平成23年に大滝ダム地すべり対策工事を完成させ、すみやかに試験湛水を実施します。

工事名	平成14年度				平成15年度				平成16年度				平成17年度				平成18年度				平成19年度				平成20年度				平成21年度				平成22年度				平成23年度				平成24年度							
	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1				
	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3
本体工事	■																																															
白屋地区地すべり対策工事													■				■				■				■				■				■				■											
													▲				▲				▲				▲				▲				▲				▲											
平成17年4月契約▲																																																
平成21年2月完成▲																																																
迫地区地すべり対策工事																																																
平成20年8月契約▲																																																
平成23年3月完成▲																																																
大滝地区地すべり対策工事																																																
平成20年9月契約▲																																																
試験湛水																																																
試験湛水開始																																																
試験湛水中断																																																
試験湛水予定																																																
事業完了予定																																																
