



保田遊水地工事ニュース

HPでも閲覧
できます

大和川保田遊水地掘削築堤他工事【(株)中和コンストラクション】

工事概要

○A地区 平張コンクリート（6600m²）コンクリート打設を行います。

現況写真（R7.2.19撮影）



工事進捗状況


○A地区 平張コンクリート（3000m²）完了しました。

平張コンクリート工事手順

地盤整地



型枠・鉄筋設置

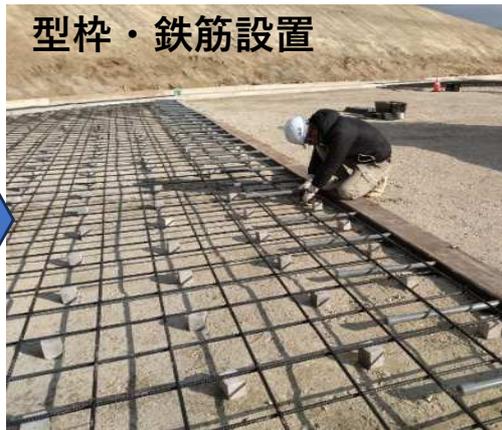

コンクリート打設



表面仕上げ



養生



大和川保田遊水地越流堤他工事【(株)吉田組】



現在の作業状況




- 平張コンクリートの打設は、66.2%の進捗です。
- 大和川側の越流堤本体施工の打設が完了しました。
- 掘削作業は、97.7%の進捗です。 (数値は2月14日時点)

施工状況



コンクリート仕上げ状況

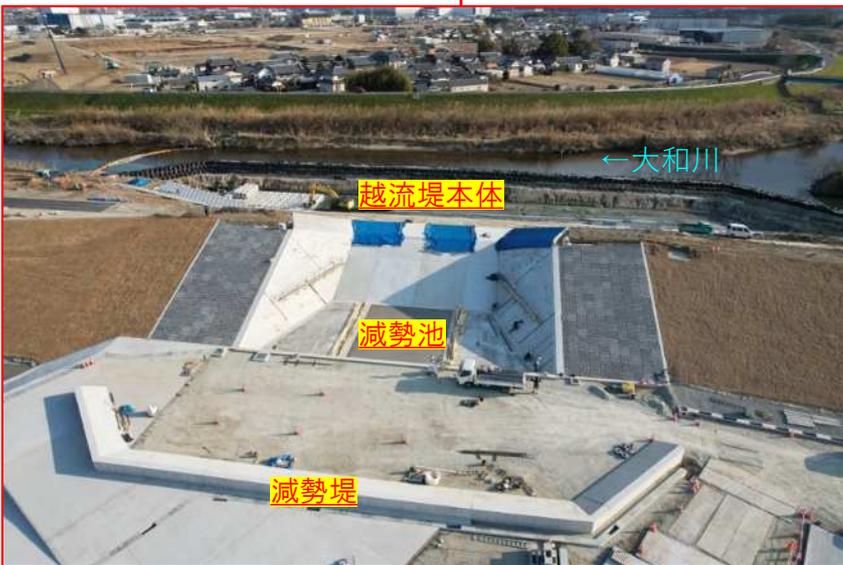

連節ブロック据付状況



根固めブロック据付状況

寒中コンクリート養生を行っています。

冬場は気温が低いためコンクリートが硬くなるまでに時間がかかります。
硬くなる前にコンクリート中の水分が凍るとコンクリートの強度が落ちます。
冬場のコンクリートはシートなどで覆って5℃以下にならないように管理する必要があります。



養生剤散布状況(表面のコーティング)



シートを使用した保温養生状況

大和川保田遊水地水路整備他工事【(株)森下組】

工事概要

- 遊水地内の水路を整備する工事です。
- A地区**に**地下水対策工**（自由勾配側溝、砕石敷設）を行います。
- 内水樋門**から**A地区**までの**導水路工**を整備し、接続します。
- C地区**の表面に**平張コンクリート**（約9,000m³）、底面に**防災調整池**を設置します。



工事の進捗状況

- A地区**
 - ・**地下水対策工**(自由勾配側溝、砕石敷設) は完了しました。
 - ・**防災調整池**のコンクリートもほぼ完成しました。平時は川西町がオーバルトラックとして利用するため、柵の設置を行う等、引き続き連携して整備を行っていきます。
 - ・**平張コンクリート**は砕石敷設、コンクリート打設を行っています。
 - ・**導水路工**が完了し、保田川が繋がりました。

C地区（導水路工）の状況



C地区（防災調整池）の状況



令和7年2月19日撮影



【問い合わせ先】

(注意) 記載内容は、今後変更することがあります。

●事業計画に関すること 大和川河川事務所 工務課
〒582-0009 大阪府柏原市大正2丁目10番8号
TEL / 072-971-1381 (代)

●工事・現場に関すること 大和川河川事務所 王寺出張所
〒636-0002 奈良県北葛城郡王寺町王寺1-13-8
TEL / 0745-73-6571
