



○窪田遊水地の工事進捗を視覚的に把握いただくため、第36号よりドローンによる空撮写真を掲載しています！

全景（大和川側）



全景（岡崎川側）



R7大和川窪田遊水地掘削他工事【株式会社 城内組】



工事概要

○水路工・水道管移設工

水路工、水道管移設工事を行うにあたり、町道43号53号を通行止めとさせていただきます（朱書き部）


通行止め区間内にある田畑へ行かれる方は図中の交通誘導員①か②にお伝えください。軽トラック、農耕トラクター等は通行できるよう拝領いたします。

【通行止め期間】 令和8年7月13日 10時から
令和8年12月25日（予定）まで

※水路工の施工は令和8年9月末頃までを予定。
水道管移設工は令和8年10月頃から11月末までを予定。

近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますがご理解とご協力をお願いします。

R7大和川窪田遊水地土質改良他工事【(株)山上組】

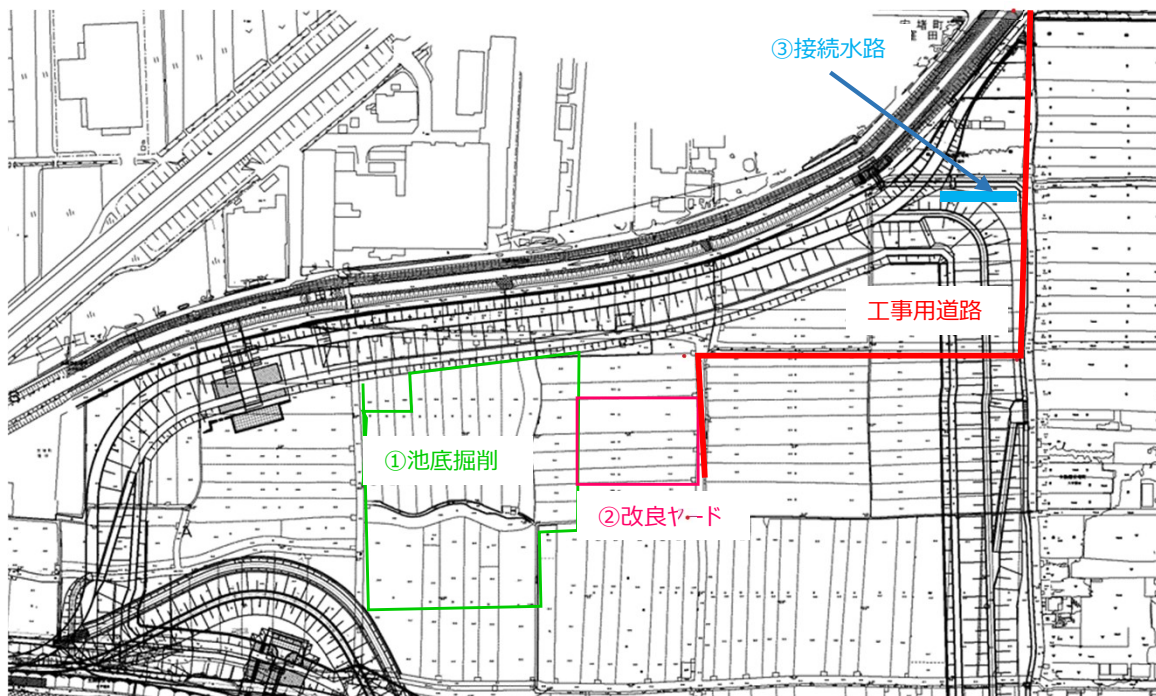

工事概要

①掘削 (ICT) 18,200m³ ②土質改良57,000m³ ③付替水路工 L=45.2m

7月工事内容

②土質改良工を改良ヤードで施工中です。
1日当たり300m³～400m³の改良土を作成
しています。7カ月程度期間を予定しています。

③接続水路工は7月21日～8月末予定です。一部町道の路肩部分を規制させて
いただきます。ご通行にご迷惑おかけしますが、ご協力お願いします。

土質改良施工状況



環境対策（防塵フェンス設置状況）



7月の作業

- : 表土剥ぎ
- : 土質改良工
- : 工事用車両ルート

工事概要

- ★掘削・盛土工事の準備として地面の表面を剥ぎ取ります。
- ★土質改良工事の準備を行います。



表土剥ぎイメージ写真



土質改良ヤード整備

前月と比べて工事用車両の交通量が多くなります。
御迷惑をお掛け致しますがご協力をお願い致します。



進捗について



①樋門上屋→鉄骨建方完了



鉄骨建方

排水樋門の鉄骨建方が完了しました。
外側からだと飛散防止のシートを貼っているため分かりにくいですが、内側からでも雰囲気伝われば幸いです。

鉄骨造は部材を工場で加工し、
現場に搬入し組み立てるので、
鉄筋コンクリート造の建物より
も現場での施工は早くなります。

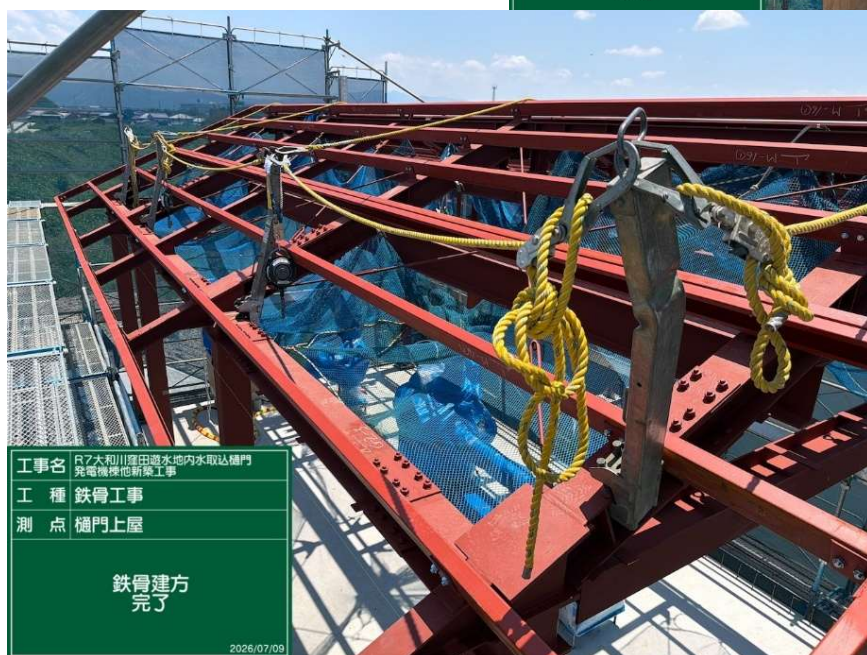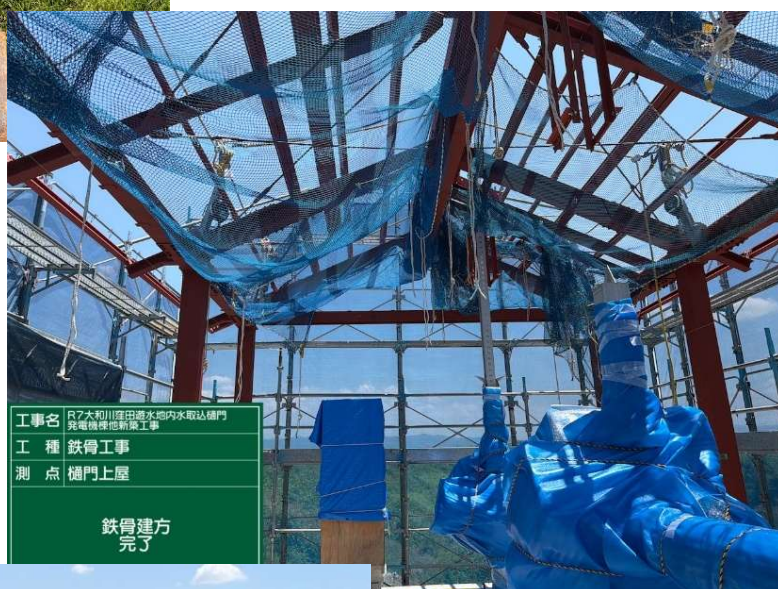

これからこの鉄骨に屋根や壁を取り付けていき、建物が完成します。

窪田遊水地東側ポンプ設備他新設工事【(株)ミゾタ】

7月の工事概要

6月下旬にポンプ設備の据付けが完了しました。

7月よりポンプを操作するための操作盤の設置と動力の供給・ポンプの制御を行う為の電気配線の工事を行う予定です。

ポンプ据付状況（6月末現在）



工事名	窪田遊水地東側ポンプ設備他新設工事
工程	台風後 現場点検
施工者	株式会社ミゾタ



工事名	窪田遊水地東側ポンプ設備他新設工事
工程	台風後 現場点検
施工者	株式会社ミゾタ

【問い合わせ先】

- 事業計画に関すること 大和川河川事務所 管理課
〒582-0009 大阪府柏原市大正2丁目10番8号 TEL / 072-971-1381（代表）
- 工事・現場に関すること 大和川河川事務所 王寺出張所
〒636-0002 奈良県北葛城郡王寺町王寺1-13-8 TEL / 0745-73-6571
