


大津信楽線付替工事ニュース

令和3年10月15日



バックナンバーは
QRコードを読み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新7号橋・新8号橋間道路改良その他工事
工 期：令和2年11月7日～令和4年2月1日

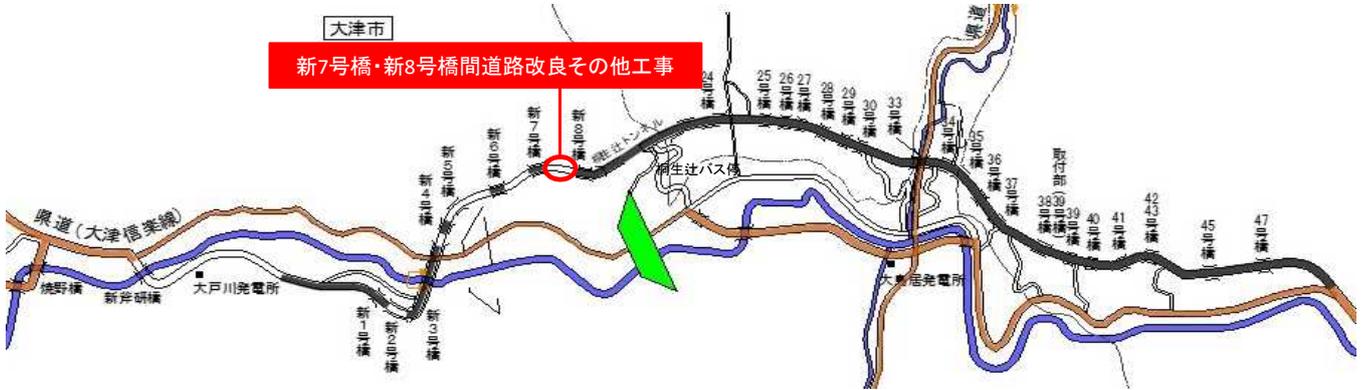

【現在の作業】220tクレーンにて11号補強土壁施工箇所の伐採を行っています。

【今後の予定】16号切土補強土(法面補強工事)と11号補強土壁(擁壁)の基礎工事の着手準備をしていきます。

工事現場の施工状況

監理技術者のコメント

220tクレーンによる伐採作業状況



当初計画は、伐採に合わせて11号補強土壁を順次施工する事としていましたが、大型クレーン(220tクレーン)を使用して一度に広範囲の伐採を行う事で工期短縮が望めることから、計画変更を行い大型クレーンによる伐採を行いました。

急峻な地形ですが、今後も安全第一で早期完成を目指して頑張ります。



監理技術者 米田 剛

OhYAMA (株) 大山建設

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上桐生町地先
077-549-1700
077-549-1705

大津信楽線付替工事ニュース

令和3年10月15日



バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新5号橋・新7号橋間道路改良工事
工期：令和3年1月8日～令和4年2月28日

10月



現在の施工位置

施工写真①



背面・路体盛土転圧状況

施工写真②



転石破碎状況

現場代理人コメント

台風シーズンもあと少しとなって参りました。当現場では飛散養生を徹底し、強風に飛ばされることの無いよう注意して作業を行っております。今後の施工としまして、切土補強土工は引き続き掘削を行い工事用車両により転石・土砂の搬出を行い、補強土壁工ではパネルの設置、盛土等を行います。ご理解・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

現場代理人
佐野 邦生



大津信楽線付替工事ニュース


令和3年10月15日



バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新3号橋・新8号橋間道路改良工事
工期：令和3年6月17日～令和4年3月20日

10月

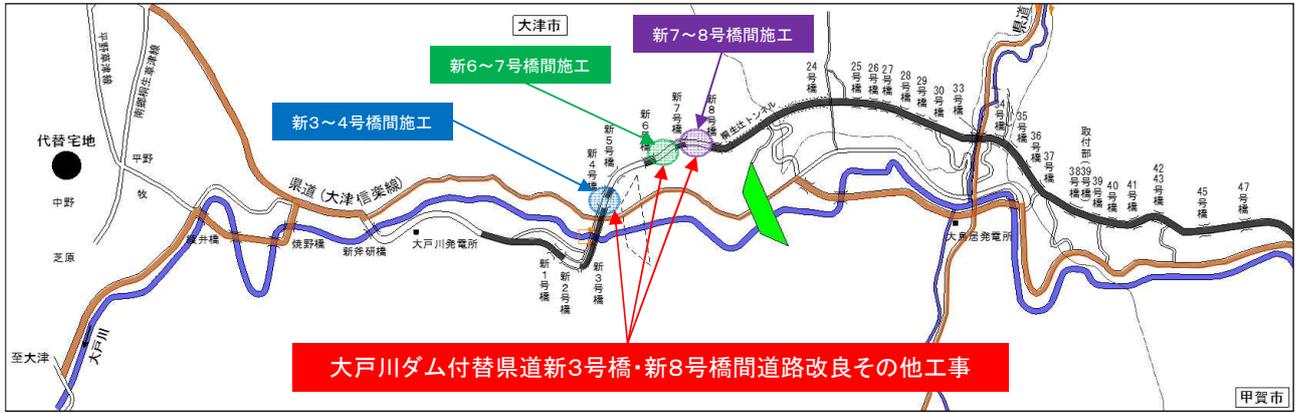

工事現場全景(新3号橋から新8号橋に向けて)



工事現場全景(新8号橋から新3号橋に向けて)



新3～4号橋間施工箇所



新6～7号橋間施工箇所



新7～8号橋間施工箇所(未着手)



現場代理人：寺内 敬嗣

新3～4号橋間では法面に鉄筋挿入を行い、切土補強工を施工しております。
新6～7号橋間では山の掘削と転石を撤去し、圧縮補強土工の施工準備を進めています。
安全第一で工事を進めます。また、工程の短縮を図り早期完成を目指します。ご理解ご協力の程、
宜しくお願いいたします。



株式会社 アクト

現場事務所
電話

大津市上田上桐生町地先
077-549-0010



大津信楽線付替工事ニュース

令和3年10月15日



パクナバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道大津信楽線新2号橋上部工事
工期：令和3年4月1日～令和4年3月10日

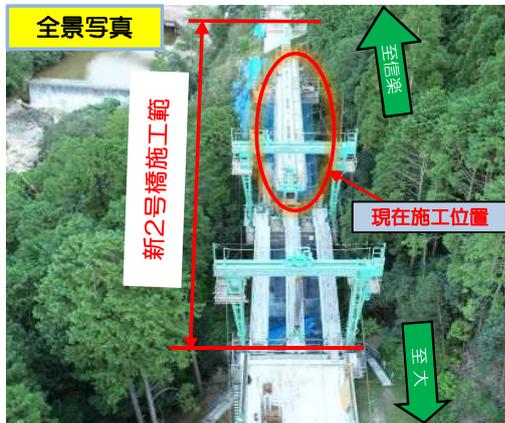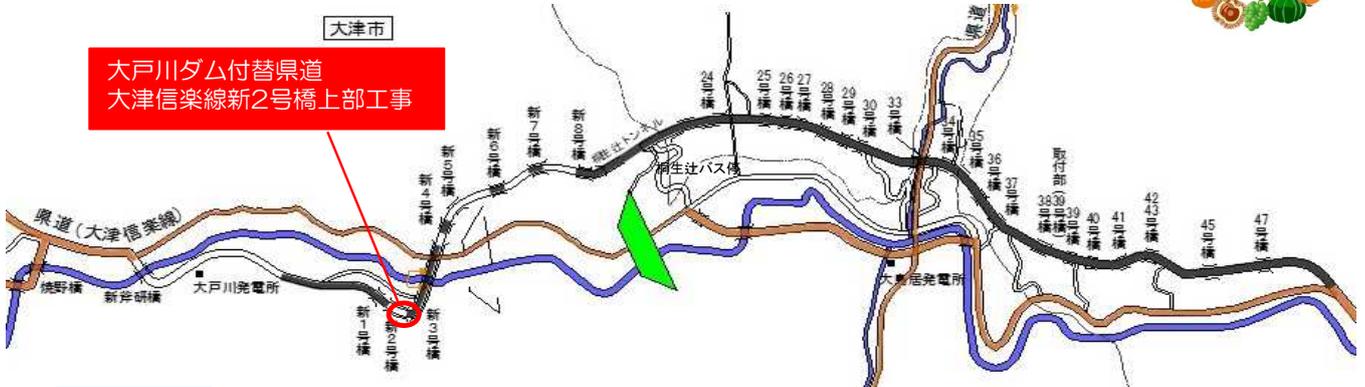

【現在の作業】 PC桁架設後、PC板の敷設を行い、架設桁を次径間(P1-P1)へ移動しています。
【今後の予定】 10月中旬に、次径間(P1-P2)のPC桁架設後、最終径間(P2-A2P)への架設桁移動を行っていきます。

工事現場の施工状況

施工状況（10月初旬）PC板敷設

PC桁架設後、桁間にPC板を敷設しております。



施工状況（10月初旬）架設桁移動

次径間(P1-P2)施工のため、架設桁を前方へ移動させて



監理技術者のコメント

9月末より、上部工施工作業を開始し、1径間分のPC桁の架設が完了しました。今後も、残り2径間のPC桁架設に向けて架設桁を順次移動しながら、施工を進めていきます。架設桁およびPC桁の移動など、施工位置まで移動する作業は、危険が伴う作業が多くなりますので、今後も安全第一に施工を進めていきます。今後ともご理解・ご協力の程宜しくお願い申し上げます。



監理技術者 稲葉 諒



大津信楽線付替工事ニュース


令和3年10月15日



バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道大津信楽線新5号橋上部工事
工期：令和3年3月31日～令和4年3月10日

10月

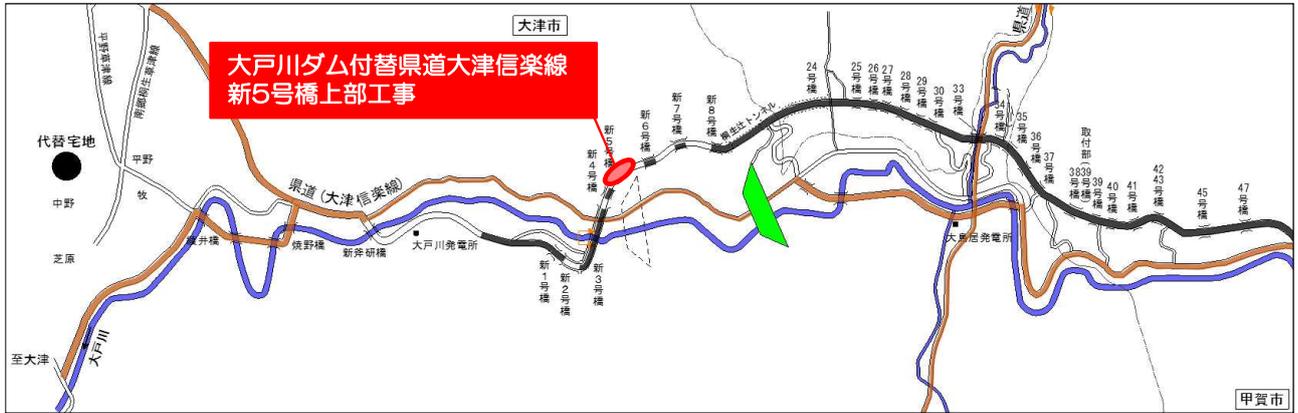

【現在の作業】 上部工架設準備として、「バント設備」の組立てや「支承」の据付等を行っています。

現在の施工状況



バント基礎完了



支承据付

9月より施工を開始致しました！名村造船所と申します。現在、施工の方はバント基礎が完了しまして、10月下旬からの上部工架設に向けての準備作業を行っております。架設期間中は大型車両が頻繁に出入りすることとなりますので車両の運行には注意し、現場は安全作業に努めていきますので今後ともご理解、ご協力のほどよろしくお願い致します。



現場代理人
實 扇太郎



株式会社 名村造船所
NAMURA SHIPBUILDING CO.,LTD.

現場事務所 大津市上田上桐生町地先
TEL&FAX 050-5444-5662

大津信楽線付替工事ニュース


令和3年10月15日



バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道五本松交差点設置その他工事
工期：令和3年8月5日～令和4年3月10日

10月

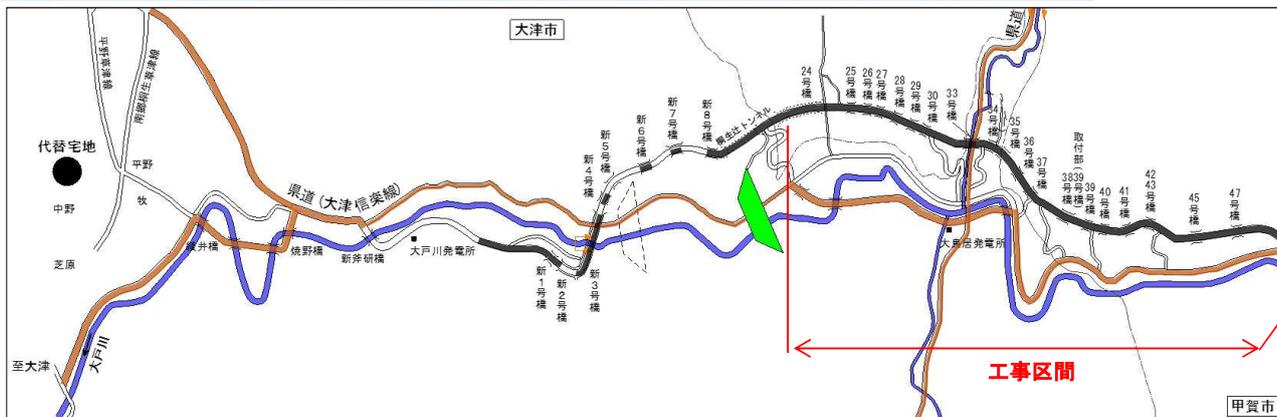

工事現場全景(45号橋から甲賀に向けて)



工事現場全景(甲賀から大津に向けて)

現場代理人：野々村 英樹

桐生辻トンネルから甲賀市信楽町黄瀬まで約4kmの区間について、県道大津信楽線の付け替えに伴う、防護柵、舗装、防草コンクリートを主に施工しております。安全第一で工事を進めます。また、工程の短縮を図り早期完成を目指します。ご理解ご協力の程、宜しくお願いいたします。



株式会社 アクト

現場事務所
電話

大津市上田上桐生町地先
077-549-0010
