



国道27号 西舞鶴道路(舞鶴市上安地区～京田地区) 工事状況(令和3年5月末時点)

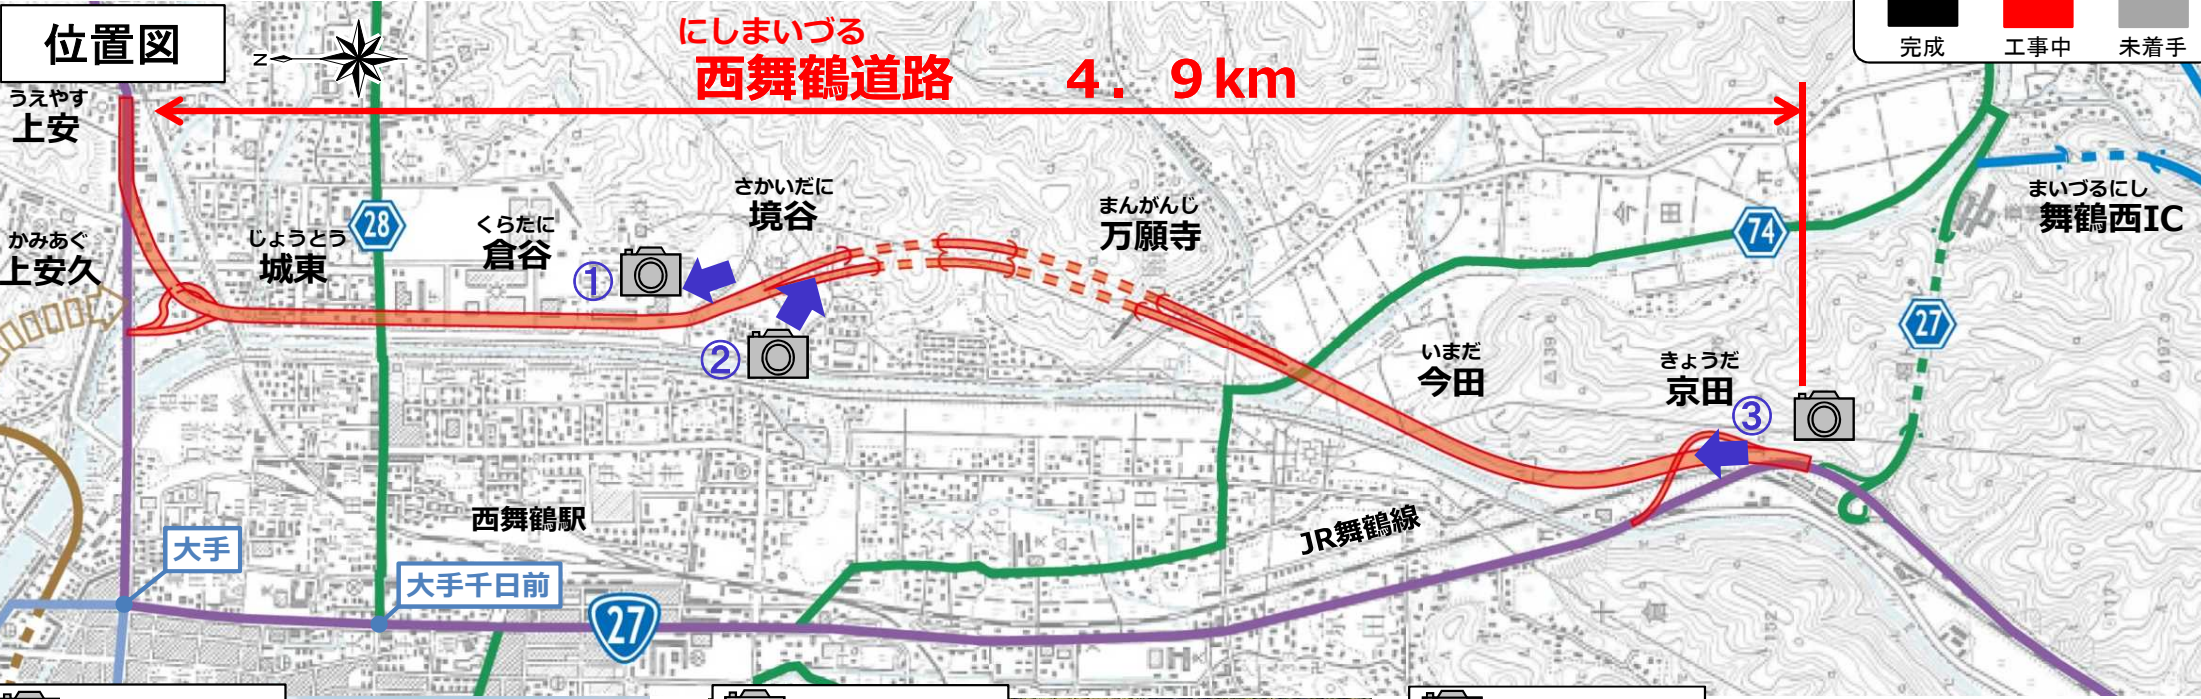

道を高くしています。





仮橋からトンネル坑口に向けて山を切り始めました。



橋台、橋脚ができあがりました。

国道27号 西舞鶴道路(舞鶴市上安地区～京田地区) 工事状況(令和3年6月末時点)

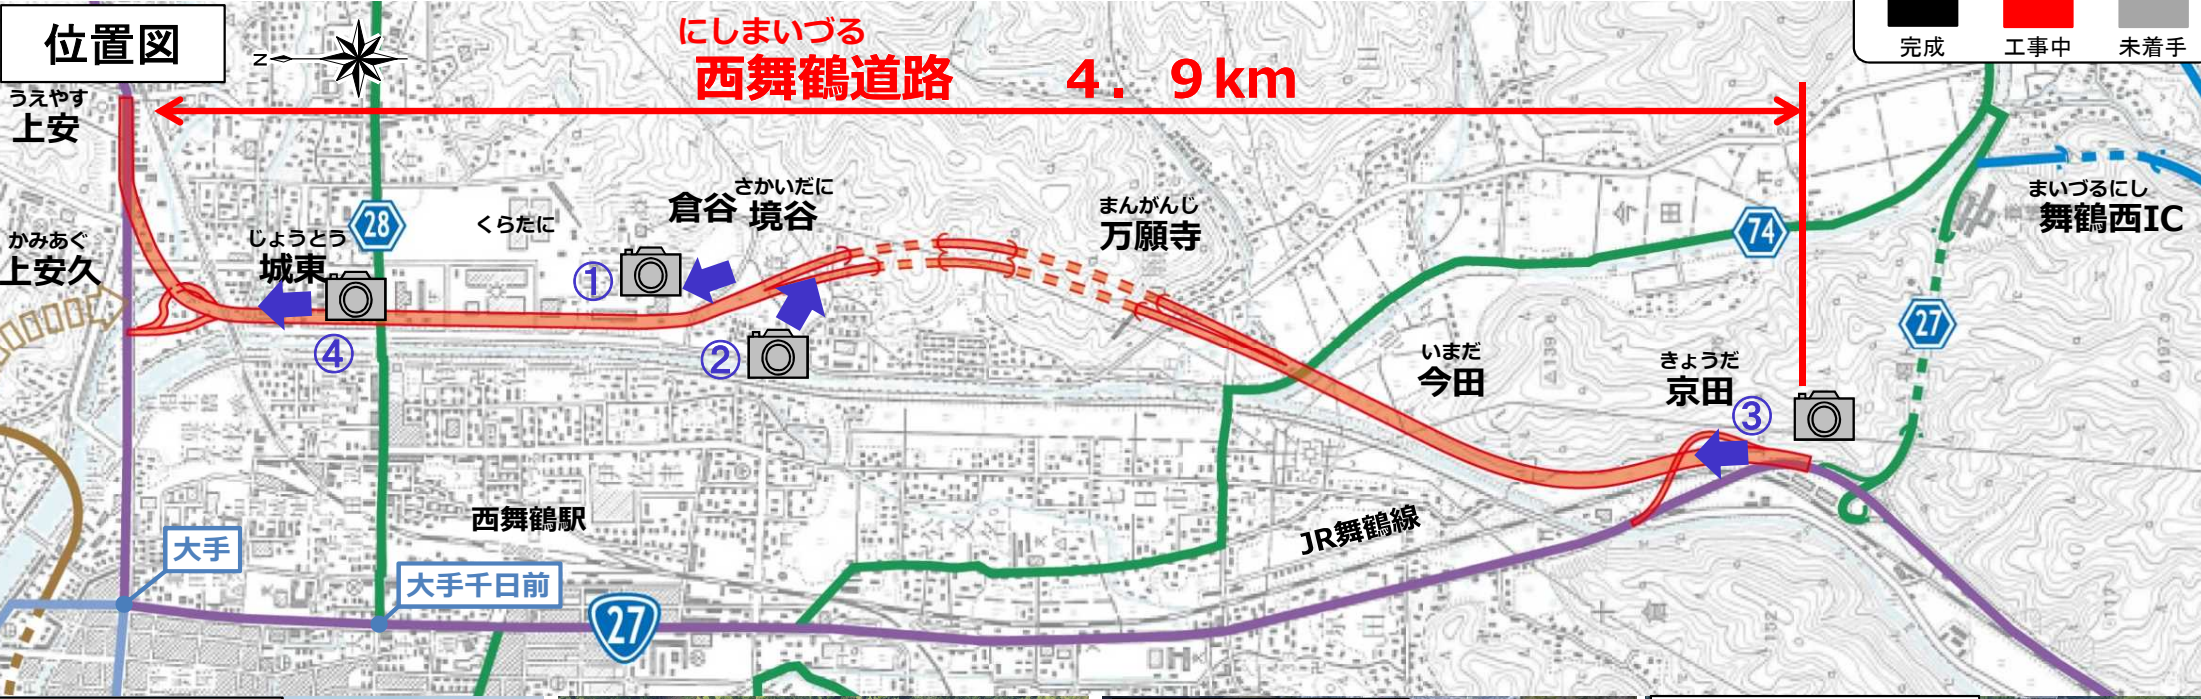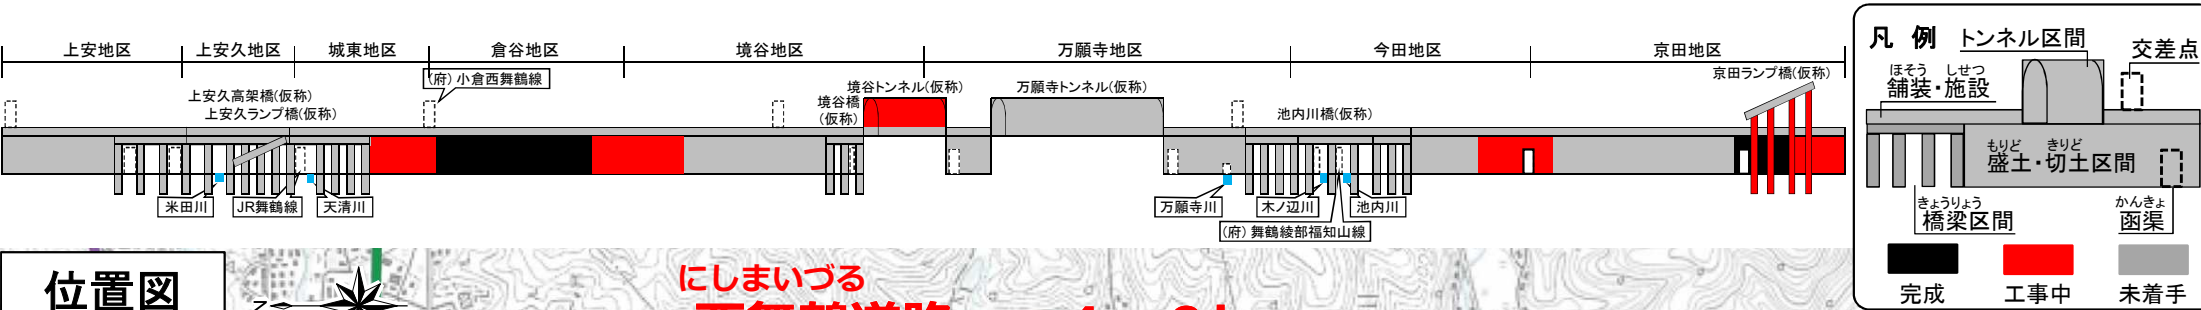

道を高めています。



仮橋からトンネル坑口に向けて山を切り始めました。





橋台、橋脚ができあがりました。



高架橋下部工事の準備工を実施

国道27号 西舞鶴道路(舞鶴市上安地区～京田地区) 工事状況(令和3年7月末時点)

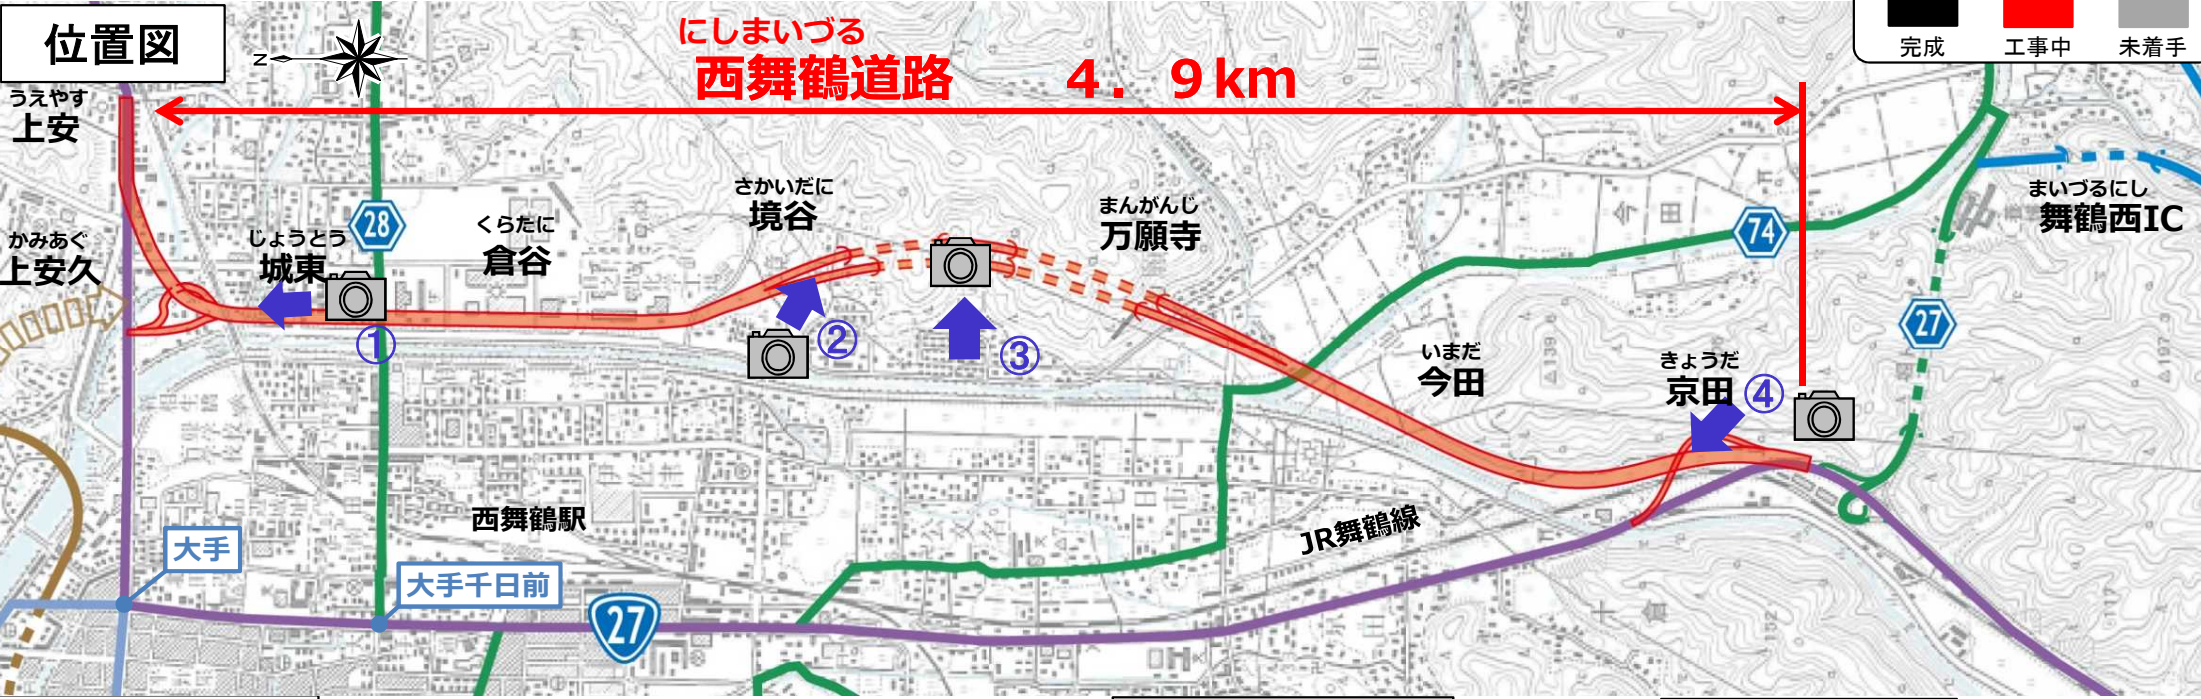

① 上安久地区

② 境谷地区

③ 万願寺地区

④ 京田地区



高架橋下部工事の準備工を実施



仮橋からトンネル坑口に向けて山を切り始めました。





埋蔵文化財の調査中です。



橋台を工事しています。

国道27号 西舞鶴道路(舞鶴市上安地区～京田地区) 工事状況(令和3年8月末時点)

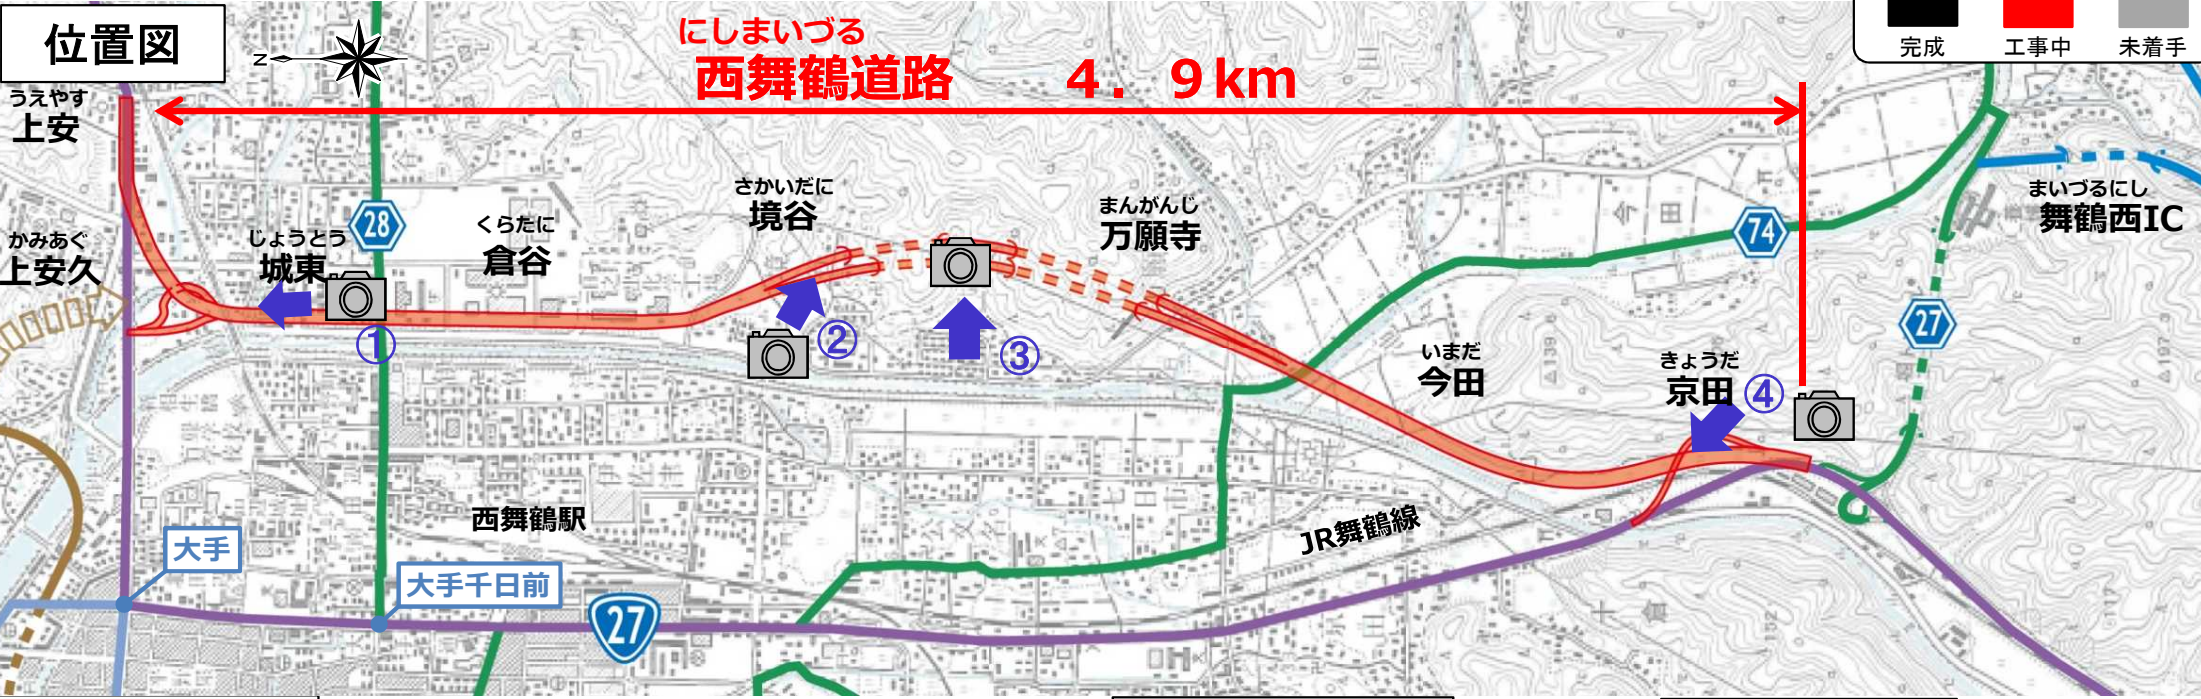

① 上安久地区

② 境谷地区

③ 万願寺地区

④ 京田地区



高架橋下部工事の準備工を実施



トンネル坑口付近が完成しました。






埋蔵文化財は、完了しました。



橋台を工事しています。

国道27号 西舞鶴道路(舞鶴市上安地区～京田地区) 工事状況(令和3年9月末時点)

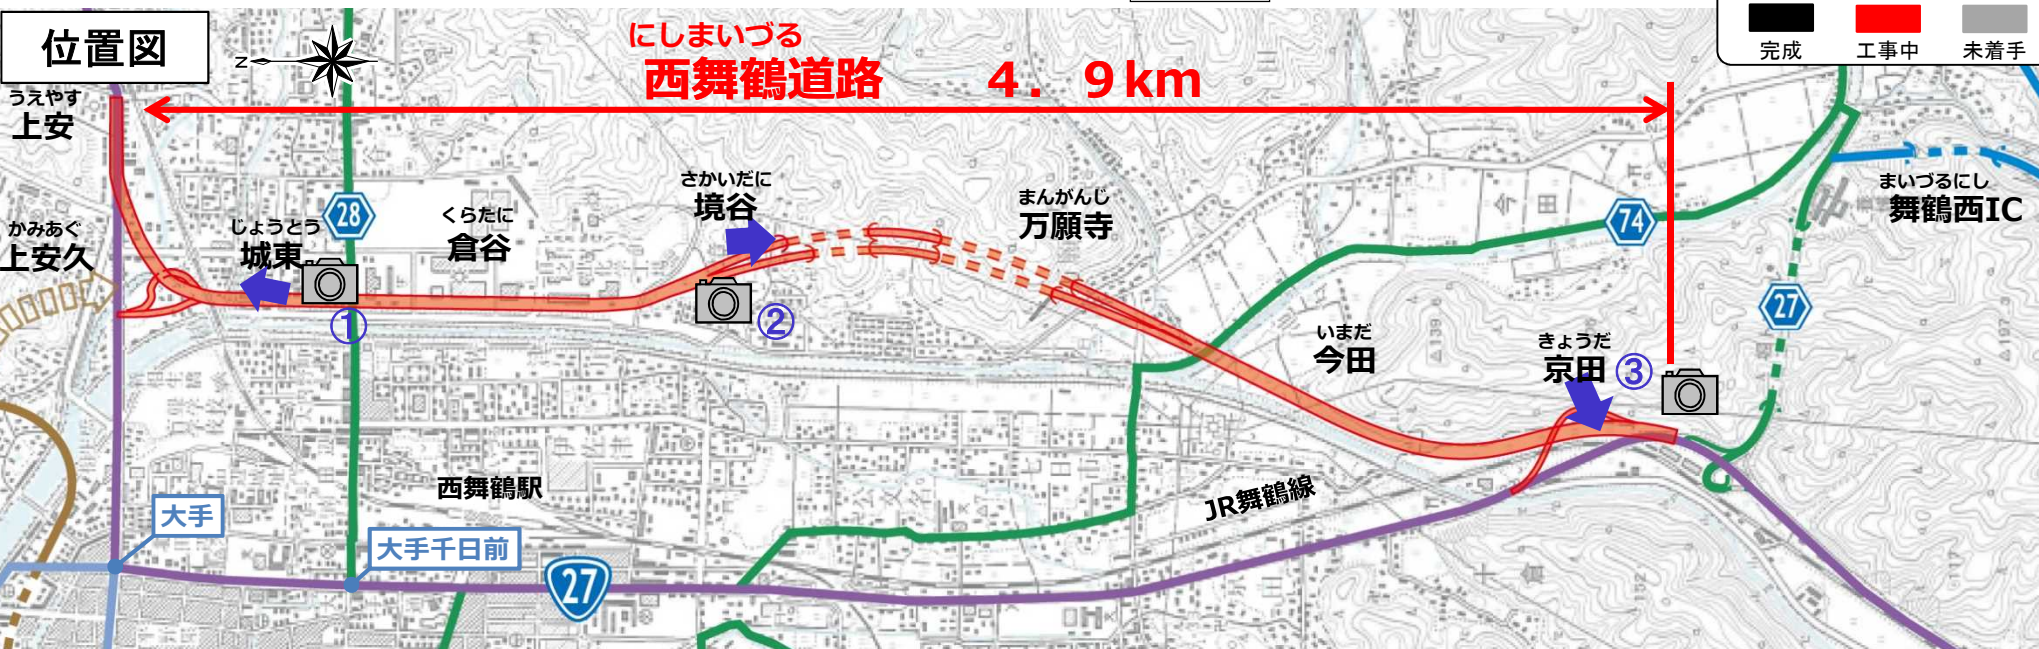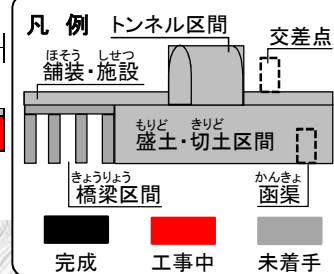



9月末掘進長: 20m/138m

高架橋下部工事のケーソン基礎工を実施

トンネル掘削工事を行っています。



橋台を工事しています。

国道27号 西舞鶴道路(舞鶴市上安地区～京田地区) 工事状況(令和3年10月末時点)

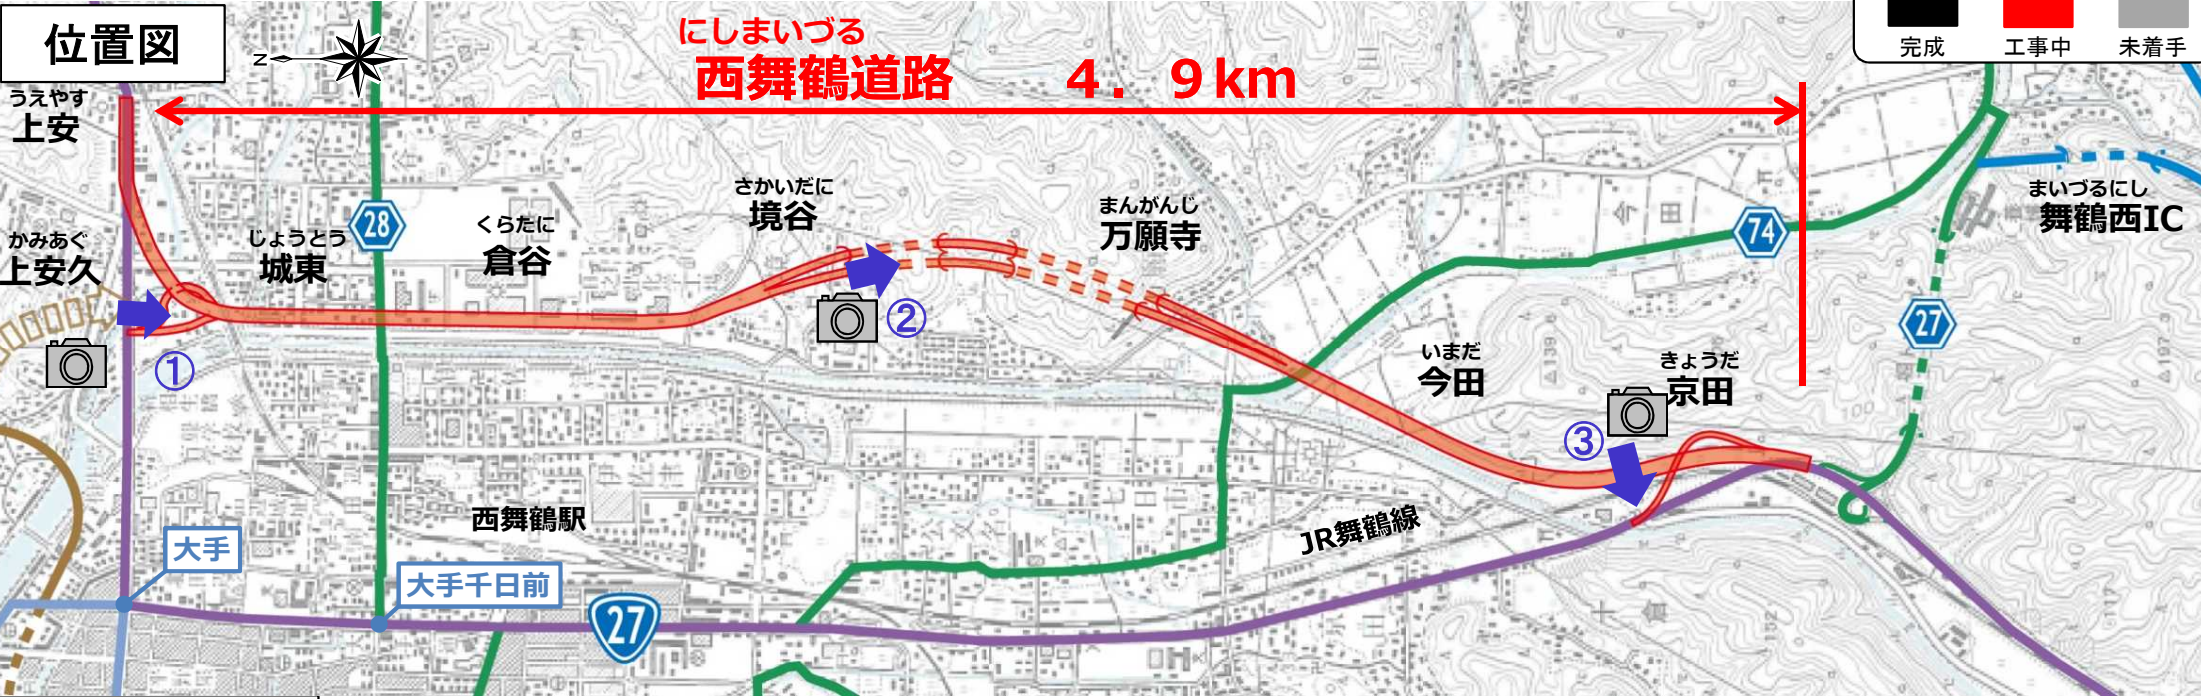

高架橋下部工事のケーソン基礎工を実施
トンネル掘削工事を行っています。
橋台を工事しています。

国道27号 西舞鶴道路(舞鶴市上安地区～京田地区) 工事状況(令和3年11月末時点)

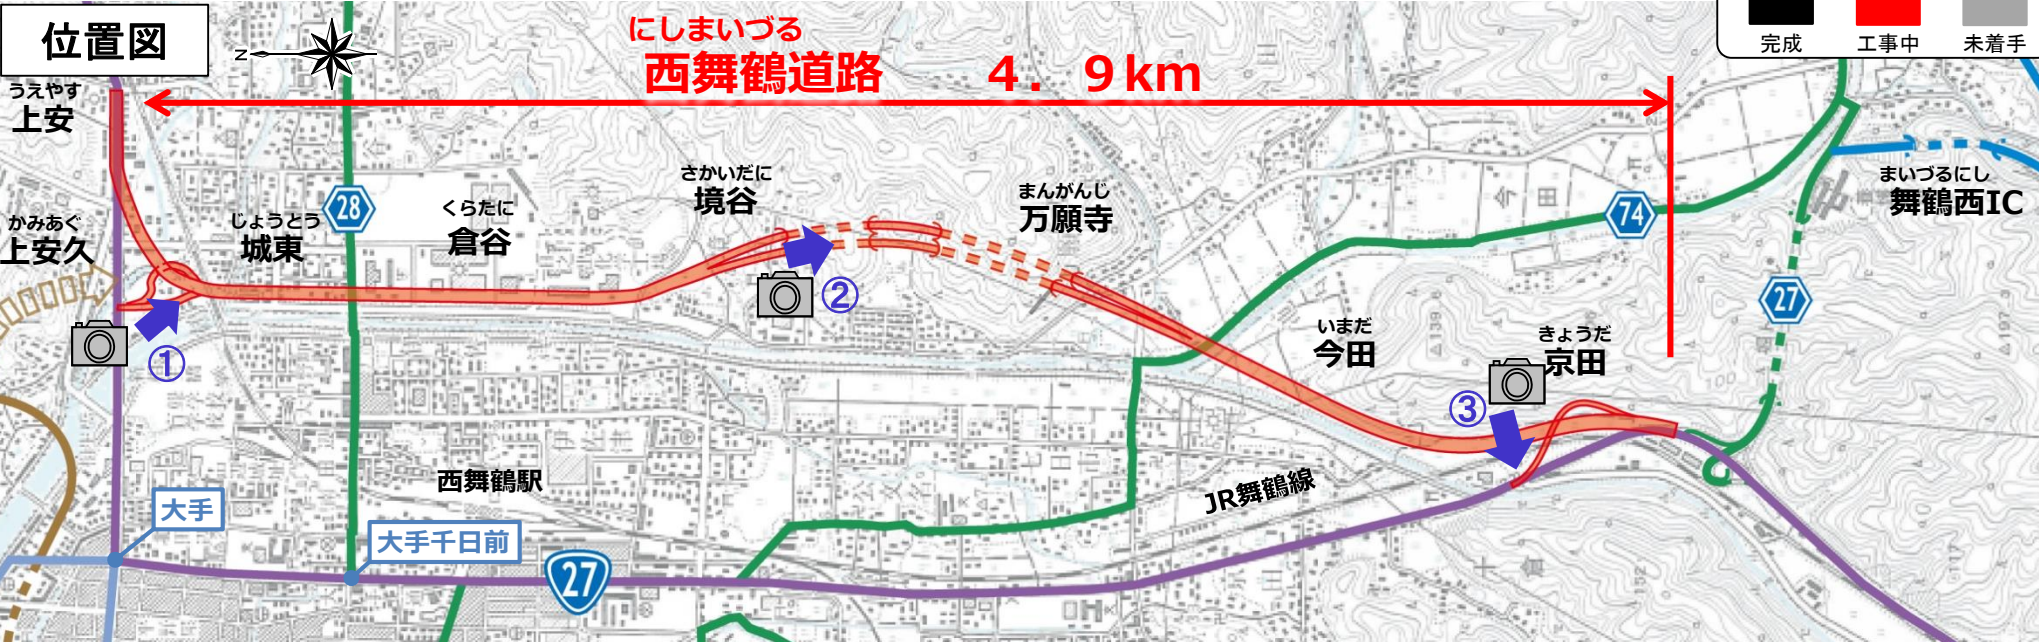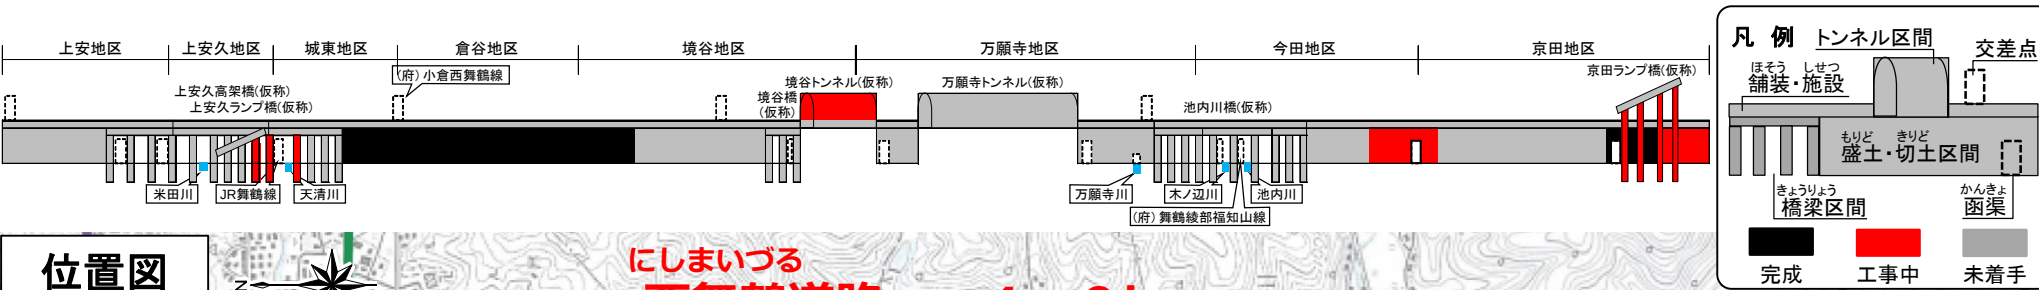

高架橋下部工事のケーソン基礎工を実施






境谷トンネルが貫通しました。



橋台を工事しています。

国道27号 西舞鶴道路(舞鶴市上安地区～京田地区) 工事状況(令和3年12月末時点)

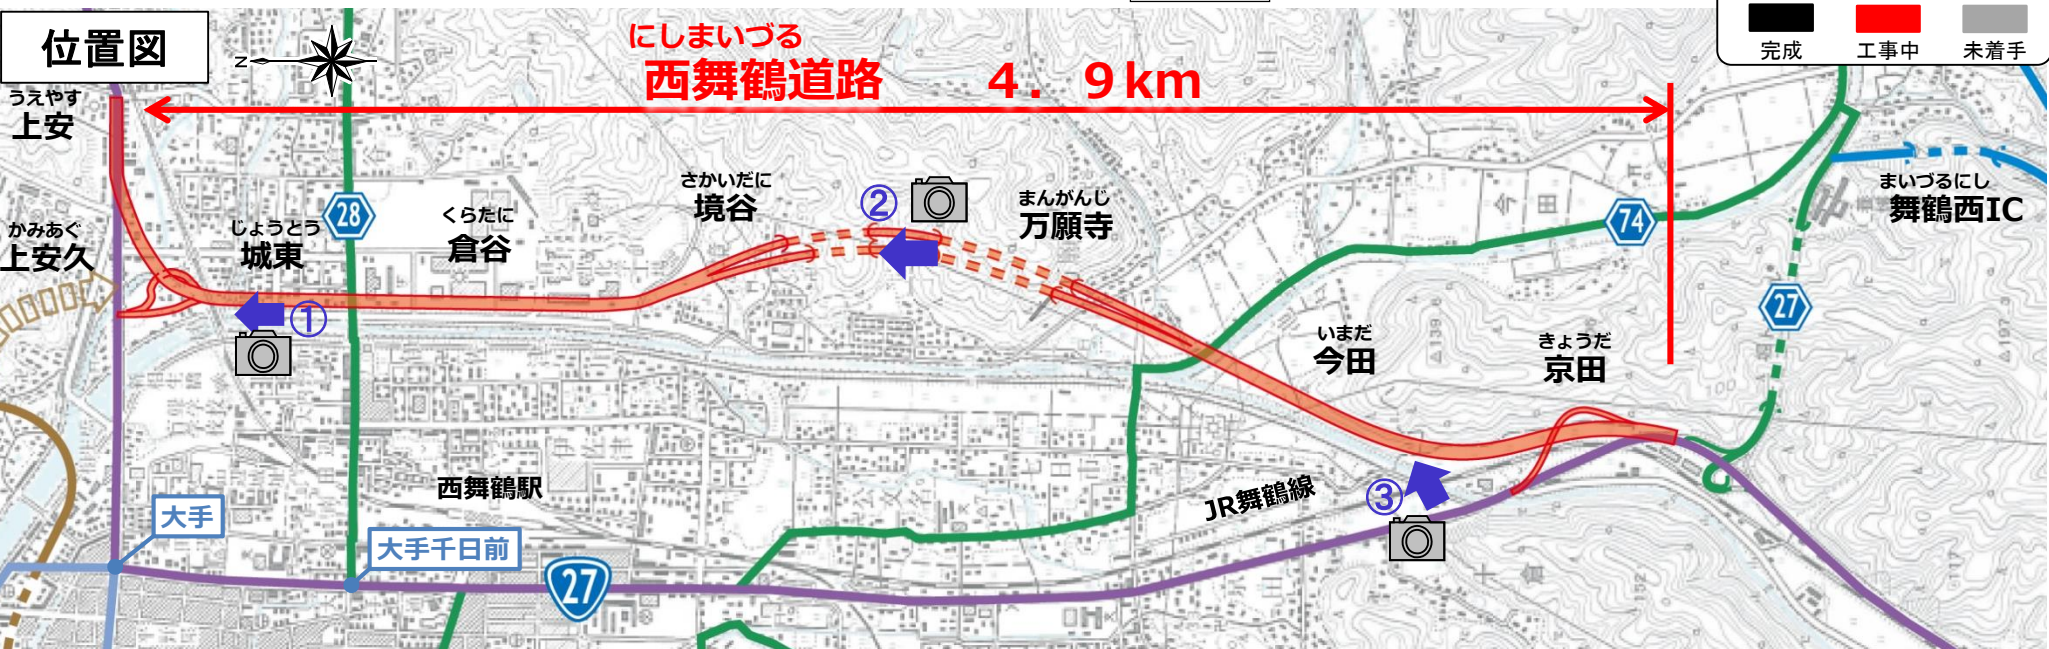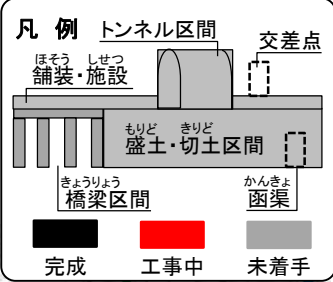

① 上安久地区




高架橋下部工事のケーソン基礎工を実施

② 境谷地区





令和3年12月2日に境谷トンネルが貫通し、現在は覆工工事を行っています。

③ 今田地区

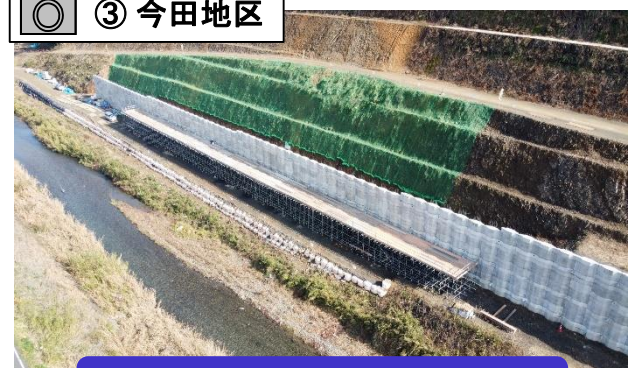

よう壁パネルの設置を進めています。

国道27号 西舞鶴道路(舞鶴市上安地区～京田地区) 工事状況(令和4年2月末時点)

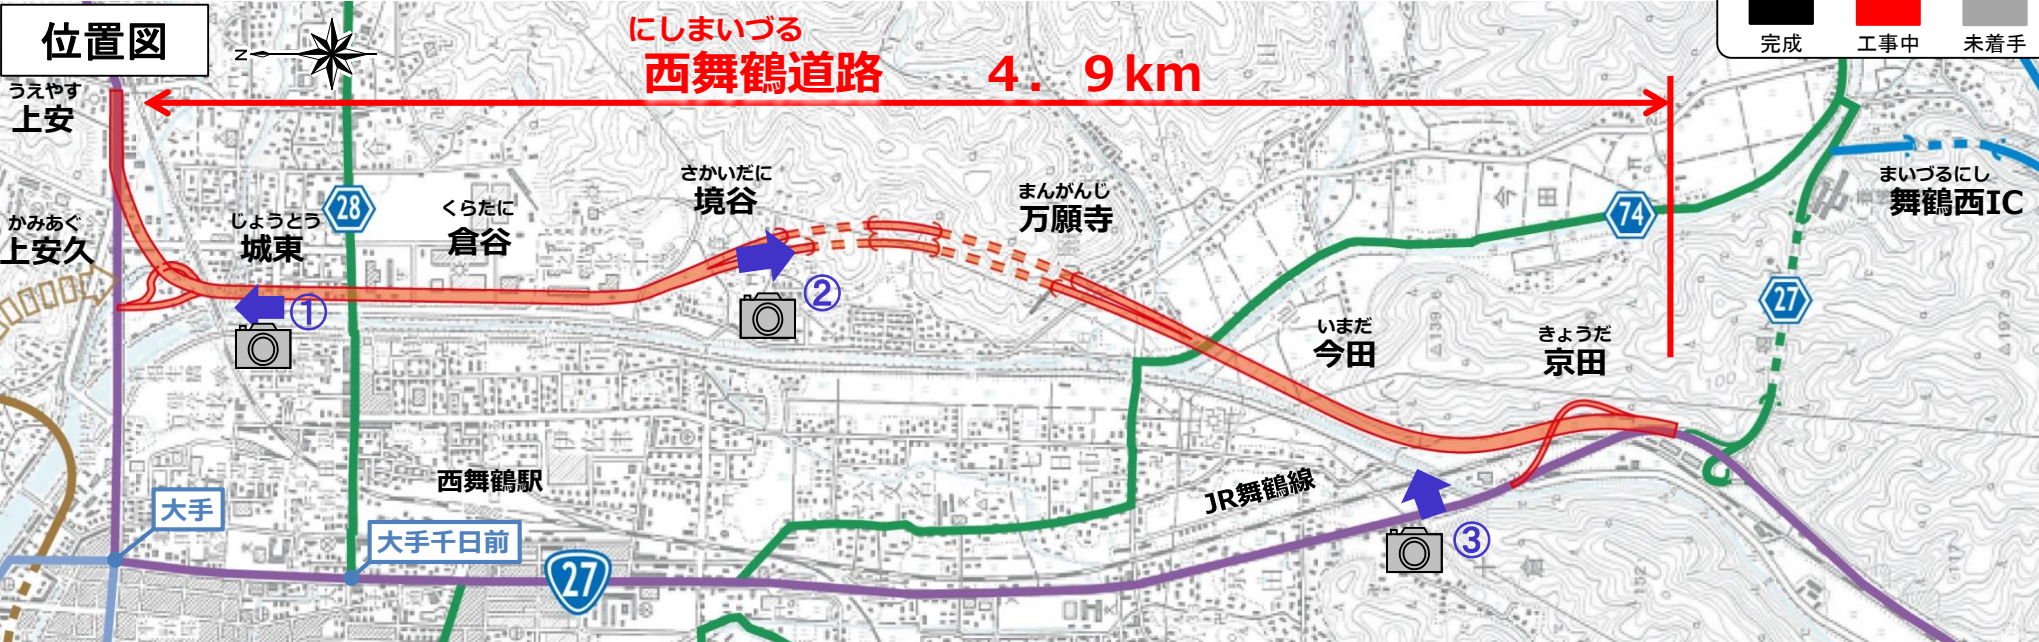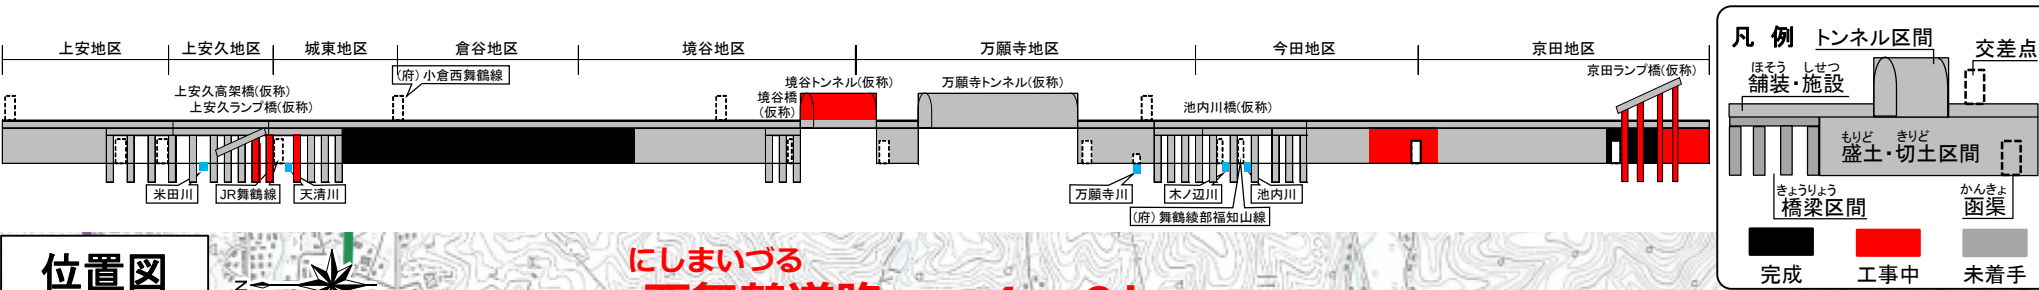


高架橋下部工事のケーソン基礎工を実施



トンネルの覆工工事を行っています。



よう壁パネルの設置を進めています。

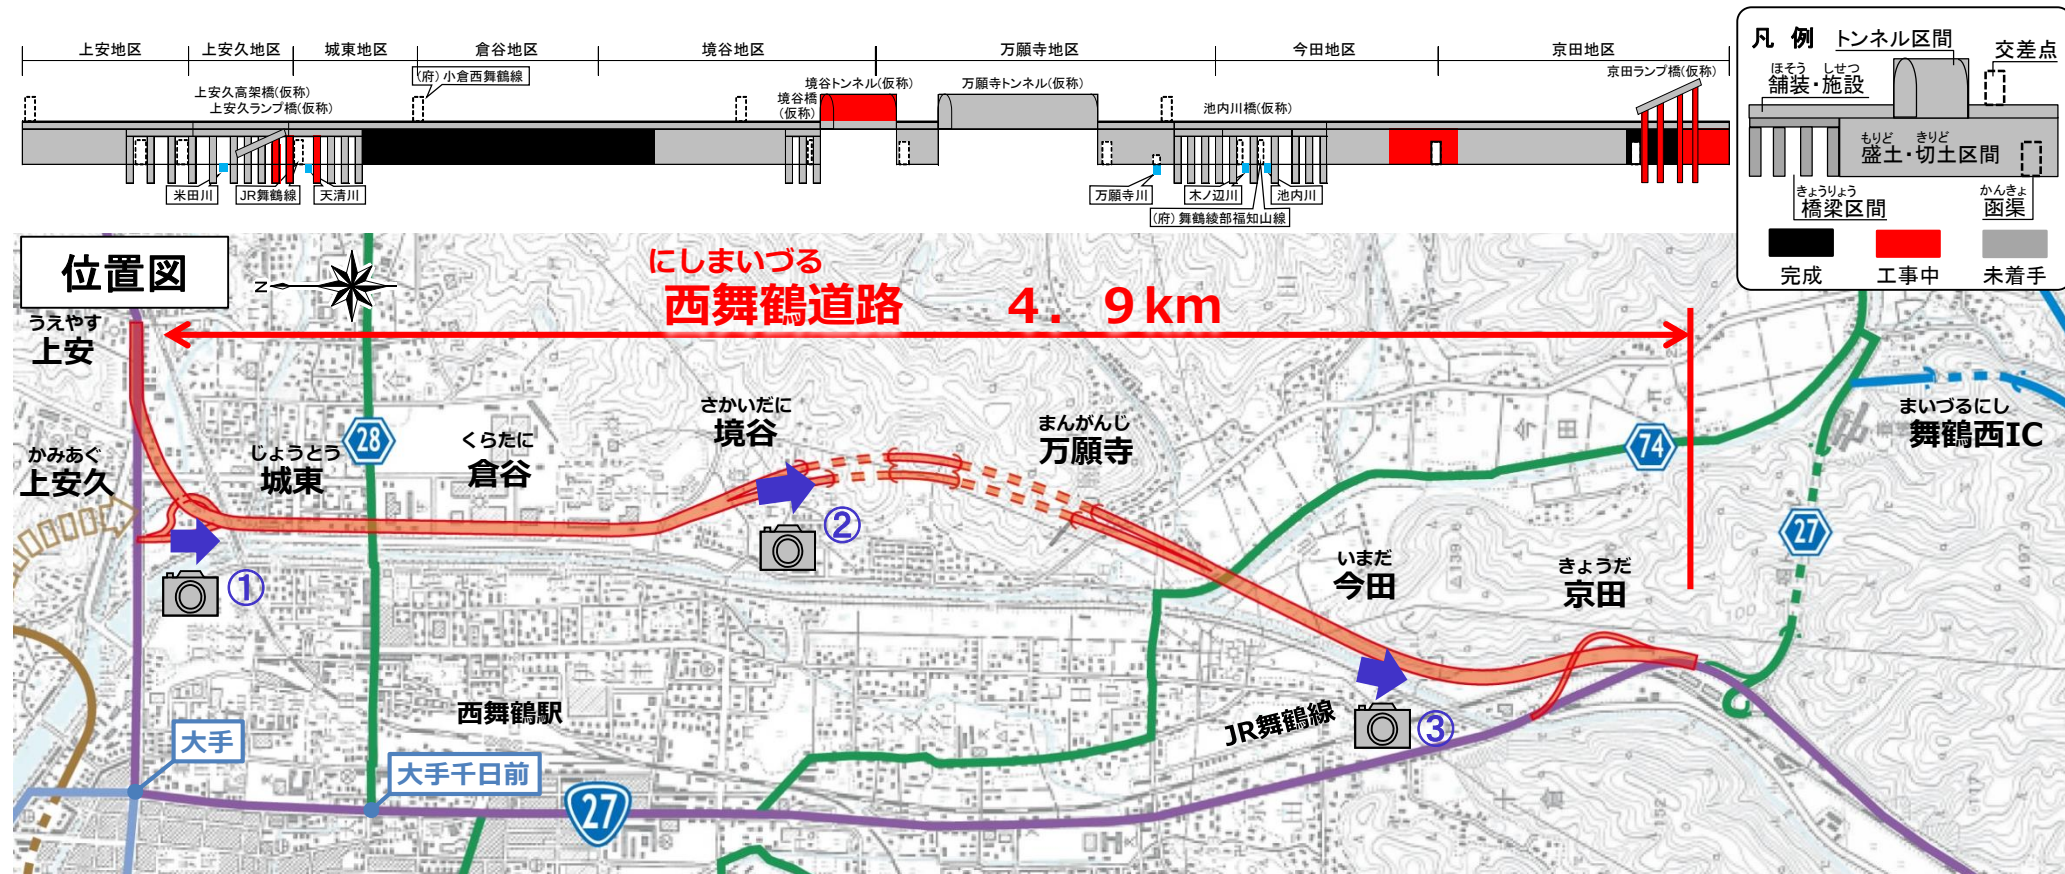

高架橋下部工事のケーソン基礎工を実施



移動式型枠を利用し、
覆工工事を行っています。



令和3年度のよう壁パネル設置工事が完了しました。
