


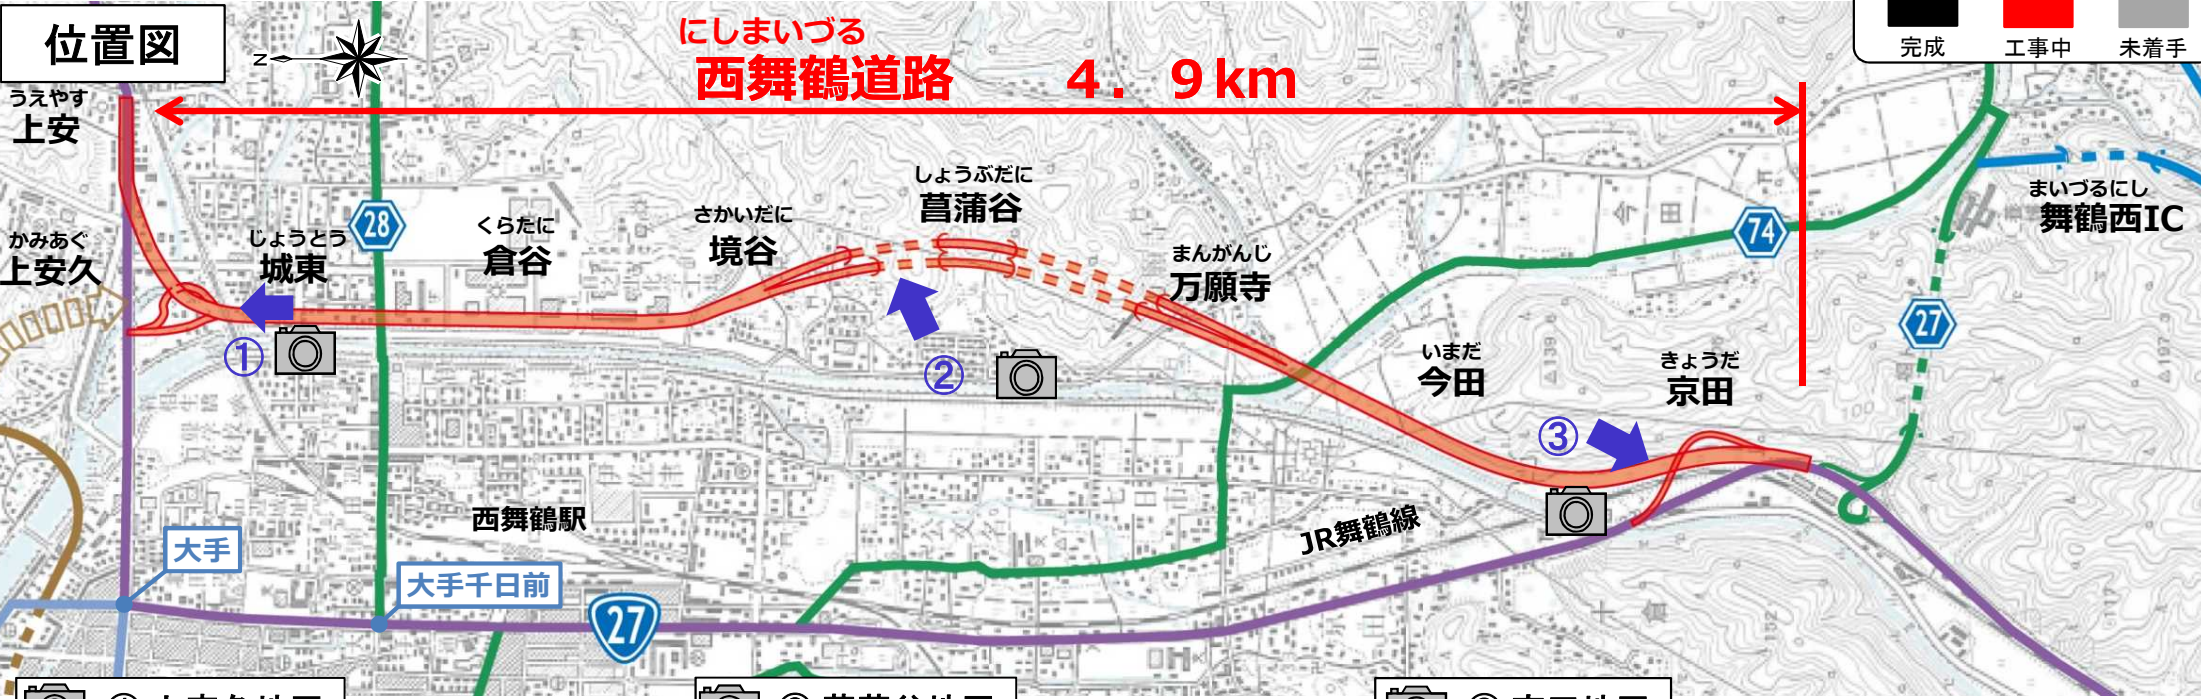
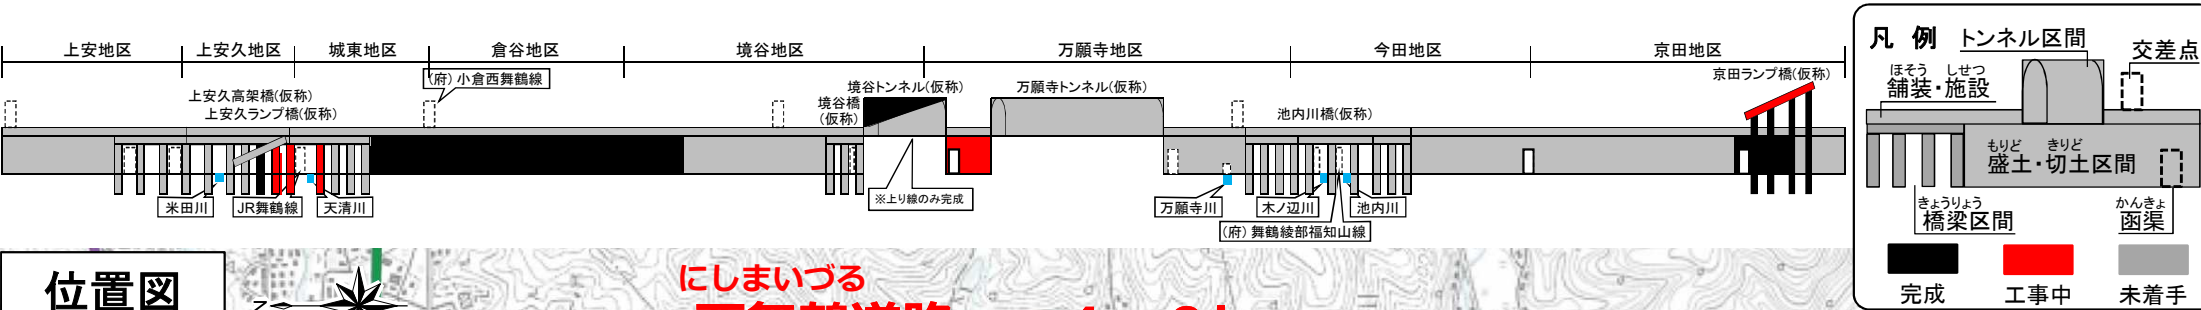



国道27号 西舞鶴道路(舞鶴市上安地区～京田地区) 工事状況(令和5年4月末時点)

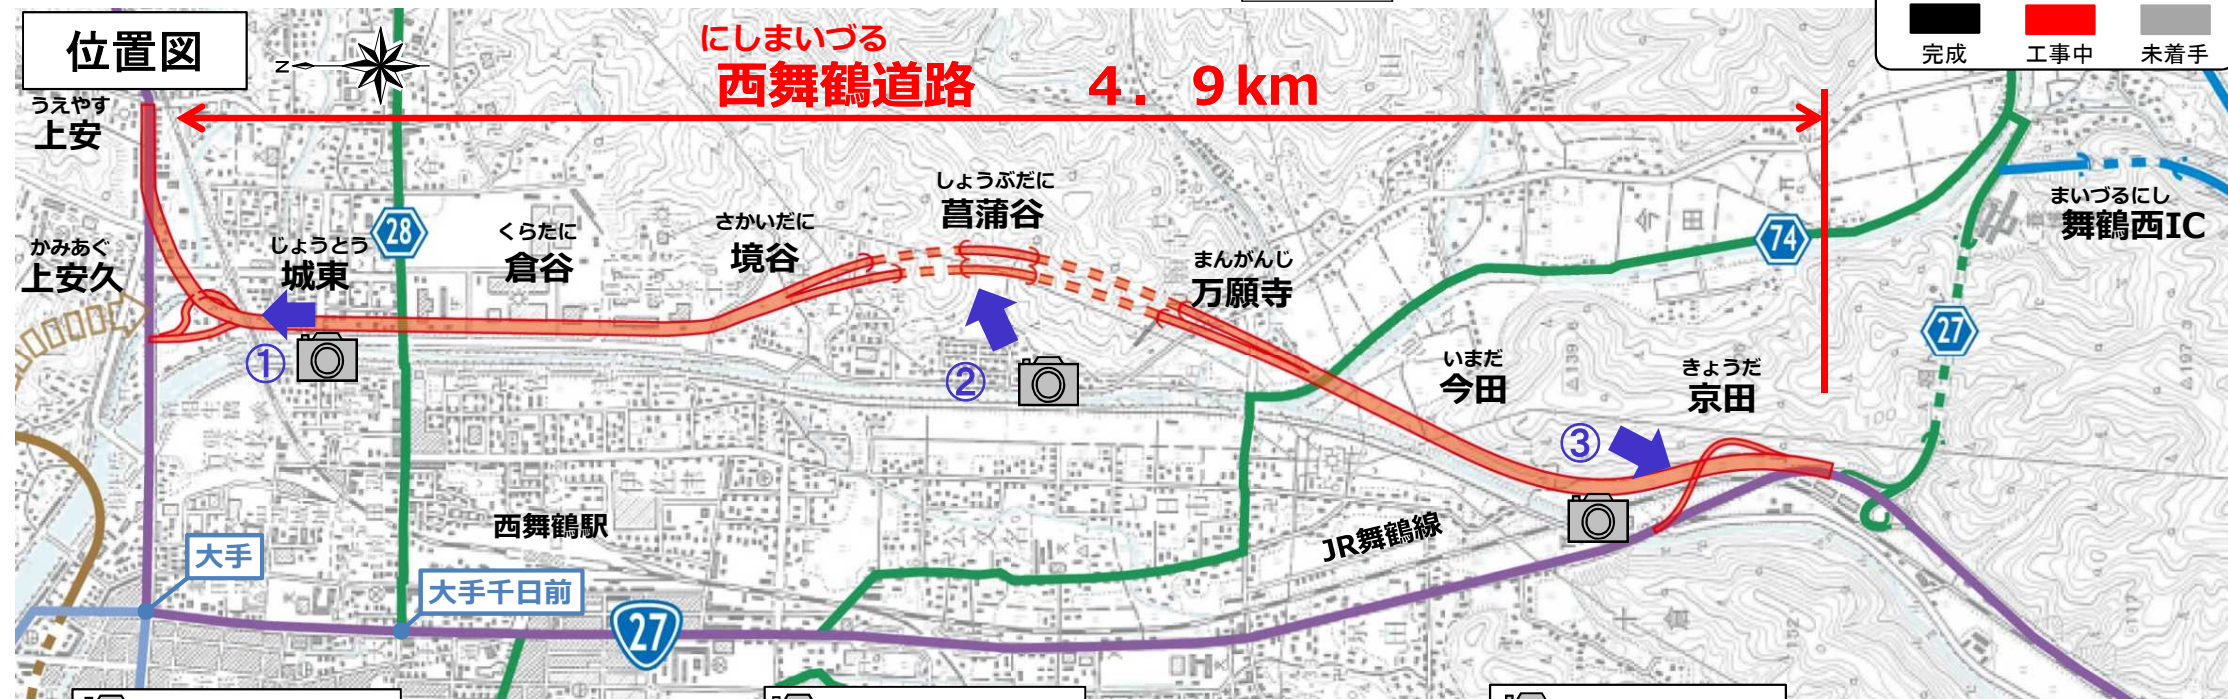


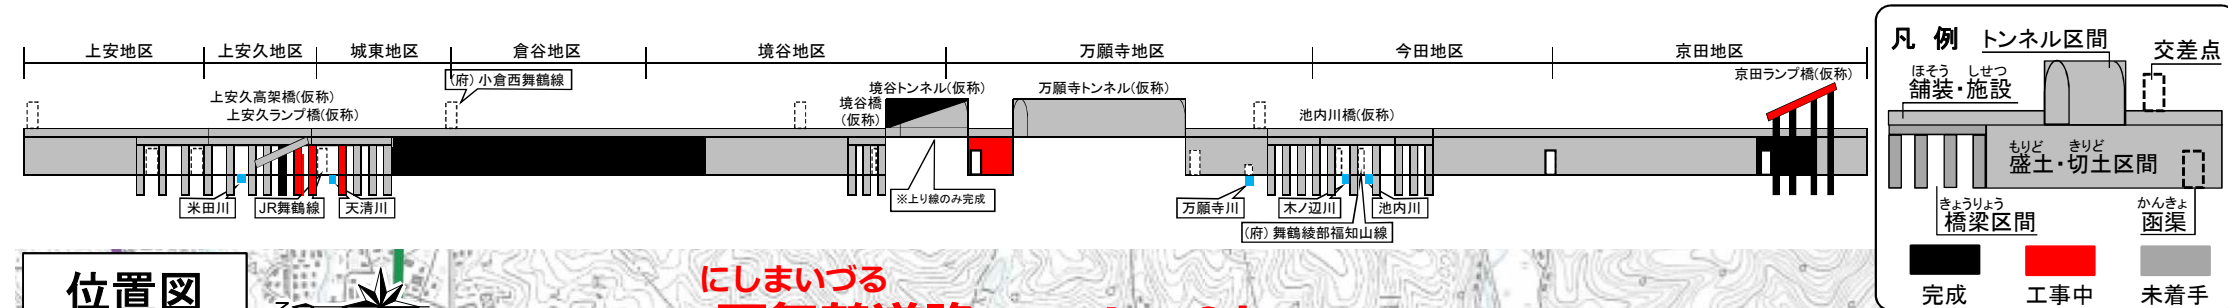

上安久高架橋(仮称)のP7-P9橋脚は完成し、P10R・L橋脚のケーソン基礎
 施工中です。






切土面に法枠工のコンクリートを吹き付けています。



JR舞鶴線上空を除いて、京田ランプ橋(仮称)の桁がかりイベント(仮の支柱)は撤去しました。

国道27号 西舞鶴道路(舞鶴市上安地区～京田地区) 工事状況(令和5年6月末時点)

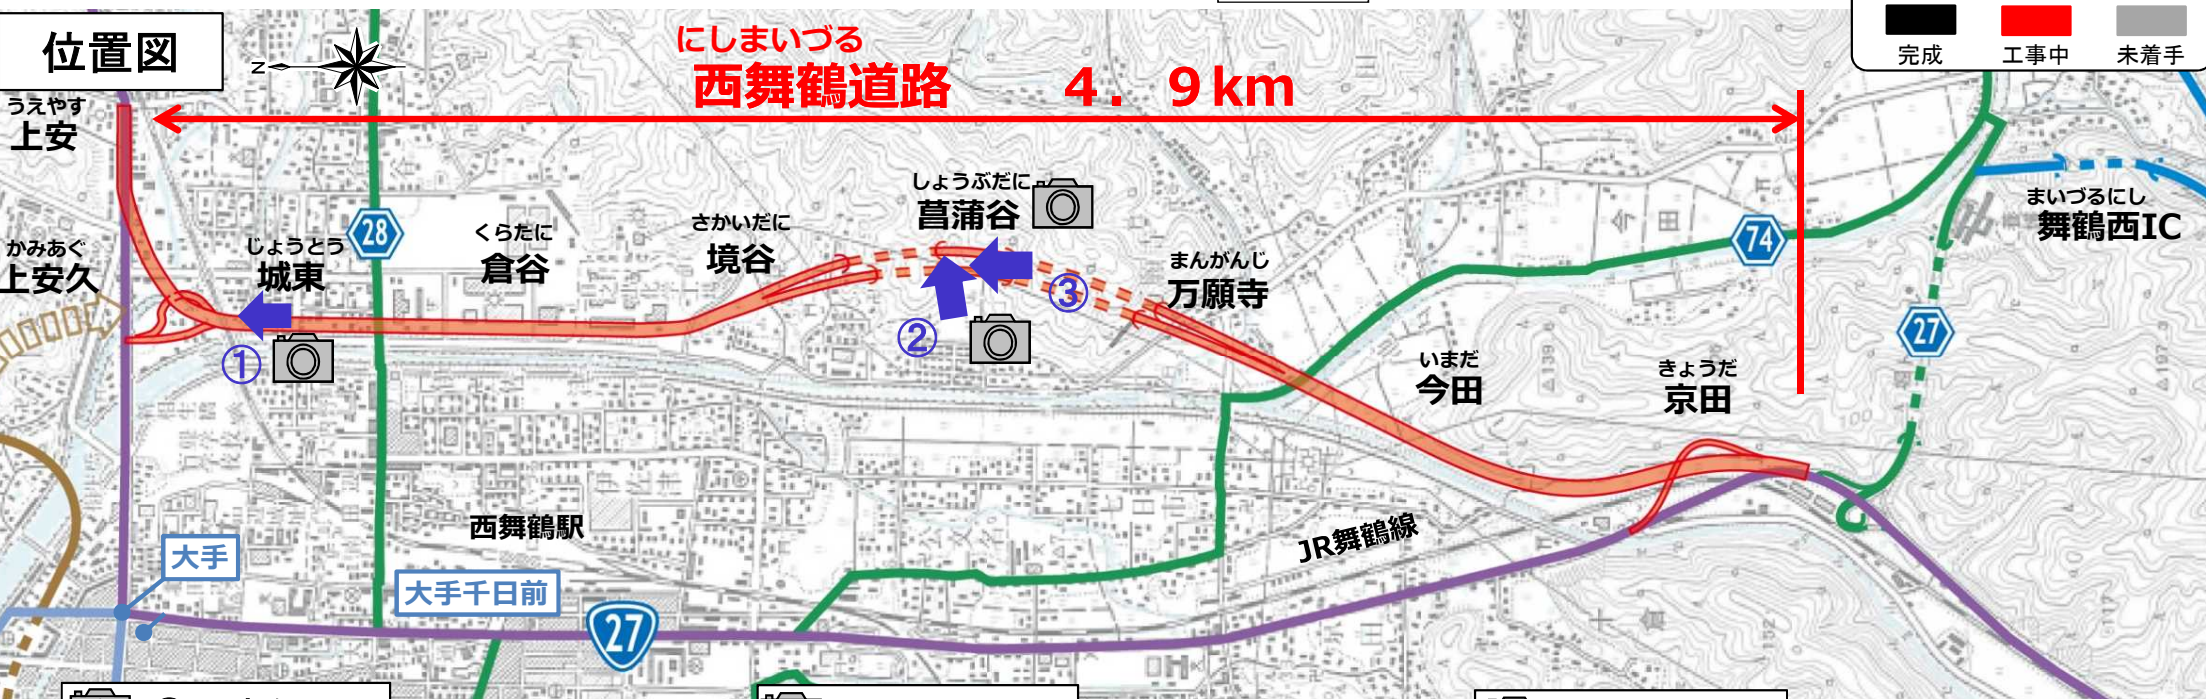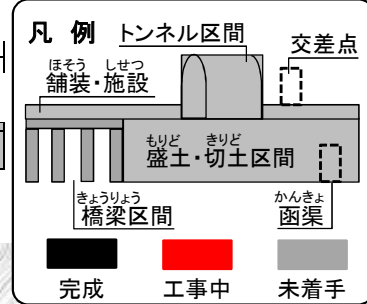

上安久高架橋（仮称）のP10R・L橋脚のケーソン基礎の掘削は完了し、中詰コンクリートの施工を行っています。






切土面に足場を組んで、法枠工の鉄筋挿入、グラウト(空隙を埋めるための流動性の液体)の注入を行っています。



函渠(箱型の水路)工が完了し、足場は撤去しました。

国道27号 西舞鶴道路(舞鶴市上安地区～京田地区) 工事状況(令和5年7月末時点)

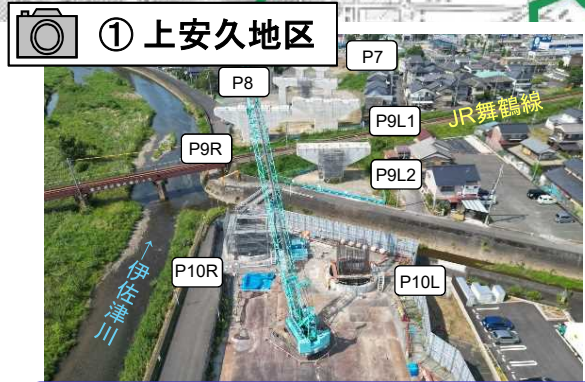
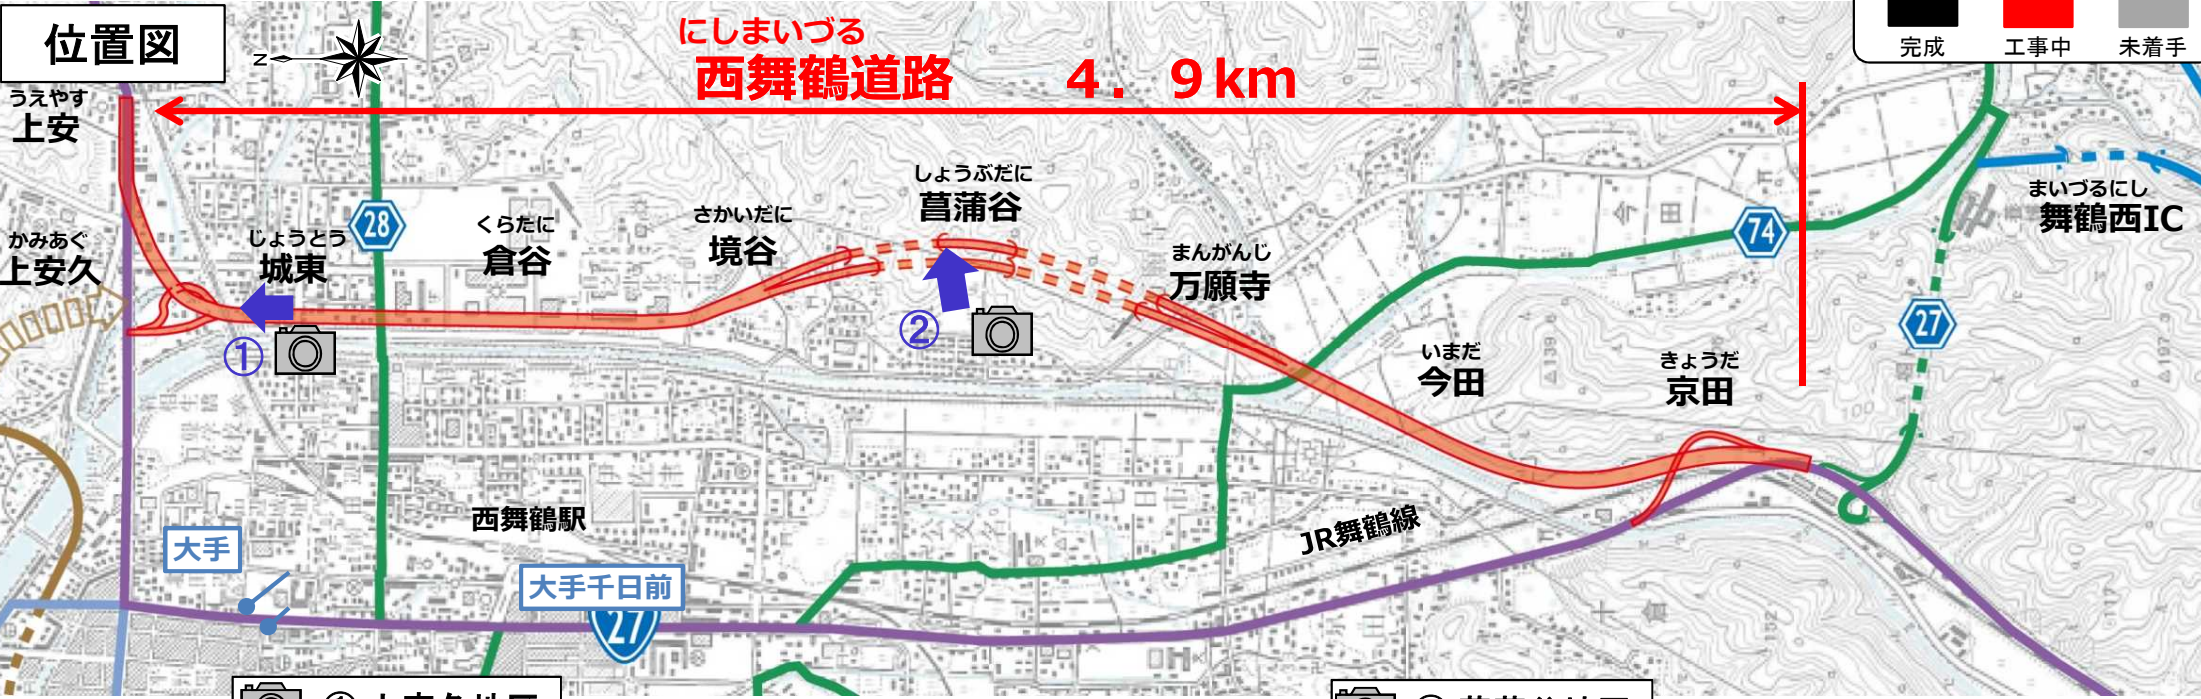
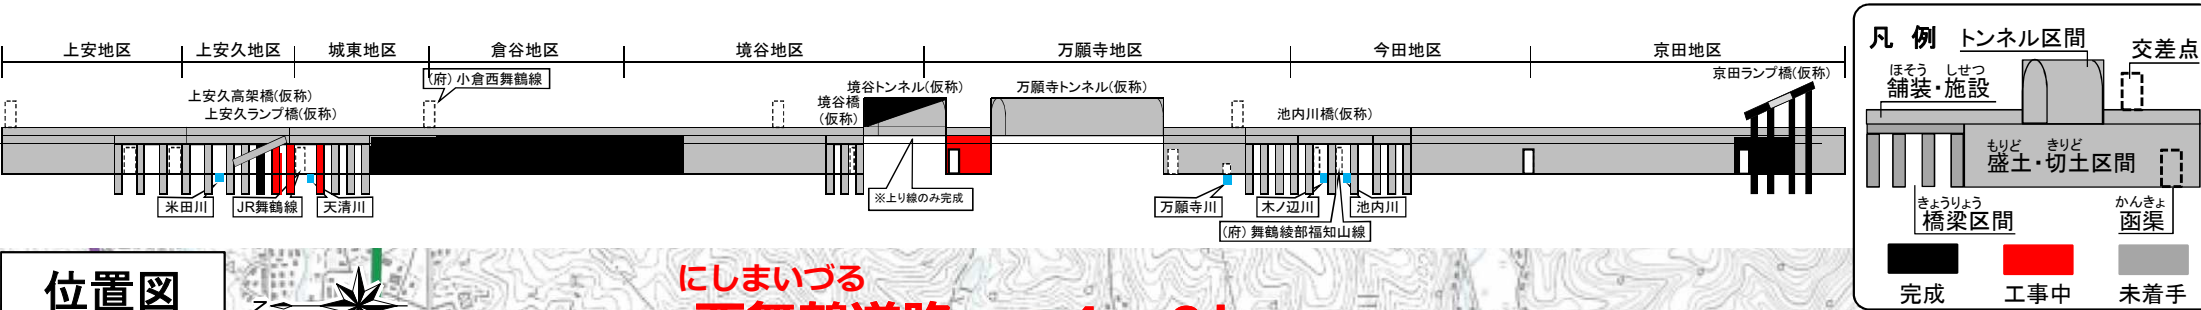


上安久高架橋(仮称)のP10R・L橋脚のケーソン基礎が概ね完了し、橋脚鉄筋の立ち上げ、足場を設置しています。



切土面の法枠工が完成し、盛土の法尻水路に着手します。




国道27号 西舞鶴道路(舞鶴市上安地区～京田地区) 工事状況(令和5年8月末時点)

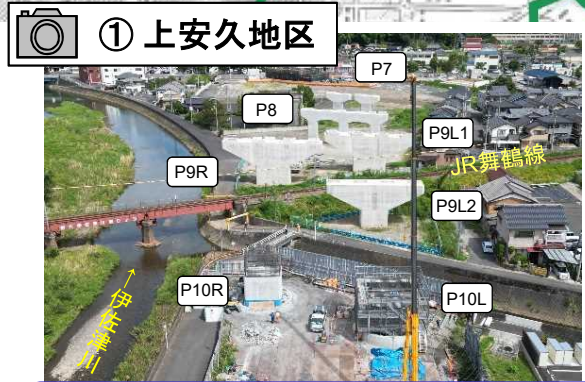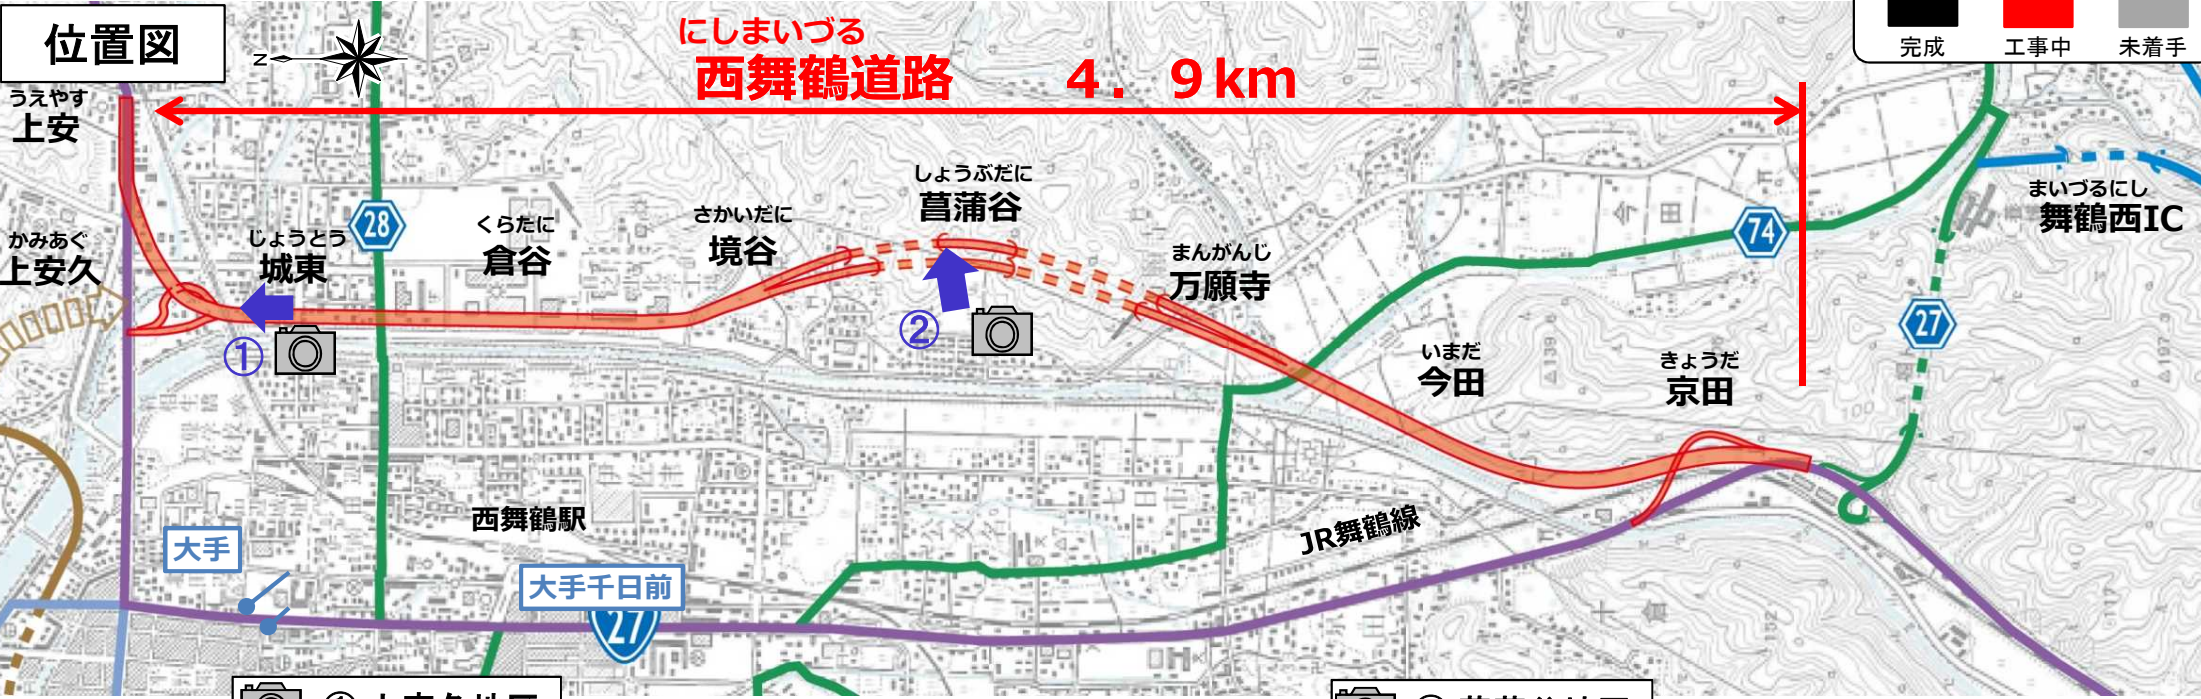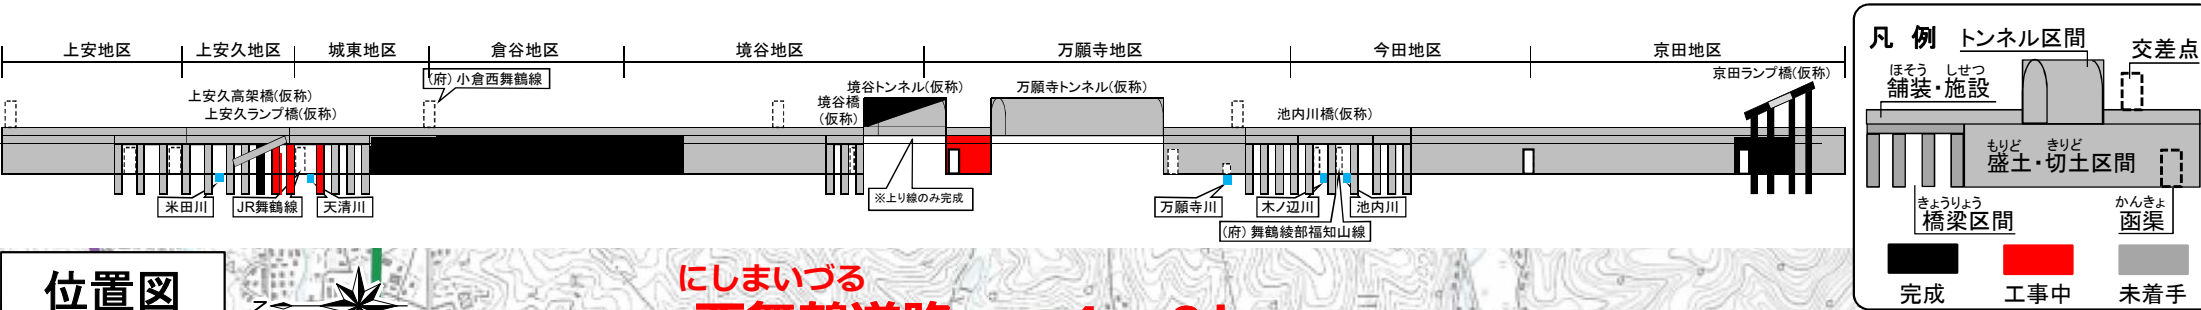

上安久高架橋(仮称)のP10R・L橋脚のケーソン基礎は概ね完了。P10Rは橋脚の梁部を除きコンクリート打設完了、P10Lは鉄筋組立中です。





盛土及び排水構造物の施工を行っています。

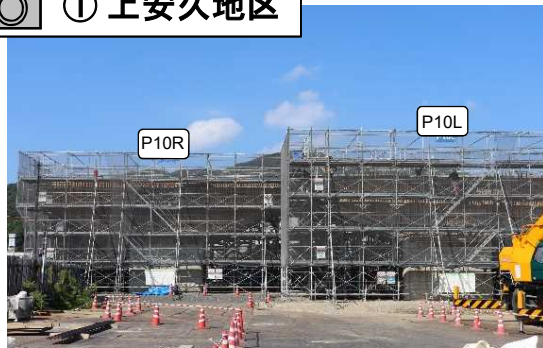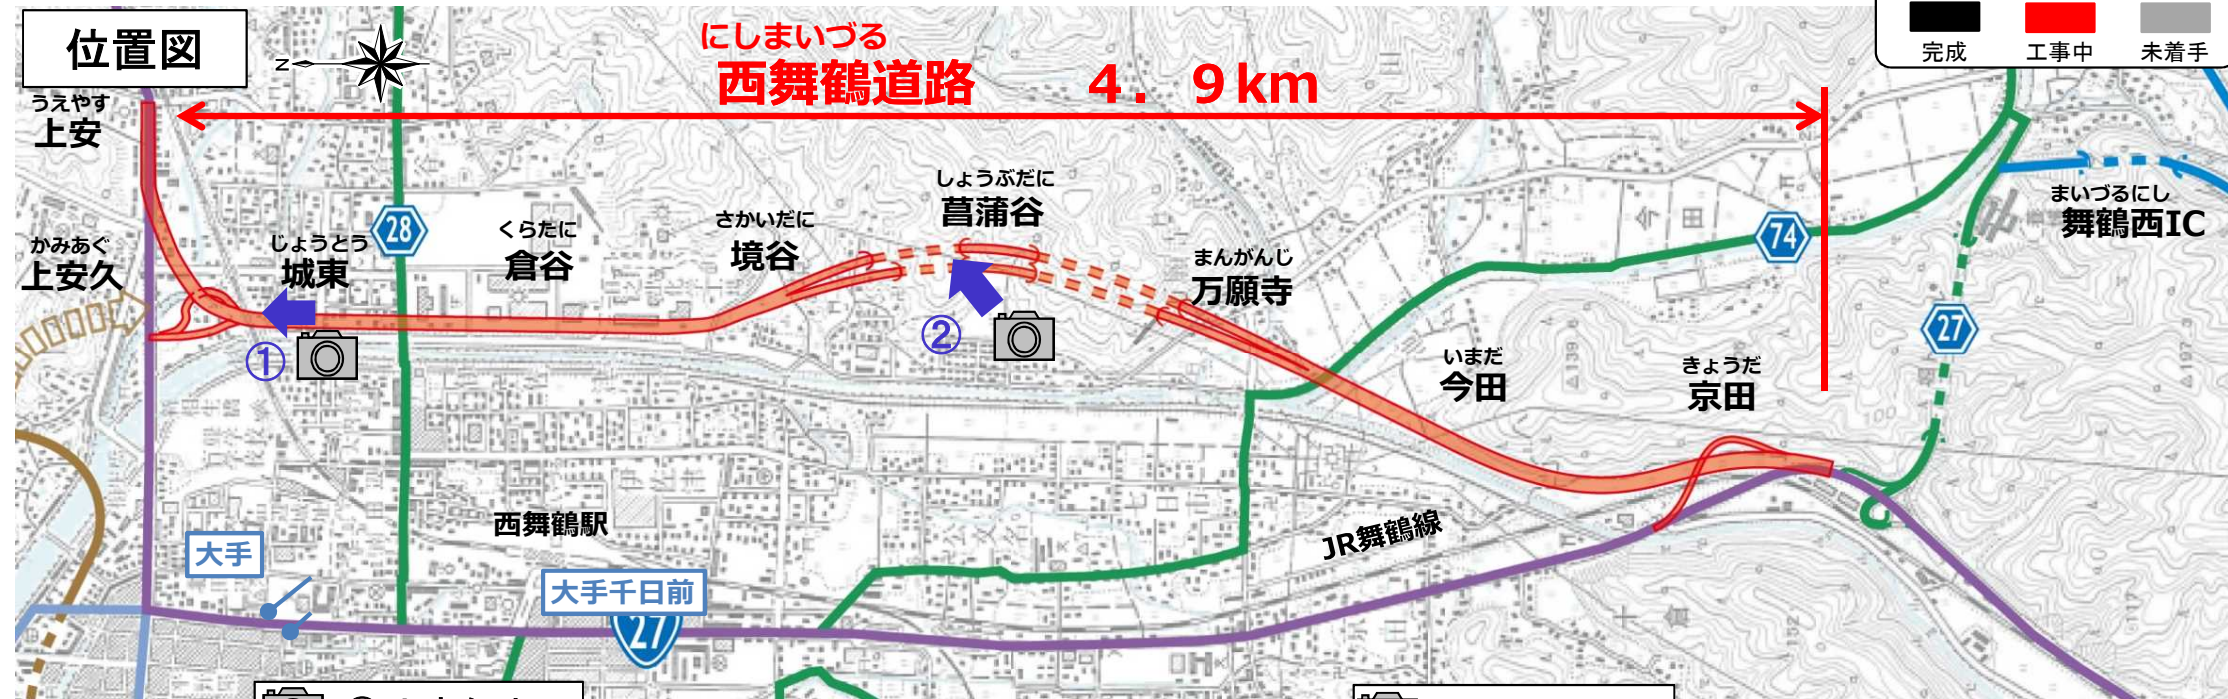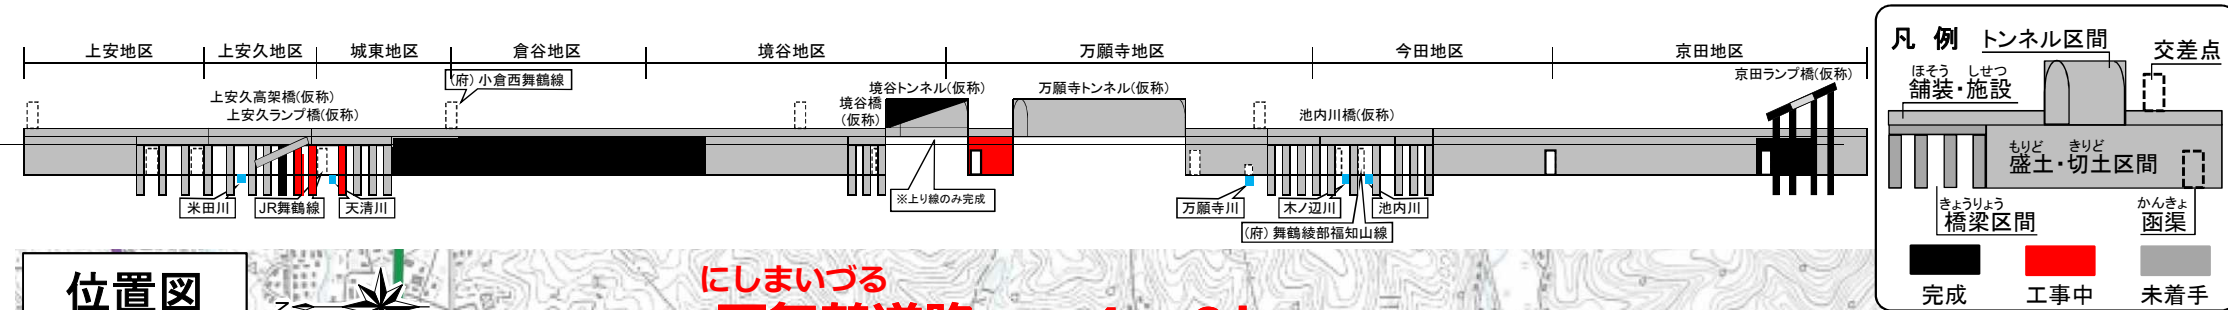

上安久高架橋(仮称)のP10R橋脚はコンクリートの打ち込みが完了。P10L橋脚は鉄筋の組立が完了しました。



土を盛り、ブロックを積んで道を造っています。
また、排水するための構造物を造っています。

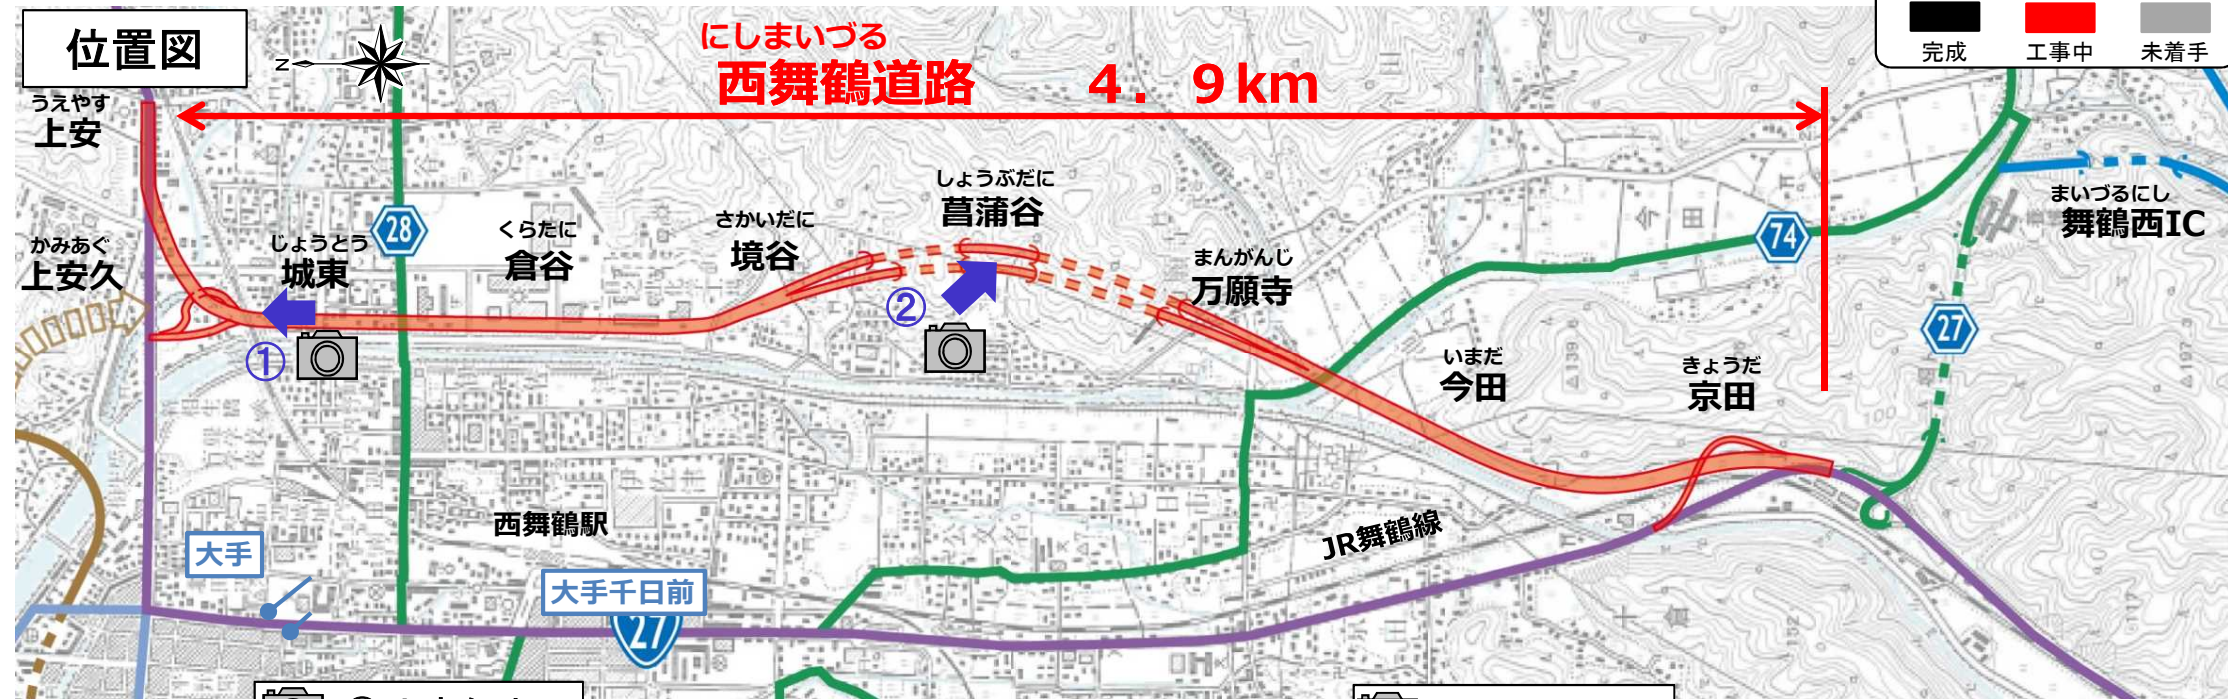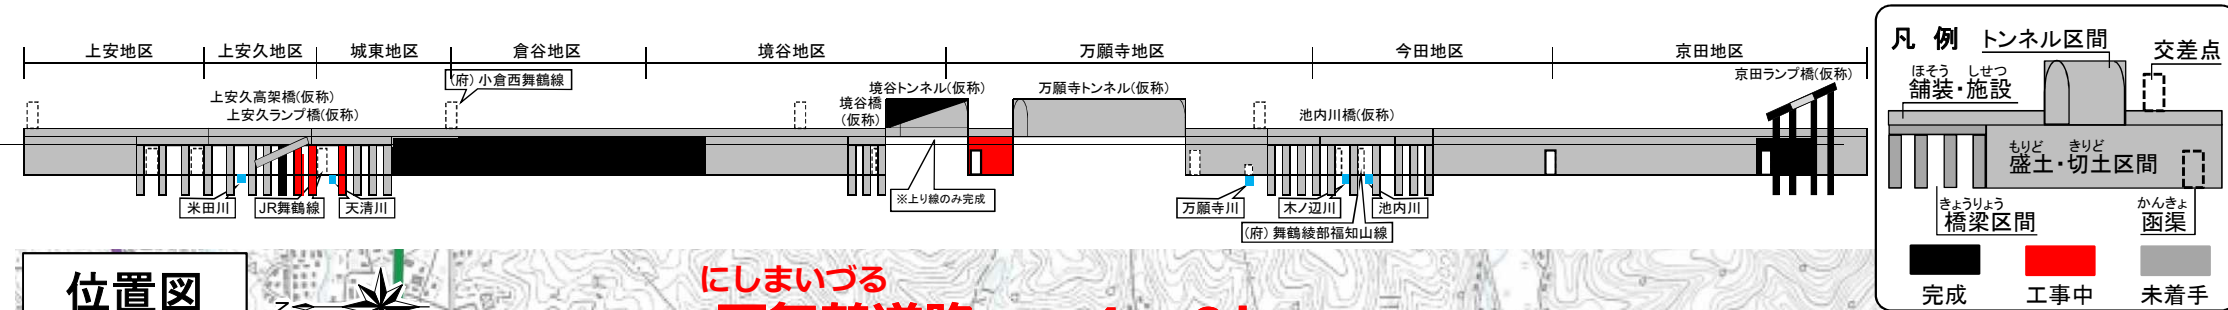

上安久高架橋(仮称)のP10R橋脚が完成。
P10L橋脚はコンクリートの打ち込みが完了し、今後は足場と支保を撤去する予定です。



斜面の保護は完了し、引き続き土を盛り、ブロックを積んで道を造っています。

国道27号 西舞鶴道路(舞鶴市上安地区～京田地区) 工事状況(令和5年11月末時点)

