

- ・国の管理区間については、平成23年9月洪水で堆積した土砂の撤去に加え、計画規模の洪水(19,000m³/s)を安全に流下させるための河道掘削(215万m³)を平成29年度に完了予定。引き続き、熊野川本川や支川相野谷川の更なる治水安全度の向上を図るため、概ね5年間で河道掘削を実施予定。
- ・和歌山県、奈良県、三重県の管理区間については、平成23年9月洪水で堆積した土砂の撤去を目的とした熊野川本川における掘削を平成29年度に概ね終了予定。和歌山県、三重県では、引き続き、熊野川本川や支川の更なる治水安全度の向上を図るため、10月に策定された熊野川圏域河川整備計画に基づき、河道掘削を実施予定。
- ・河川整備計画については、現在検討中^{※注1}の河川整備基本方針が策定後、新規策定及び変更予定。

区間		予定量 (万m ³)	実施量 (万m ³)	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30~
①河口～相賀 【国交省】	熊野川	215	215	[進捗バー]						(完了予定)	
		90	0							[進捗バー]	
①相賀～宮井 【和歌山県・三重県】	熊野川	23	21.7			[進捗バー]				[進捗バー]	
	支川	13								[進捗バー]	
②宮井～二津野ダム 【和歌山県】	熊野川	146	119.1	[進捗バー]						[進捗バー]	
	支川	13								[進捗バー]	
③二津野ダム上流 【奈良県】	熊野川	173	173	[進捗バー]						(完了)	
	支川	39	39		[進捗バー]					(完了)	
④宮井～小森ダム 【三重県】	北山川	-	-								
	支川	1	1			[進捗バー]				(完了)	
⑤小森ダム上流 【奈良県・三重県】	支川	0.4								[進捗バー]	
		9	9			[進捗バー]				(完了)	
		4	3.2							[進捗バー]	(完了予定)
		1.4							[進捗バー]	(河川整備計画に基づき実施)	

※注1：年度内に社会資本整備審議会での審議開催を目指す。

➡ (国管理区間)
熊野川本川や相野谷川の更なる治水安全度の向上を図るため、継続して河道掘削を実施

➡ (県管理区間)
熊野川本川や支川の更なる治水安全度の向上を図るため、継続して河道掘削を実施

(実施量はH29年9月現在 ダム管理区間は除く)

※除去予定量は現時点での値であり、変動する可能性があります。 ※注2：河川整備計画(H21和歌山県策定)に基づき実施中の河道掘削は、10月に策定された同計画にも位置付け、継続して実施します。

熊野川河道掘削の取り組み状況

H29.9月時点


凡例

区間名

掘削予定量 (H28年度末掘削量)

【H29年度掘削予定量】

- : 流域界
- : 河川
- : 掘削範囲

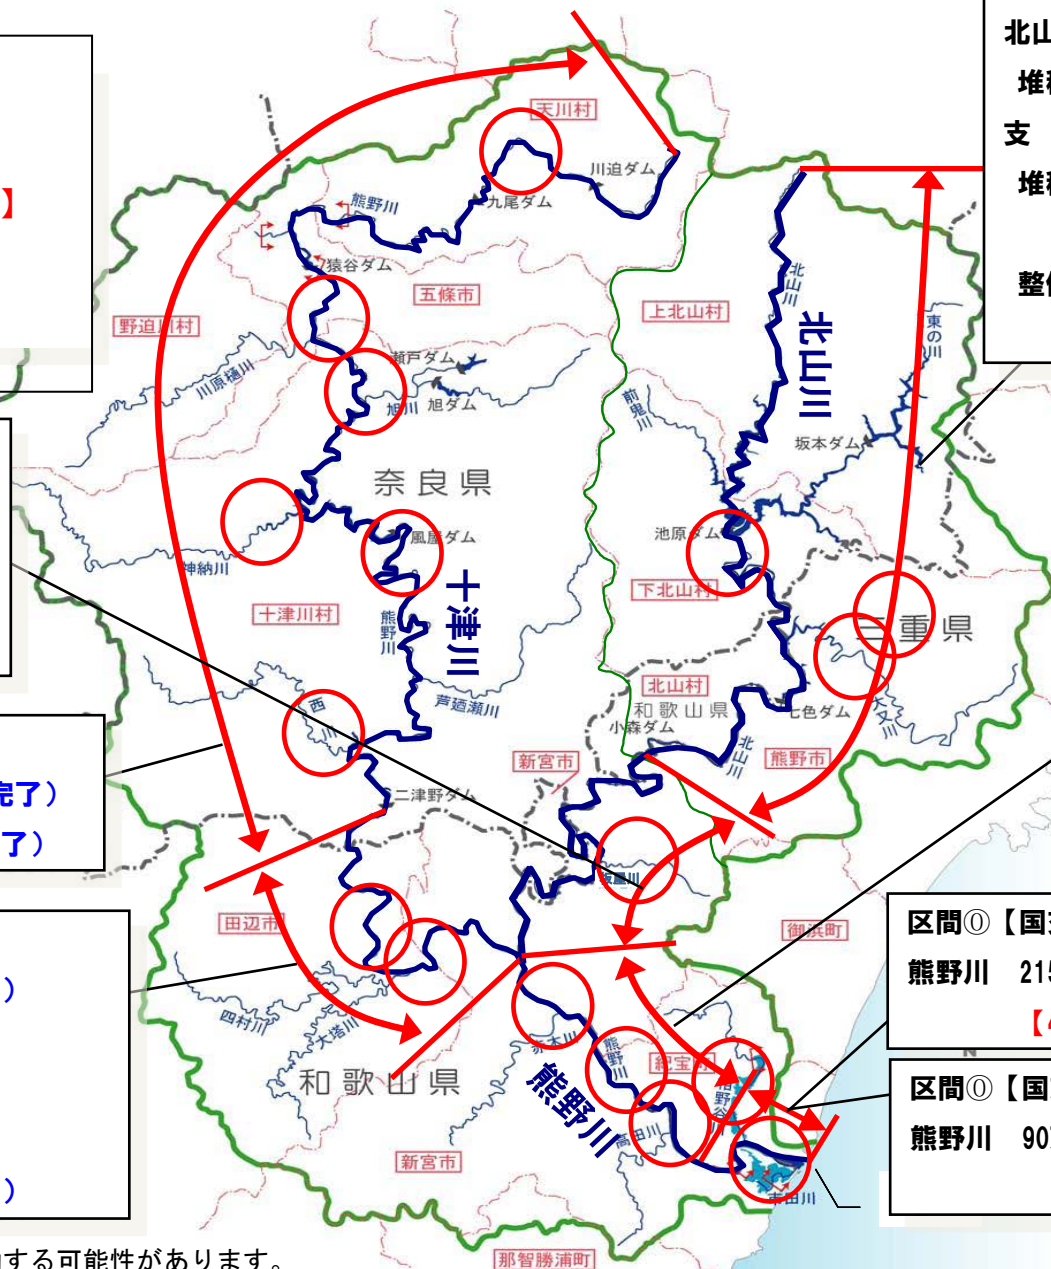

区間⑤【奈良県・三重県】

北山川

堆積土砂 9万m³ (9万m³ : 完了)

支川

堆積土砂 4万m³ (3.2万m³)

【0.8万m³ : H29完了予定】

整備計画 1.4万m³ (-)

【 - 】

区間①【和歌山県・三重県】

熊野川

堆積土砂 23万m³ (21.6万m³)

【0.6万m³】

整備計画 13万m³ (-)

【1.4万m³】

支川

堆積土砂 11万m³ (9.7万m³)

【0.4万m³】

区間④【国交省 (激特対策)】

熊野川 215万m³ (173万m³)

【42万m³ : H29完了予定】

区間③【国交省 (緊特対策)】

熊野川 90万m³ (-)

【48万m³】

区間④【三重県】

支川

堆積土砂 1.2万m³ (1.2万m³ : 完了)

整備計画 0.4万m³ (-)

【 - 】

区間③【奈良県】

熊野川 堆積土砂 173万m³ (173万m³ : 完了)

支川 堆積土砂 39万m³ (39万m³ : 完了)

区間②【和歌山県】

熊野川 堆積土砂 146万m³ (119.1万m³)

【2万m³】

整備計画 13万m³ (-)

【6万m³】

支川 堆積土砂 8万m³ (8万m³ : 完了)

※除去予定量は現時点での値であり、変動する可能性があります。

(ダム管理区間は除く)

熊野川(区間①:直轄上流端～北山川合流点)における河道掘削の状況

和歌山県

- ・ 堆積土砂(6.7万m³) : 17k
H27. 4月～H28. 3月 (完了)
- ・ 堆積土砂(4.7万m³) : 19k
H25. 7月～H25. 9月 (完了)
- ・ 堆積土砂(1.9万m³) : 20k
H25. 9月～H25. 11月 (完了)

和歌山県

- ・ 整備計画(4.9万m³)
H30. 1月～H30. 3月 : 1.0万m³ (予定)
- H30. 4月～ : 3.9万m³ (予定)

三重県

- ・ 堆積土砂(5.7万m³) : 12k
H26. 1月～H29. 3月 : 5.7万m³ (完了)
- ・ 堆積土砂(1万m³) : 17k
H27. 3月～H28. 3月 (完了)

三重県

- ・ 整備計画(8.2万m³)
H29. 12月～H30. 3月 : 0.4万m³ (予定)
- H30. 4月～ : 7.8万m³ (予定)

和歌山県

- ・ 堆積土砂(3.0万m³) : 11k
H26. 7月～H29. 3月 : 1.5万m³ (完了)
- H29. 4月～H30. 3月 : 0.6万m³ (予定)
- H30. 4月～ : 0.9万m³ (予定)

※ 除去予定量は現時点での値であり、変動する可能性があります。

