



河道内堆積土砂対応状況【和歌山県】

平成28年4月 現在

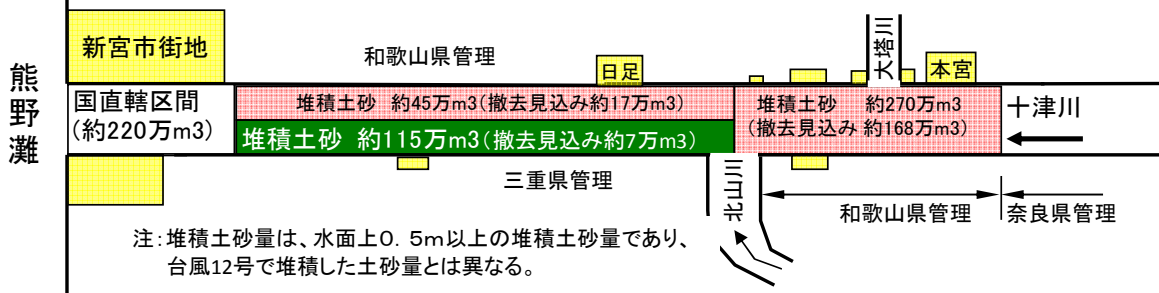

注：堆積土砂量は、水面上0.5m以上の堆積土砂量であり、台風12号で堆積した土砂量とは異なる。

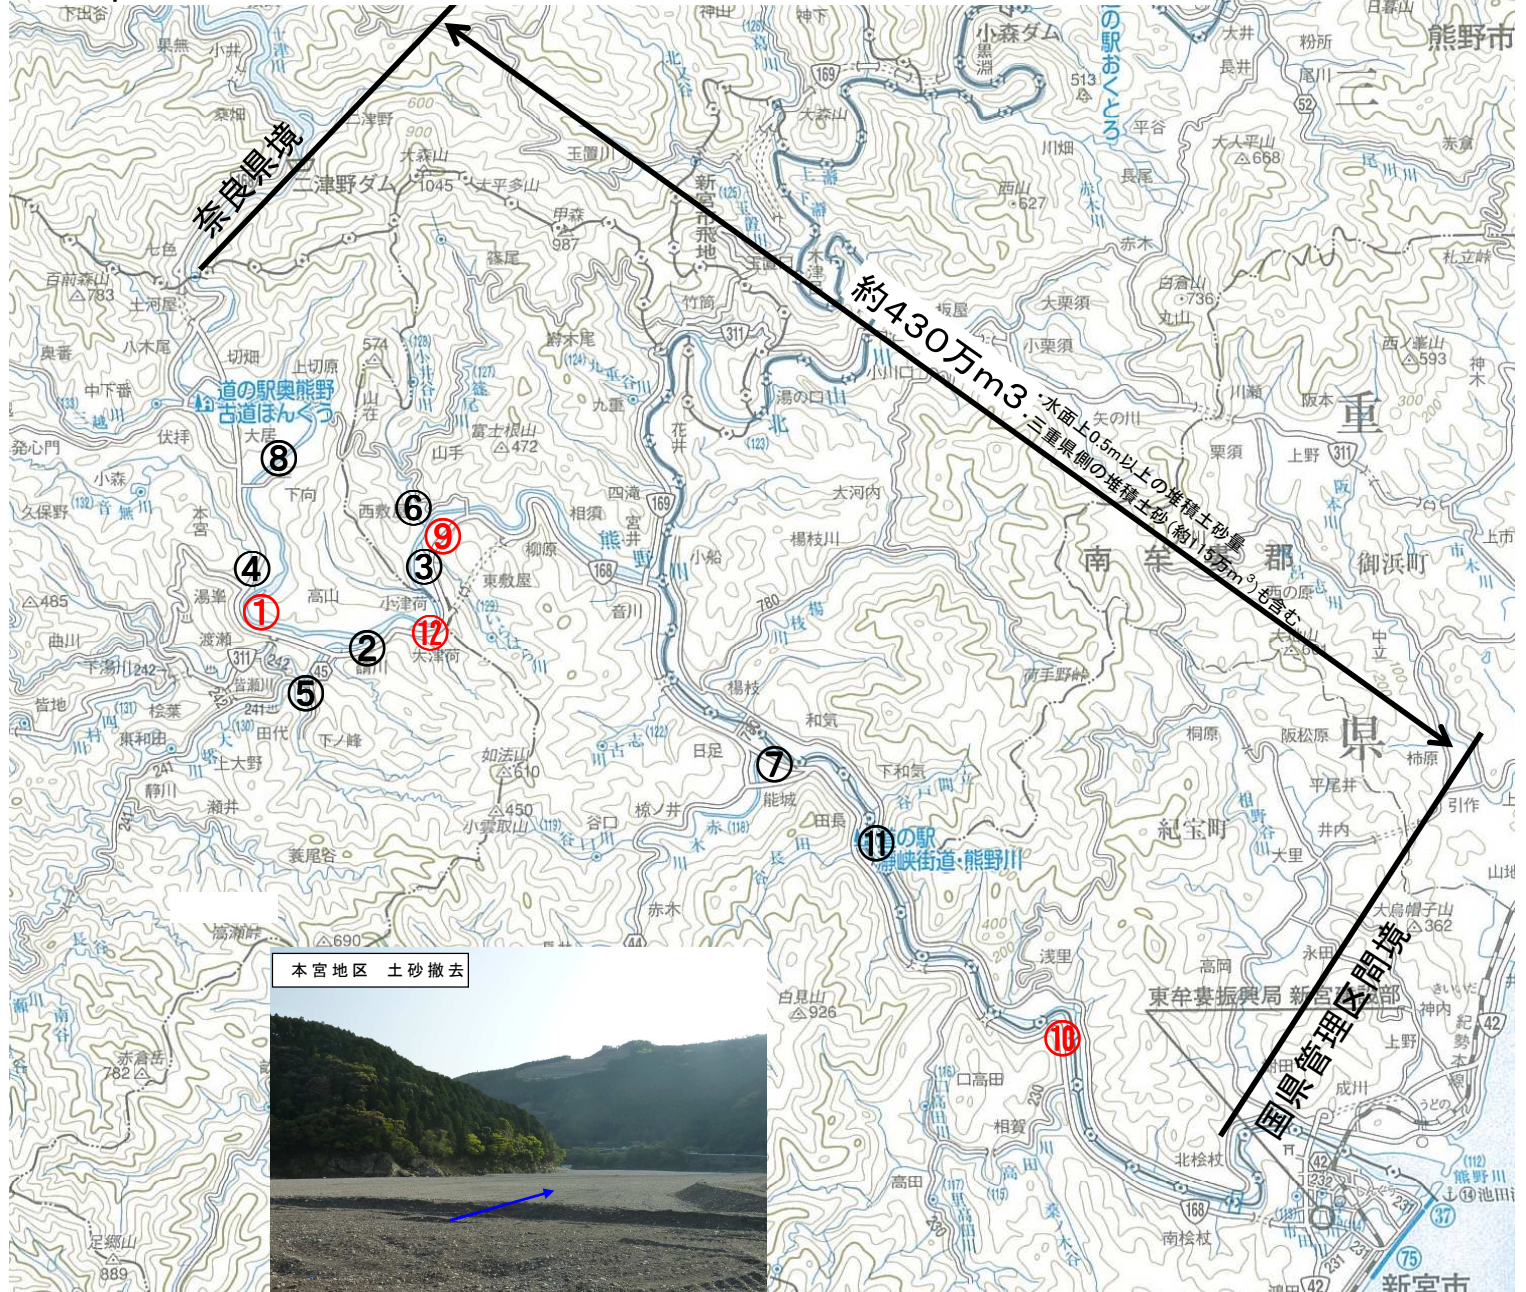

土砂撤去状況

NO	河川名	地区名	工事名	実施主体	H27まで	H28掘削予定量	総掘削量	計画年度
①	熊野川	田辺市 本宮地区	水防災	県	約 23万 ^m	約 6万 ^m	約 40万 ^m	～H30
②	熊野川	田辺市 請川地区	20条工事	市	約 44万 ^m	—	約 44万 ^m	完了
③	熊野川	新宮市 東敷屋	一般採取	民間	約 2万 ^m	—	約 2万 ^m	完了
④	音無川	田辺市 一本松地区	国災	県	約 1万 ^m	—	約 1万 ^m	完了
⑤	大塔川	田辺市 川湯地区	県災	県	約 6万 ^m	—	約 6万 ^m	完了
⑥	篠尾川	新宮市 西敷屋	県災	県	約 1万 ^m	—	約 1万 ^m	完了
⑦	熊野川	新宮市 日足地区	推進費	県	約 7万 ^m	—	約 7万 ^m	完了
⑧	熊野川	田辺市 大居地区	推進費	県	約 20万 ^m	—	約 20万 ^m	完了
⑨	熊野川	新宮市 東敷屋	一般採取	民間	約 10万 ^m	約 3万 ^m	約 40万 ^m	H25～概ね5年間
⑩	熊野川	新宮市 相賀	一般採取	民間	約 2万 ^m	約 0.6万 ^m	約 3万 ^m	H25～概ね5年間
⑪	熊野川	新宮市 日足地区	推進費	県	約 7万 ^m	—	約 7万 ^m	H26～H27
⑫	熊野川	田辺市 小津荷	20条工事	市	約 7万 ^m	約 7万 ^m	約 14万 ^m	H27～H28
合計					約 130万 ^m	約 17万 ^m	約 185万 ^m	
