

## 熊野川堆積土砂除去の取り組み状況

## 除去スケジュール

区間		除去全体予定 定量 (万m <sup>3</sup> )	H23	H24	H25	H26	H27	H28～
①河口～相賀	熊野川	400	■					
	熊野川	18			■			
①相賀～宮井	支 川	11		■				
	※河川管理者等が連携してさらなる堆積土砂の除去及び民間による砂利採取を調整中。							
②宮井～二津野ダム	熊野川	159	■					
	支 川	8	■					
③二津野ダム上流	熊野川	173	■					
	支 川	39		■				
④宮井～小森ダム	北山川	—						
	支 川	1			■			
⑤小森ダム上流	北山川	9		■				
	支 川	4			■			

(ダム管理区間は除く)

※ ①の区間以外においても各県独自に民間による砂利採取の適用について実施もしくは調整が進められている区間がある。


※ 除去予定量は現時点での値であり、変動する可能性がある。

# 熊野川堆積土砂除去の取り組み状況

H27.10月末時点

凡例

区間名	
本川 除去予定量 (H26年度末迄除去量)	
	【H27年度除去予定量】
支川 除去予定量 (H26年度末迄除去量)	
	【H27年度除去予定量】

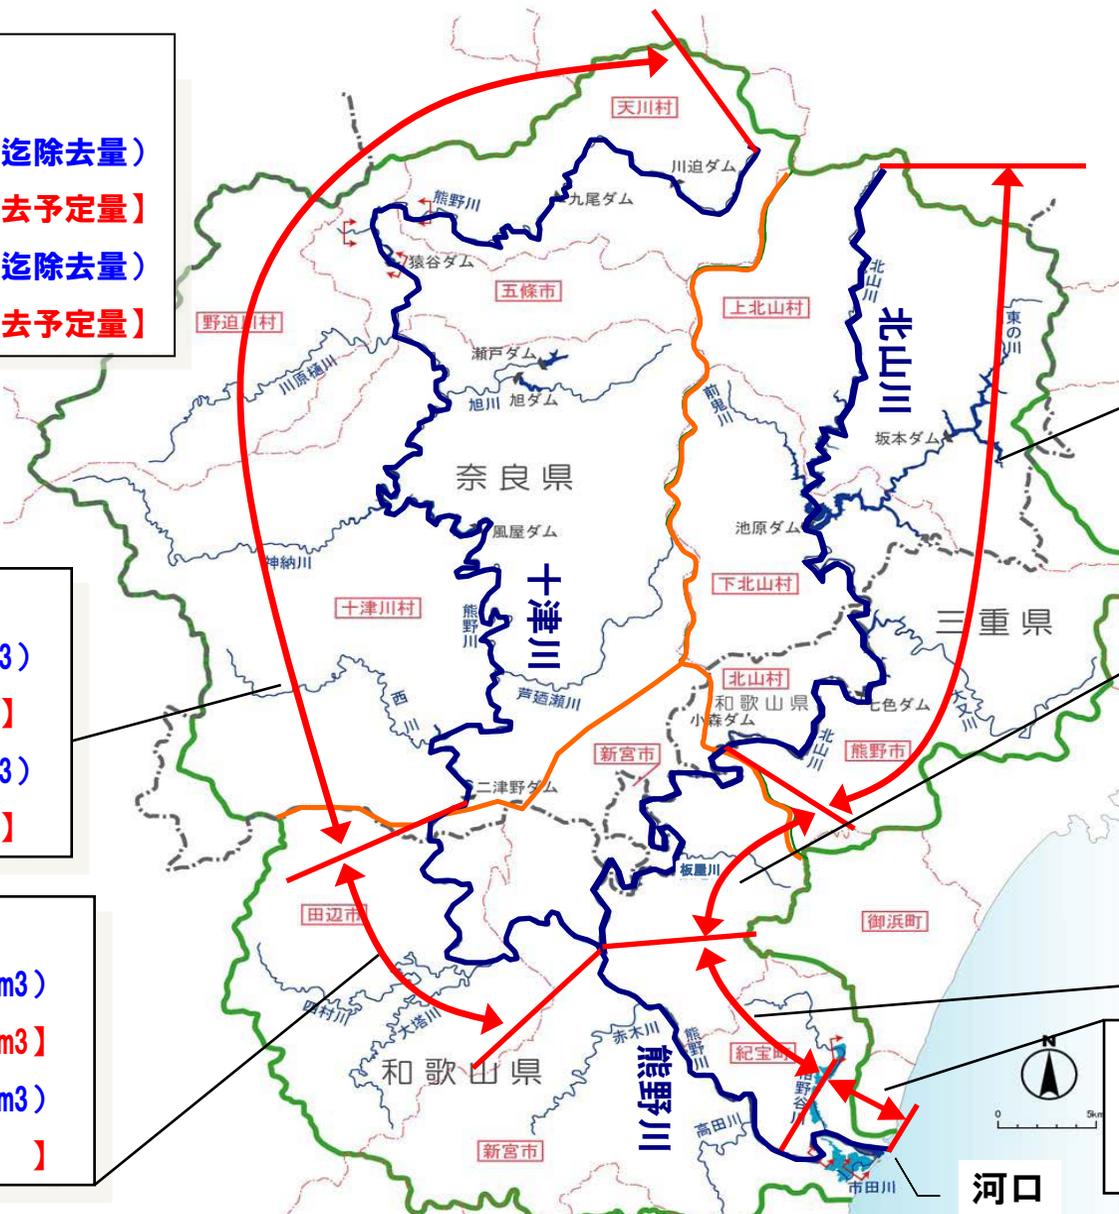

区間③

熊野川	173 万m3 (173万m3)	【 - 】
支川	39 万m3 (39万m3)	【 - 】

区間②

熊野川	159 万m3 (90.3万m3)	【17.1万m3】
支川	8 万m3 (8万m3)	【 - 】

区間⑤

北山川	9万m3 (9万m3)	【 - 】
支川	4万m3 (3万m3)	【0.2万m3】

区間④

北山川	- 万m3	
支川	1.2万m3 (1.2万m3)	【 - 】

区間①

熊野川	18万m3 (7.8万m3)	【7.4万m3】
支川	11万m3 (9.3万m3)	【0.1万m3】

区間①

熊野川	400万m3 (137万m3)	【20万m3】
-----	-----------------	---------

※ 除去予定量は現時点での値であり、変動する可能性がある 那智勝浦町

(ダム管理区間は除く)

