

# 熊野川河道掘削の実施状況と河川整備計画の目標について

近畿地方整備局  
紀南河川国道事務所

# 熊野川河道掘削実施状況

○緊急対策特定区間事業が令和3年度末に概成し、今後も激甚化する水害リスクに備え、**新宮川水系(熊野川)河川整備計画に沿った河道掘削を実施。(R4～継続中)**

○紀伊半島大水害と同規模の洪水に対して本支川とも現況堤防高以下に水位を低減。




	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4～
河道掘削	■ 激甚災害対策特別緊急事業						■ 緊急対策特定区間事業					■ 整備計画

各事業の掘削量

事業	掘削量
激特事業(H23～H28)	215万m <sup>3</sup>
緊特事業(H29～R3)	90万m <sup>3</sup>
整備計画に沿った掘削(R4～R33)	21.9万m <sup>3</sup>

※R5見込み掘削量含む

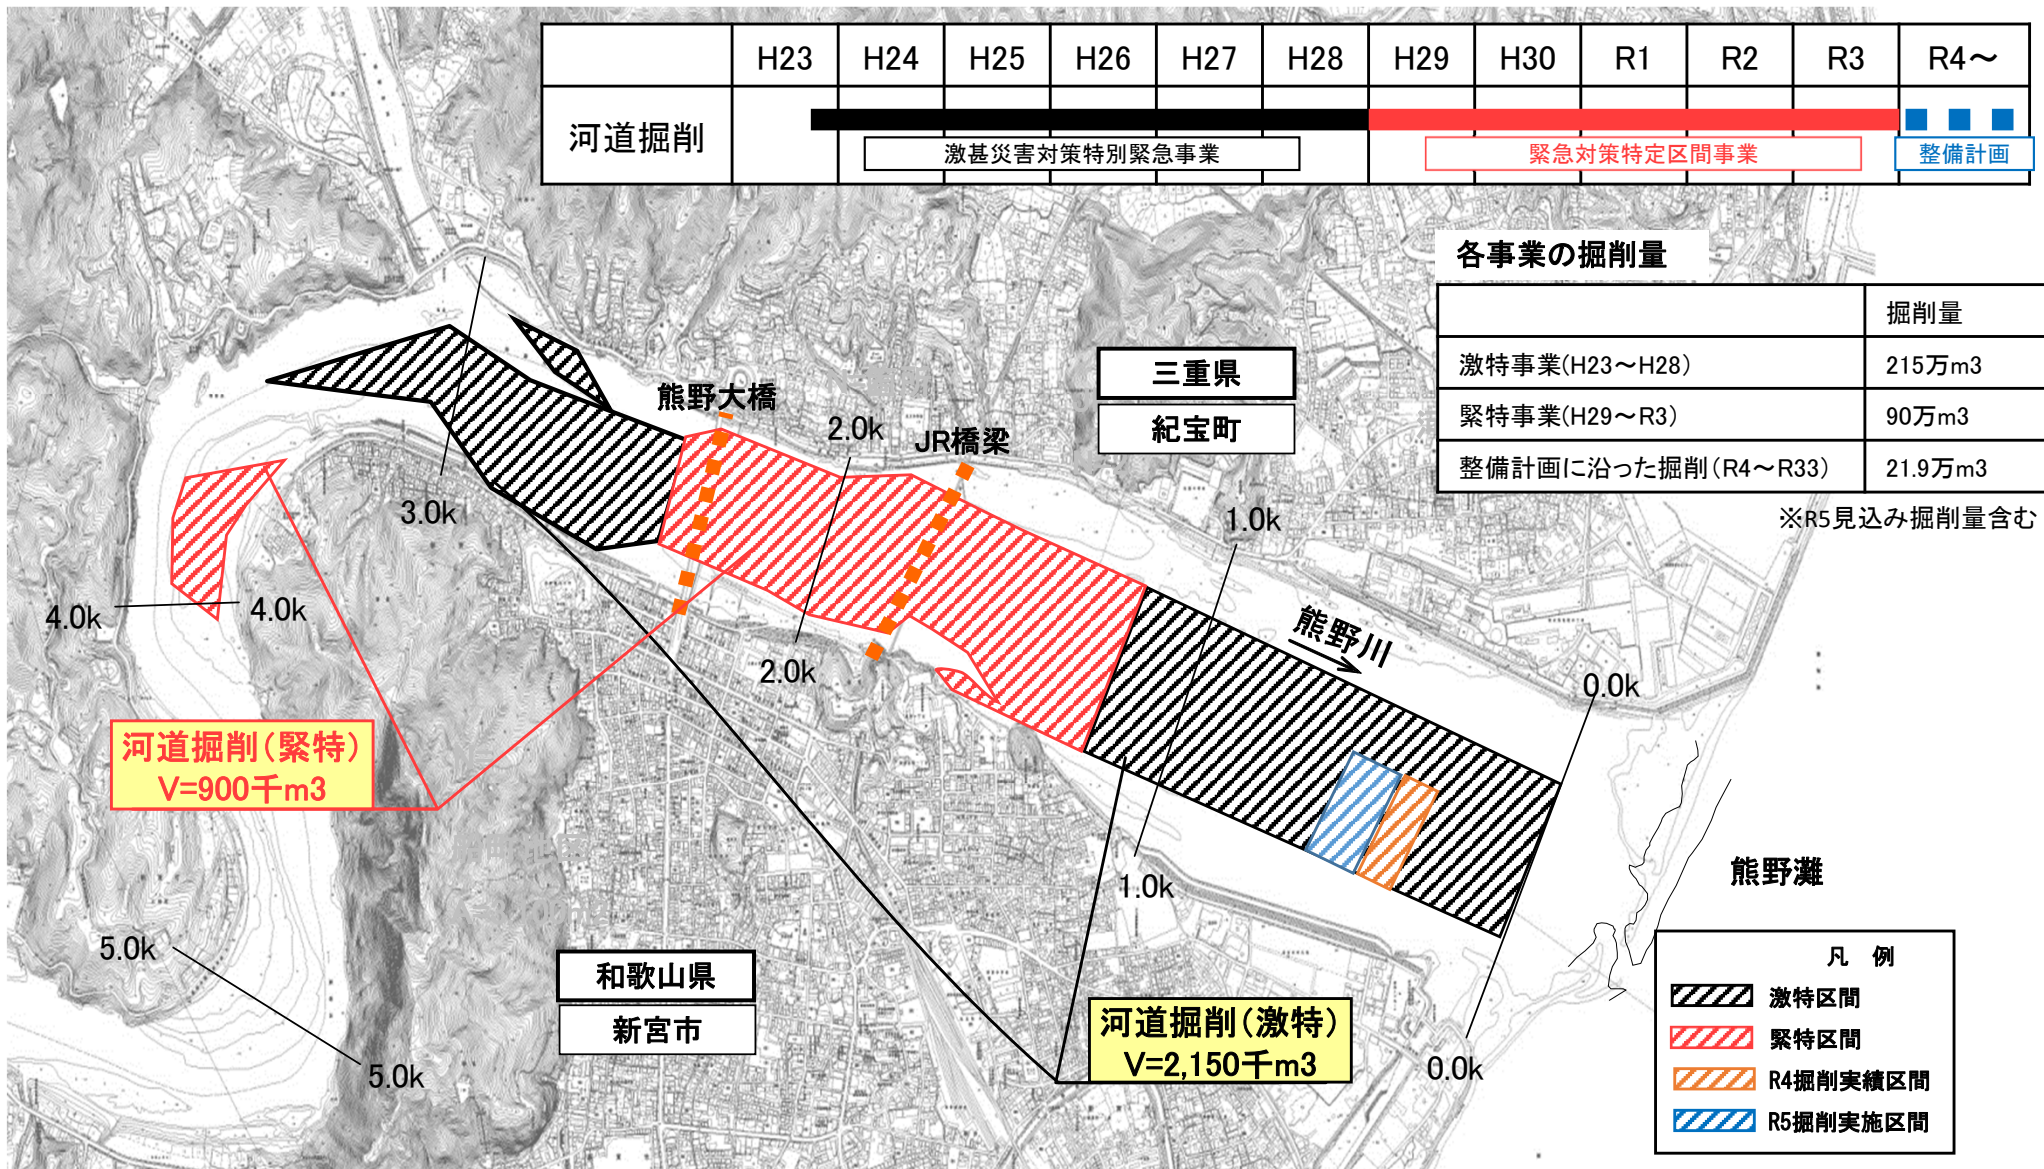

凡例	
▨	激特區間
▨	緊特區間
▨	R4掘削実績区間
▨	R5掘削実施区間
