

米原バイパス (9工区) 事業 工事進捗レポート

令和7年5月

TOPICS 1 米原バイパス入江地区他舗装工事

至長浜市 至彦根市 R7.5月撮影

車線切替をし、本線の管路、排水構造物等の工事を進めます。

TOPICS 2 米原バイパス矢倉川高架橋(P5-A2)鋼上部工事、米原バイパス二線橋新設工事、米原バイパス松原地区他改良工事

至長浜市 至彦根市 R7.5月撮影

P5橋脚～A2橋台間の上部工の架設(JR上空を含む)が完了し、床版工を進めます。

本線の盛土工、排水構造物等の工事を進めます。

TOPICS 3 米原バイパス鳥居本高架橋鋼上部工事

至長浜市 至彦根市 R7.5月撮影


上部工の架設、床版工が完了し、橋梁付属物を進めます。

TOPICS 4 米原バイパス佐和山高架橋上部工事、国道8号米原バイパス横断に伴う本体構築他工事

至彦根市 至長浜市 R7.5月撮影

近江鉄道下のボックスカルバート、U型擁壁の躯体工を進めます。

鳥居本駅 彦根駅

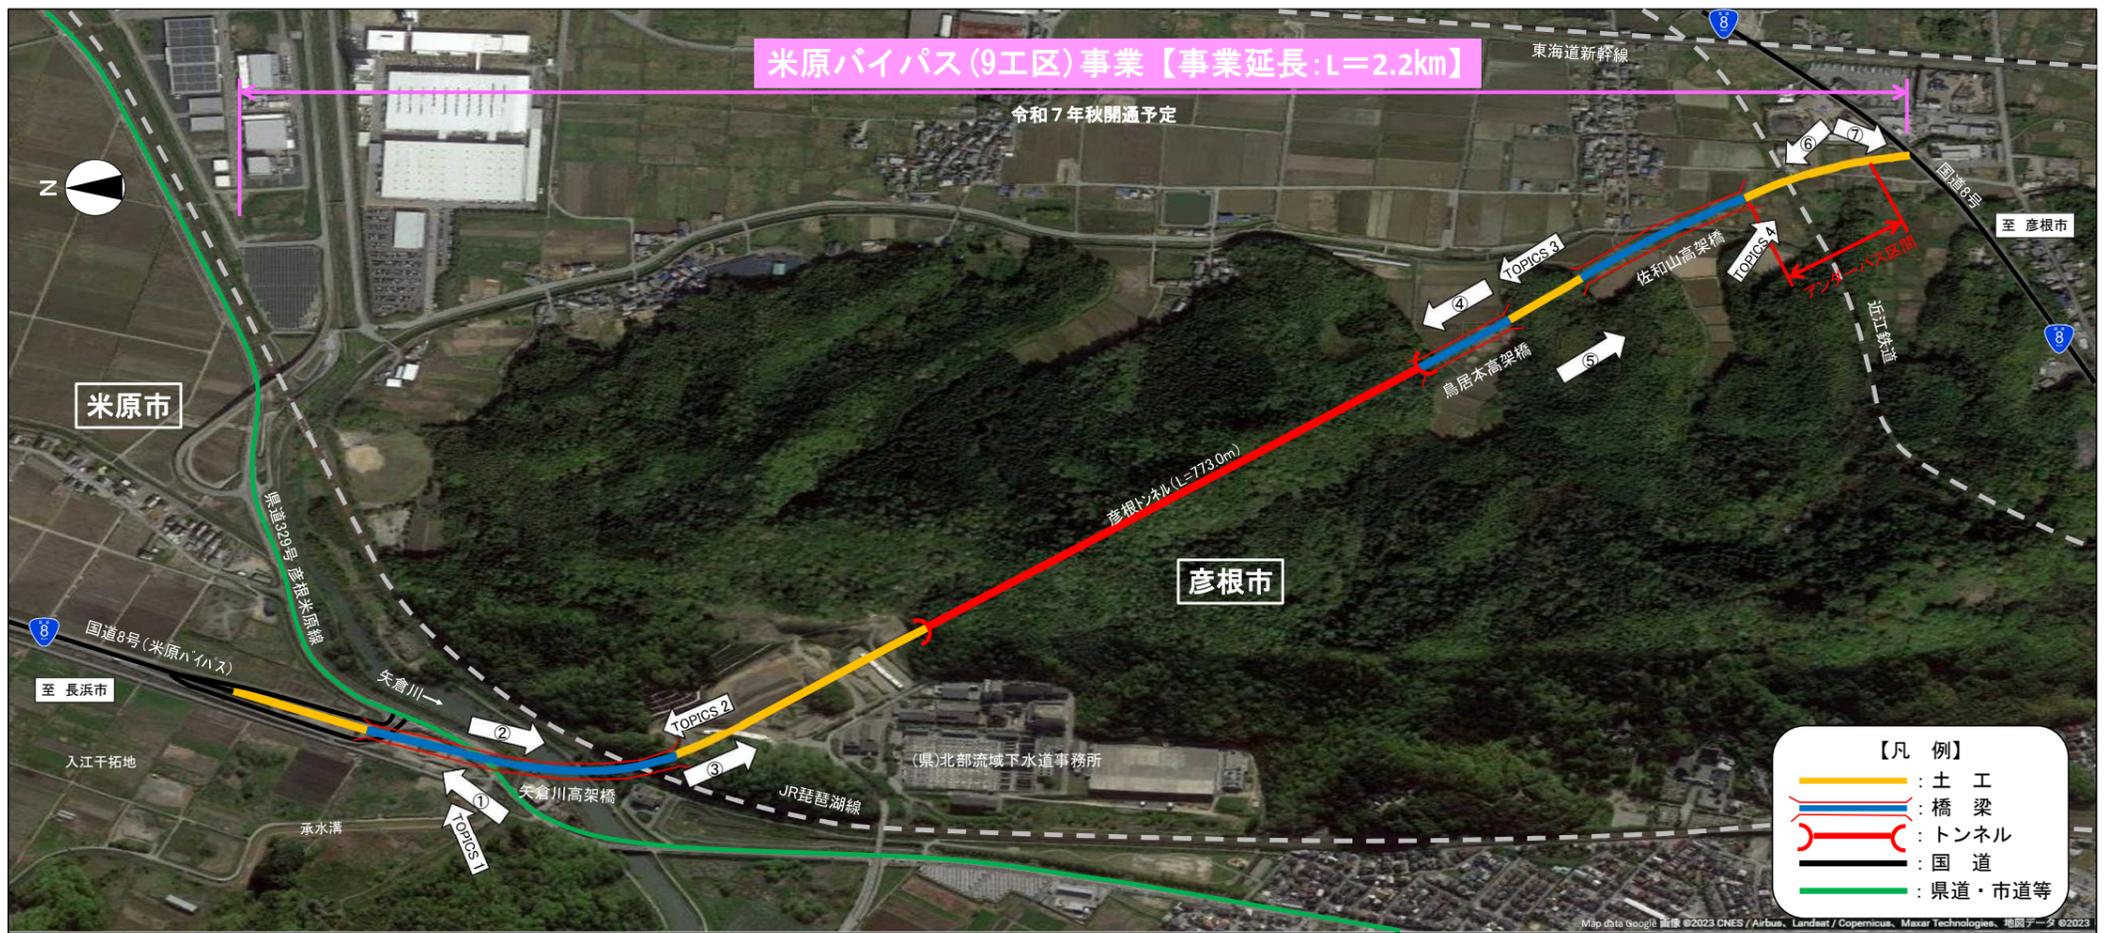

地区名	米原市		松原地区		彦根市	
	入江地区	0.36 km	0.20 km	0.77 km	鳥居本地区	佐和山地区
延長	0.20 km	0.36 km	0.20 km	0.77 km	0.18 km	0.50 km
道路構造	土工	鋼橋	土工	トンネル	鋼橋	土工 鋼橋 土工



凡例 ■ : 発注手続中 ■ : 施工中 ■ : 完成



※照明設備、CCTV設備、散水融雪設備等の工事を進めます。
