



保田遊水地工事ニュース

HPでも閲覧
できます

大和川保田遊水地掘削築堤他工事【(株)中和コンストラクション】

工事概要

○A地区 平張コンクリート (6600m²) コンクリート打設を行っています。

現況写真 (R7.3.17撮影)



工事進捗状況

○A地区 平張コンクリート (5300m²) 完了しました。(80%完了)


大和川

生コンクリートポンプ打ち

コラム

ポンプ車を使用して、
生コンを圧送し、
施工箇所に
流し込む工法です。

人力では難しい箇所や
施工時間の短縮に
繋がります。

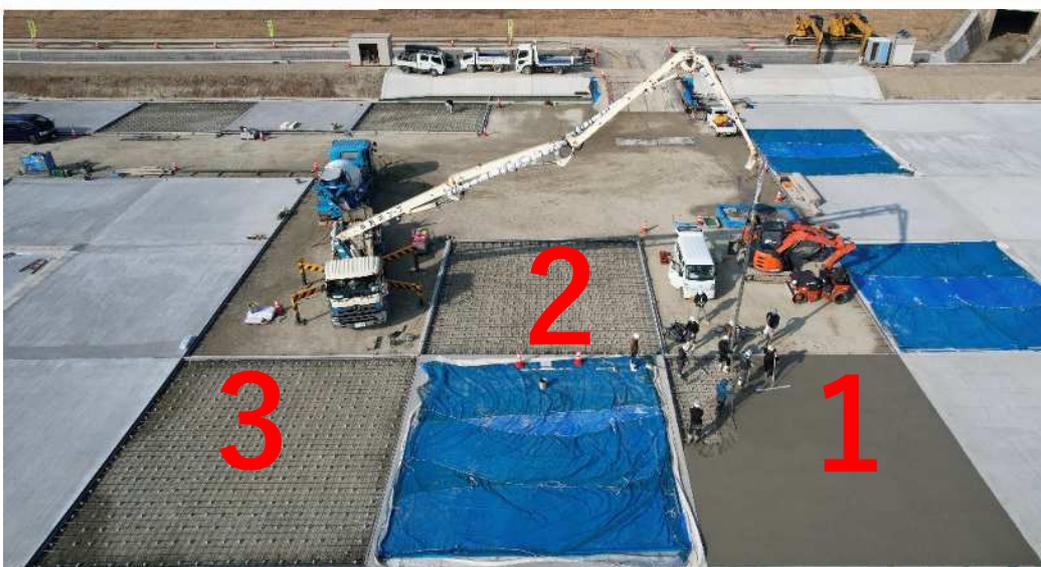

3面で合計100m²の施工に対して生コンが45m³必要となり、生コン車は12台必要になります。
ユンボを使用して打設する場合、1日かかる作業ですが
ポンプ車を使用することで、作業は**最速で48分で完了**します。

大和川保田遊水地越流堤他工事【(株)吉田組】



現在の作業状況



令和7年3月完了

地域の皆様のご理解とご協力により工事完了いたしました。
ありがとうございました。

越流堤が完成しました！

令和7年3月7日



着手前



大和川保田遊水地水路整備他工事【(株)森下組】

令和7年3月完了

工事概要

- 遊水地内の水路を整備する工事です。
- A地区**に**地下水対策工**（自由勾配側溝、砕石敷設）を行いました。
- 内水樋門**から**A地区**までの**導水路工**を整備し、接続しました。
- C地区**の表面に**平張コンクリート**（約9,000m³）、底面に**防災調整池**を設置しました。



工事の進捗状況

- A地区**・**地下水対策工**（自由勾配側溝、砕石敷設）は完了しました。
 - C地区**・**防災調整池**が完了し、川西町がオーバルトラックのラインを引いています。
 - ・**平張コンクリート**も完了しました。
 - ・**導水路工**が完了し、保田川がつながりました。
- 皆様のご協力により工事が完了いたしました。ありがとうございました。

C地区（防災調整池）の状況



令和7年3月21日撮影



【問い合わせ先】

(注意) 記載内容は、今後変更することがあります。

●事業計画に関すること 大和川河川事務所 工務課
〒582-0009 大阪府柏原市大正2丁目10番8号
TEL / 072-971-1381 (代)

●工事・現場に関すること 大和川河川事務所 王寺出張所
〒636-0002 奈良県北葛城郡王寺町王寺1-13-8
TEL / 0745-73-6571
