

窪田遊水地工事ニュース

大和川窪田遊水地樋門築造工事【(株)本間組】



工事概要

- 洪水後の遊水地内に溜まった水を大和川に排水するための樋門を築造する工事です。
- 現在、樋門を施工する箇所の床掘を行っています。
- 床掘後は、固化材を添加してから埋め戻しを行う地盤改良工に着手します。



お知らせ

迂回道路の保安灯等の安全設備をより視認性の高いものに交換しました。通行する際は引き続き、徐行運転を行い対向車両や工事車両との接触防止、転落防止のためのご協力をお願いします。

また、掘削作業が完了次第(12月上旬)、樋門施工箇所直下の現地盤の一部を固化材を添加した土砂と置き換える地盤改良工に着手します。

堤防開削状況 (10月19日時点)



床掘状況 (11月20日時点)



工事の流れ

掘削を進めた後ではクレーン作業半径確保が難しい鋼矢板の一部を先行打設しました。




工事の状況を
動画で公開!




11月20日時点

12月中旬以降の施工イメージ図です。
クレーン等を使用し矢板を打設する予定です。

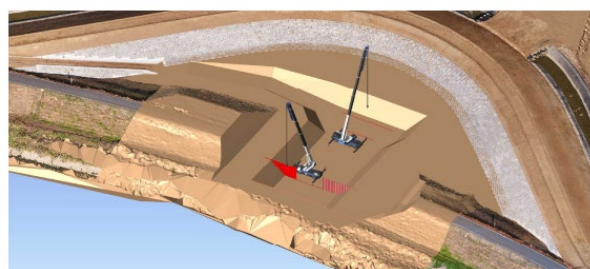

大和川窪田遊水地掘削築堤工事 【(株)城内組】



工事概要

○遊水地の貯水容量を確保するための掘削、その掘削土を改良し周囲堤整備の一部整備（約5,000m³）および安堵町のゴミ中間処理施設の造成を行っています。



11月20日現在、約48,000m³まで掘削が完了しています。



11月10日に周囲堤盛土5,000m³が完成しました。

○**ゴミ中間処理施設の造成**
(全計画土量 約60,000m³) の進捗状況



10月初旬 工事開始前



11月20日時点

11月より造成工事に着手しています。

【問い合わせ先】

(注意) 記載内容は、今後変更されることがあります。

●事業計画に関すること 大和川河川事務所 工務課
〒582-0009 大阪府柏原市大正2丁目10番8号
TEL / 072-971-1381 (代)

●工事・現場に関すること 大和川河川事務所 王寺出張所
〒636-0002 奈良県北葛城郡王寺町王寺1-13-8
TEL / 0745-73-6571
