



R1.6.30現在 ^{あらしま}荒島第一トンネル（仮称）の掘削進捗は約51%（約1,300m）です。

位置図

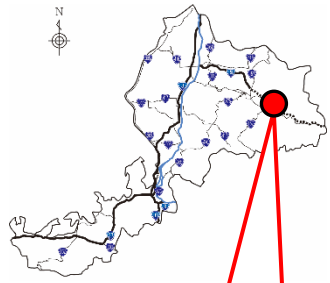


大野油坂道路
(大野東・和泉区間)

荒島第一トンネル（仮称）



荒島第一トンネル(仮称)の進捗状況

進捗率 :  約51% (約1,300m)



トンネル全長約2,561m

1 支保工を設置しています。



支保工とは？

トンネル掘削の際、岩盤が崩れないように支える仮設構造物です。



※荒島第一トンネル(仮称)は、平成29年10月12日、掘削に着手しました。
