

# 湖西道路(4車化)事業 工事進捗レポート

令和2年10月

## TOPICS 1 湖西道路天神川橋P2橋脚他工事

R2.10月撮影



**天神川橋**  
湖西道路4車線化に向けた、下り線(京都方面)の橋脚工事(P2、P3、P4橋脚)、橋台改築工事(A2橋台)を行っています。

## TOPICS 2 湖西道路雄琴川橋P1橋脚他工事

R2.10月撮影




**雄琴川橋**  
湖西道路4車線化に向けた、下り線(京都方面)の橋脚工事(P1、P2、P3、P4橋脚)を行っています。

## TOPICS 3 湖西道路大正寺川橋上部工事


R2.10月撮影



**大正寺川橋**  
湖西道路4車線化に向けた、下り線(京都方面)の下部工が完成し、上部工の設置工事を行っています。

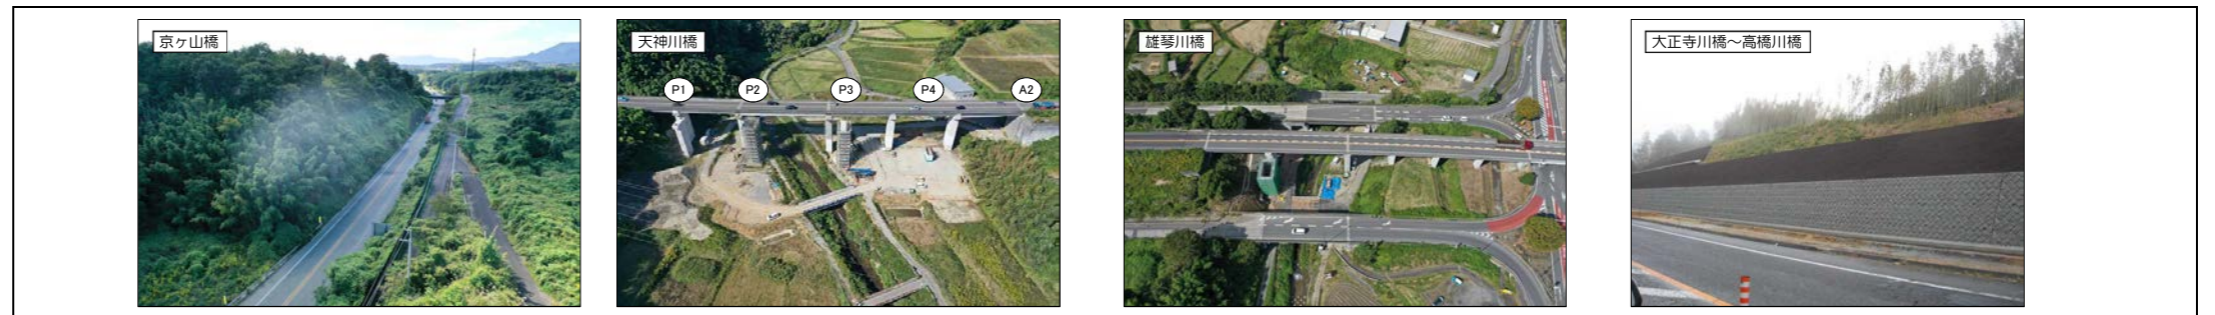

地区名	大津市												
延長	0.53 km	0.88 km		0.18 km	1.15 km	0.04 km	0.82 km	0.15 km	1.23 km	0.35 km	0.21 km	0.40 km	
道路構造	土工	PC橋	土工	鋼橋	土工	PC橋	土工	PC橋	土工	鋼橋	土工	既設橋	土工



凡例   : 未着手   : 発注手中   : 施工中   : 完成

