




窪田遊水地工事ニュース

HPでも閲覧
できます

大和川窪田遊水地防災ステーション基盤盛土他工事 【(株)城内組】



工事概要



○防災ステーション建設のための基盤盛土を行う工事です。
 現在準備工として、盛土箇所に支障となる構造物の撤去と、
 盛土材料を製造しています。（製造量：約4,000m³/約16,000m³）
 9月下旬より、約40,000m³の盛土施工を開始します。




令和7年8月5日撮影



令和7年9月9日撮影

改良土仮置き場

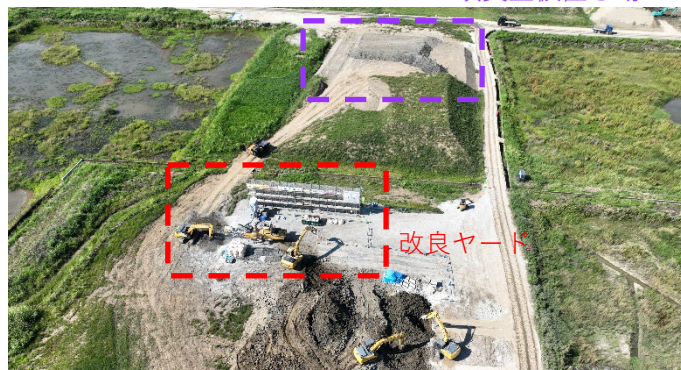

盛土箇所



盛土箇所



空撮写真提供

SCADRON

スカイドロン株式会社



工事概要




○引き続き窪田事業所内に仮置きしている表土（草・根混じり土）を10 t ダンプにて搬出します。

- ・搬出数量 約4000m³/約5,000m³（令和7年9月10日時点）
- ・搬出期間 令和7年9月20日頃までを予定
- ・運搬台数 1日10台が3往復（計30台が運行）



令和7年8月5日撮影
仮置き表土搬出
残土量：約3650m³

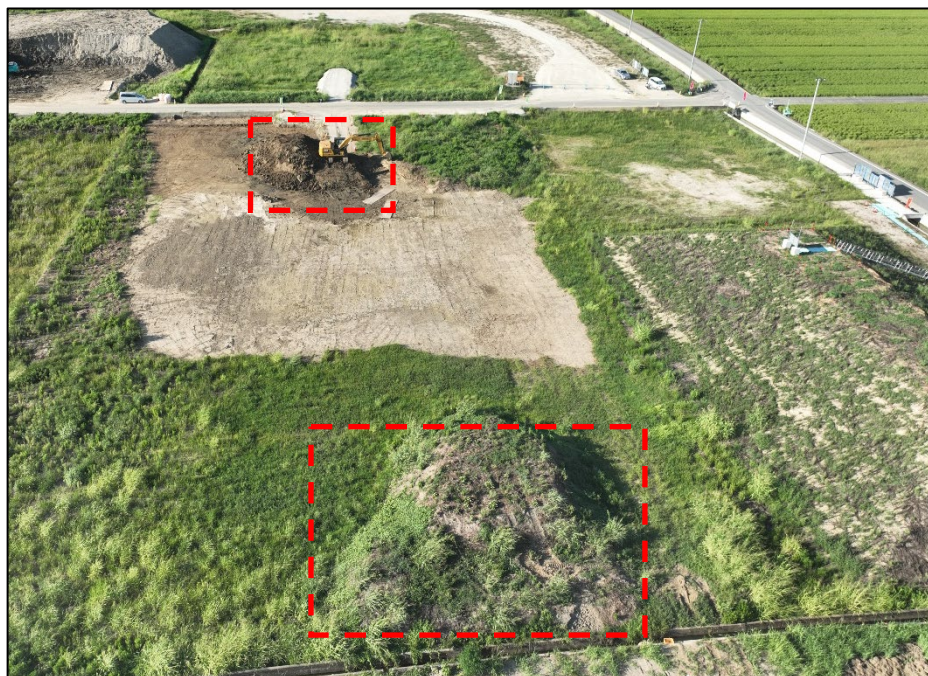

令和7年9月9日撮影
仮置き表土搬出
残土量：約1000m³

空撮写真提供

SCADRON



スキヤドロン株式会社

大和川窪田遊水地北側内水取込樋門築造他工事【矢作建設工業(株)】

工事概要



矢作建設工業株式会社
YAHAGI

- 7月より樋門本体の構築作業を開始しました。
- 8月も引き続き樋門本体の構築作業をおこないます。

主な作業内容

①土工(掘削)

- ・現在の堤防を掘削します。

②地盤改良工

- ・樋門が沈下しないよう、樋門下の軟弱な地盤を改良します。

③樋門・樋管本体工


- ・樋門本体(函渠、翼壁)を構築します。

←9月の
作業内容

④護岸・護床工

- ・盛土や川底が削られないよう、コンクリートブロックや擁壁を施工します。

主な作業箇所

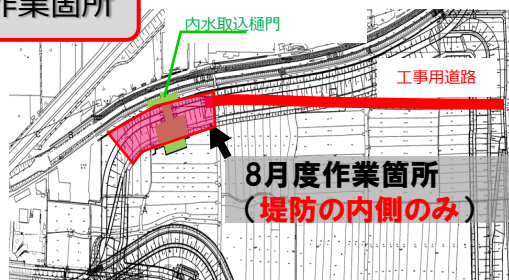

8月度の作業の様子

樋門本体の構造物構築を行いました。



事業用地維持管理

先月に引き続き草刈りを行っています。



お知らせ

通行止め箇所: 岡崎川左岸堤防道路

安堵町中央体育館



通行止め期間: 令和7年10月初旬 から 令和8年5月末

※ 長期の天候不良の場合などは通行止め期間が延長されます。

あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

工事に関するご連絡先

【発注者】

近畿地方整備局大和川河川事務所
王寺出張所

【受注者】

矢作建設工業株式会社
☎0743-84-8010 (昼間)



今月の作業

○ 現在、樋門本体工（門柱部・翼壁工）の施工を行っています。
道路拡幅工事は、9月上旬に舗装を行い、9月中旬に完成します。

工事の流れ

今月は、樋門・樋管本体工（門柱部・翼壁工）を施工していきます。

鉄筋の組立及び型枠の組立及びコンクリートの打設がメインの作業になります。

道路拡幅工事は、9月中旬に完成し、通行止め解除は22日を予定しております。

現在施工箇所



まほろば前道路拡幅工事完成

○ まほろば可燃ごみ中継施設の稼働にあたり、前面道路の拡幅工事を6月末から開始し、9月中旬に完成します。工事中、通行止めによりご不便おかけし申し訳ございませんでした。

通行止め解除は、9月22日中に行う予定です。

