



# 令和2年2月の施工概要

- 一の井堰下流側
- ・床掘・掘削
  - ・護岸コンクリートの打設
  - ・鋼製ユニットの設置

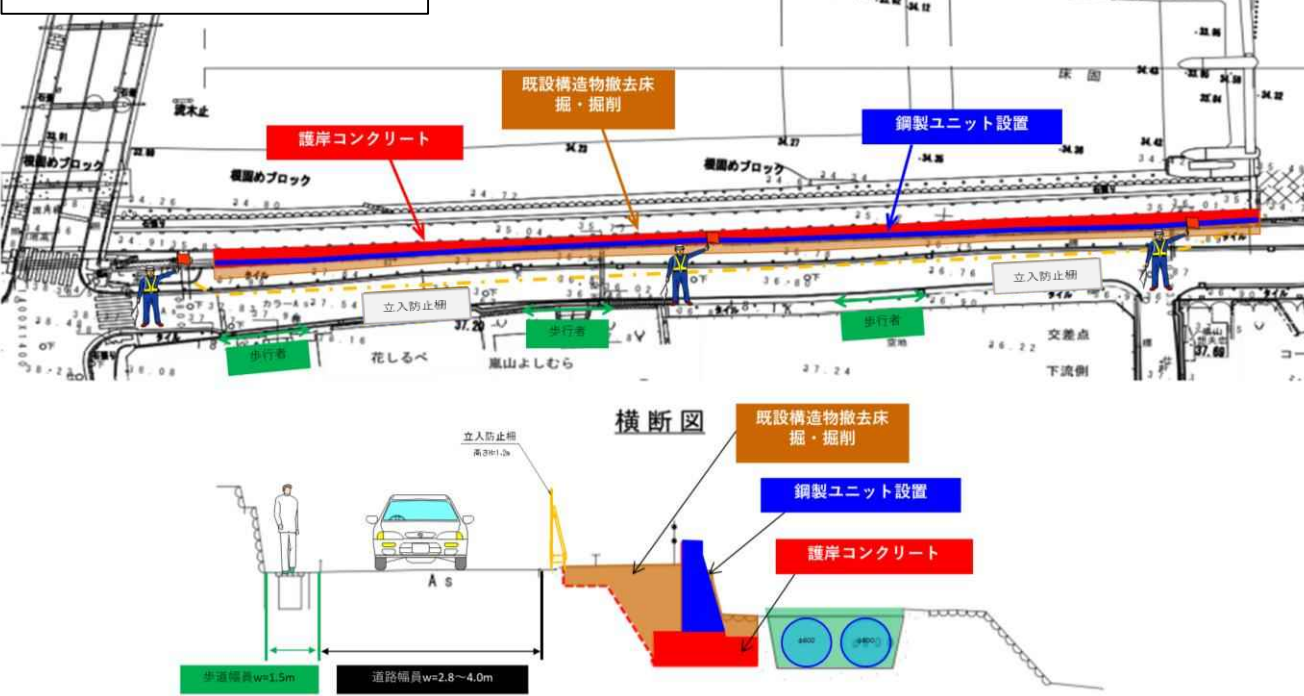

- 一の井堰上流側
- ・床掘・掘削
  - ・護岸コンクリートの打設
  - ・鋼製ユニットの設置

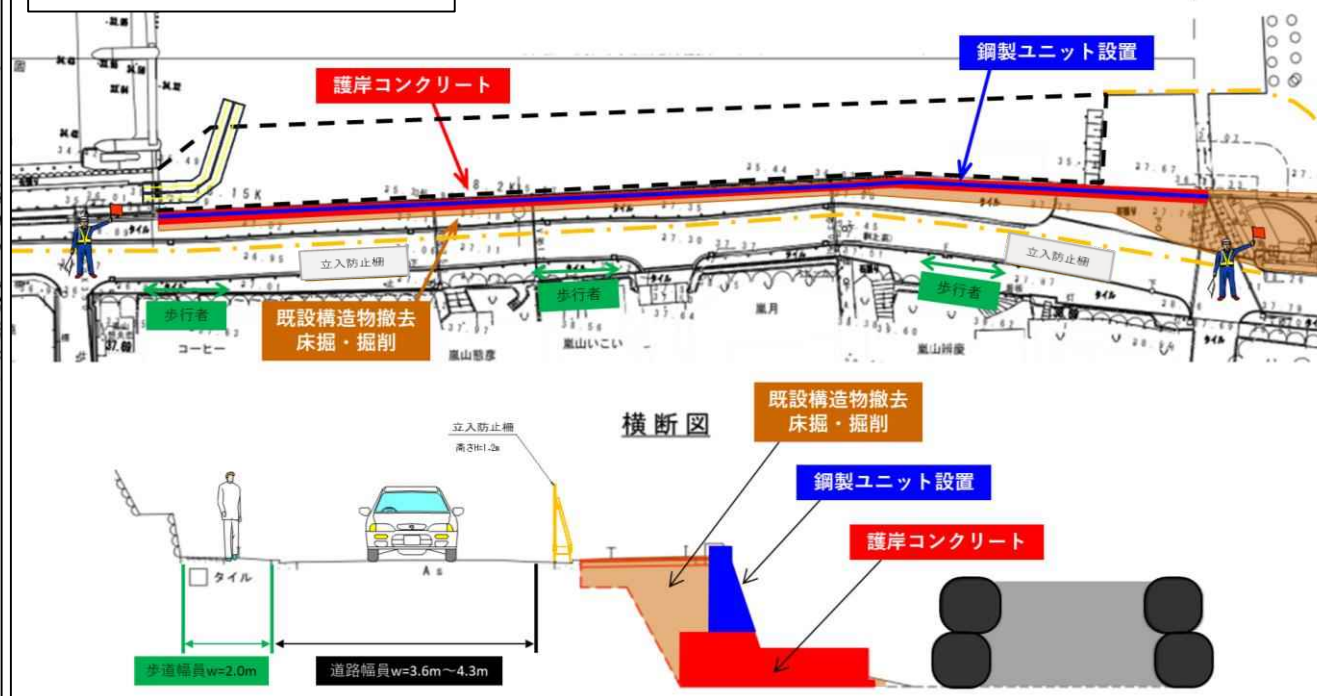

## 2月現在の現場の様子

可動式止水壁を据える基礎部分の工事  
(掘削及びコンクリートの打設)を中心に実施中。

一の井堰下流側  
2019.02.03現在



一の井堰上流側  
2019.02.05現在

