

# 【 事業進捗報告 】 — これまでの工事の様子 —

【 2019.4～2019.5までの工事】

3工区：既設橋梁補強桁設置



①既設橋梁補強桁を仮栈橋にて組立



フロート台船


②架設当日フロート台船にて海上運搬



③上流・下流の両側から  
クレーンにて吊上げ架設



④2橋脚分、計4本の  
既設橋梁補強桁架設完了

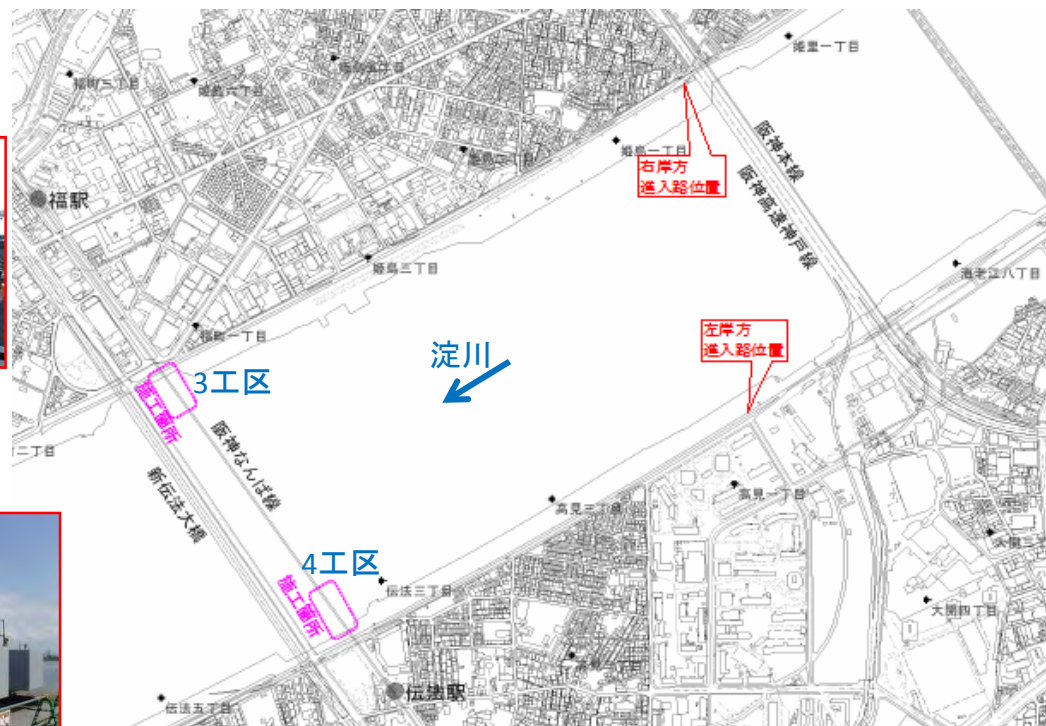

4工区：工事用道路、磁気探査工



①工事用道路工



②磁気探査工  
(潜水探査・鉛直探査)
