


～甲賀市 雲井地区のイベントに参加してきました～

5月25日、雲井地区で開催された”ラベンダー祭”に参加してきました。多くの方が参加され大いに賑わっており、官民が連携した楽しいイベントでした。このような周辺地域での地域活性化に資する取り組みやイベントと調和して、地域の皆様と連携したダム の 利活用検討支援を継続して参ります。



令和7年度事業実施予定位置図

※記載の工事・業務については、主要なもの（維持作業、
水理水文調査、事務補助等を除く）を記載しています。

(R7.5.31時点)



工事

番号	件名	期間	請負業者	概要
工①	大戸川ダム左岸他調査横坑試掘工事	R6.8.3～R7.6.23	玉井建設(株)	ダム本体の地質調査

完了 未実施
横坑掘削位置

R-2坑：掘削完了/60m
L-2坑：掘削完了/60m
R-3坑：掘削完了/40m
R-1坑：掘削完了/70m

掘削が完了したR-3坑の内部

✓ 右岸高標高部の調査横坑（R-3坑）では、5月をもって掘削が完了し、これにより4本全ての横坑の掘削が完了しました。

✓ 6月からは資機材運搬に使用していたモノレール等の片付けに順次入っていく予定です。

調査

番号	件名	期間	請負業者	概要
調①	大戸川ダム本体河床部地質調査業務	R6.9.12～R7.5.30	大日本ドレーン(株)	ダム本体の地質調査
調②	大戸川ダム本体右岸地質調査その5業務	R6.9.13～R7.5.30	(株)ニュー・エック	ダム本体の地質調査
調③	大戸川ダム本体左岸地質調査その2業務	R6.9.14～R7.6.30	(株)建設技術研究所	ダム本体の地質調査
調④	大戸川ダム本体右岸地質調査その6業務	R7.4.18～R7.11.28	大日本ドレーン(株)	ダム本体の地質調査
調⑤	大戸川ダム本体右岸地質調査その7業務	R7.4.22～R7.11.28	(株)建設技術研究所	ダム本体の地質調査

✓ ダムサイト右岸の地質調査業務（調④、⑤）について、ボーリング調査実施に必要な各種申請を進めています。

設計・検討

番号	件名	期間	請負業者	概要
設①	大戸川ダム地域振興検討業務	R6.4.16～R7.5.30	(株)オリエントコンサル	事業用地利活用検討
設②	大戸川ダム栗東信楽線北部道路落石対策工詳細設計業務	R6.5.8～R7.5.30	(株)イト日本技術開発	落石対策、トンネル設備の詳細設計等
設③	大戸川ダム管理用道路詳細設計他業務	R6.5.21～R7.9.30	(株)オリエントコンサル	ダム管理用道路の詳細設計
設④	大戸川ダム環境調査結果とりまとめ業務	R6.6.19～ R7.9.19	日本工営(株)・ (一財)水源環境センター	環境調査結果のとりまとめ
設⑤	大戸川ダム基礎岩盤特性解析業務	R6.10.19～R7.7.31	(株)ニュー・エック	ダム本体の地質解析
設⑥	大戸川ダム本体修正設計業務	R7.1.10～R8.3.25	(株)ニュー・エック	ダム本体の詳細設計他
設⑦	大戸川ダム栗東信楽線道路予備修正他業務	R7.4.22～R8.3.27	中央復建コンサル(株)	付替県道栗東信楽線、付替市道・林道の設計他
設⑧	大戸川ダム周辺整備検討業務	R7.5.8～R7.12.22	(株)オリエントコンサル	事業用地利活用検討
設⑨	大戸川ダム放流設備水理検討業務	R7.4.1～R8.9.30	国立研究開発法人 土木研究所	ダムの洪水吐や放流能力に関する検討
設⑩	大戸川ダム転流工詳細設計業務	R7.5.14～R7.12.26	(株)ニュー・エック	転流工の詳細設計
設⑪	大戸川ダム地質総合解析とりまとめ業務	(契約手続中)		ダム本体の地質解析
設⑫	大戸川ダム環境保全対策検討業務	(契約手続中)		環境保全措置等の検討


✓ 事業用地利活用を検討する設⑧と、転流工の詳細設計を行う設⑩を新たに契約しました。

✓ ダムサイトの地質の総合的な解析を行う設⑤で、掘削完了した調査横坑（R-1坑、R-2坑）内にて、コンクリートブロックを岩盤の上に置き荷重をかけて破壊する「岩盤せん断試験」を順次行っています。

「岩盤せん断試験」の実施状況

注) 灰色は先月中に完了したもの 注) 赤字は先月号から更新した箇所

◆大戸川ダムの進捗状況（令和7年5月末時点）




【コラム】6月は”土砂災害防止月間”です

- ✓ 地球温暖化に伴う気候変動により、熱帯低気圧の強度が増大するとともに、大雨の頻度も増加する可能性が高く、土砂災害の増加、激甚化が懸念されています。
- ✓ 国土交通省では、土砂災害の防止と被害の軽減を目的に、昭和58年より梅雨や台風の時期を迎える毎年6月を「土砂災害防止月間」と定めています。
- ✓ 土砂災害から身を守るためには、危険な場所から安全な場所への早めの避難が重要です。住民の皆様が、土砂災害から安全に速やかに避難するためには、市町村からの「知らせる努力」に加え、住民の皆様の市町村からの情報の意味を正しく理解し必要な防災行動をとるために平常時からの「知る努力」が重要です。
- ✓ 土砂災害から身を守るため、住んでいる場所が「土砂災害警戒区域」かどうか確認したり、雨が降り出したら土砂災害警戒情報に注意しましょう。



各地域の
ハザードマップ
が調べられます

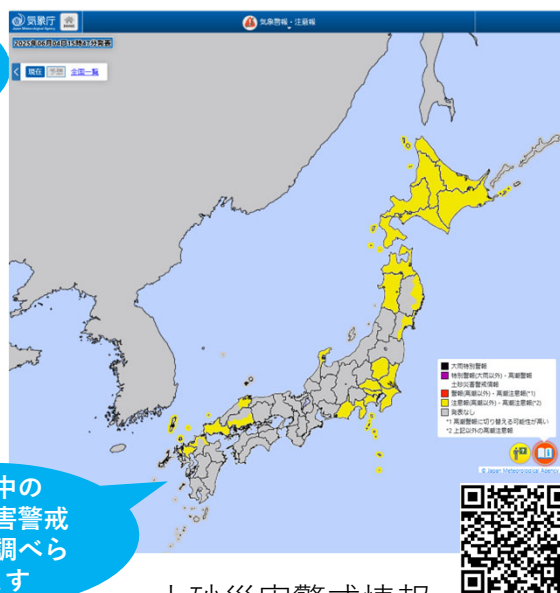

発令中の
土砂災害警戒
情報が調べ
られます

ハザードマップポータルサイト

土砂災害警戒情報

トピック



「ダムカード」好評配布中！！

- ・大戸川ダム工事事務所（平日開庁時間内）
- ・アクア琵琶（火曜日休館）

5/1より配布開始！
1ヶ月で既に
およそ400枚配布！！

【発行】



国土交通省 近畿地方整備局
大戸川ダム工事事務所

〒520-2144 滋賀県大津市大萱1-19-32
TEL 077-545-5675（代表） FAX 077-543-5340
事務所webサイト <https://www.kkr.mlit.go.jp/daido/>
X（旧 Twitter） @daidogawadam



webサイト



X（旧 Twitter）



大戸川ダム

大戸川ダム

検索
