


大津信楽線付替工事ニュース

令和4年8月



バックナンバーはQRコードを眺込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新7号橋・新8号橋間道路改良その他工事
 工期：令和2年11月7日～令和4年8月31日

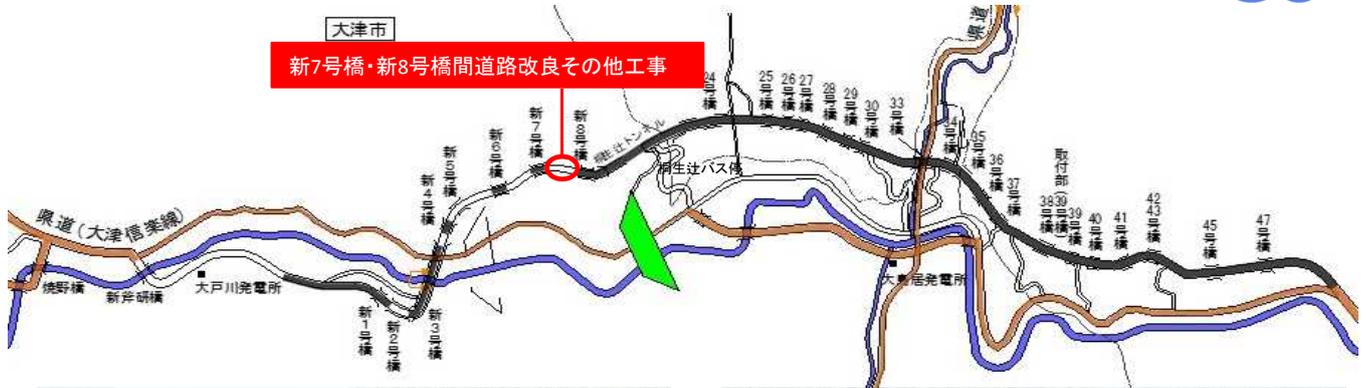

【現在の作業】 11号補強土壁擁壁部の軽量盛土材設置(今回施工部)が完了しました。
 【今後の予定】 8月中旬までに盛土・仮設材搬出・後片付けを行い完成します。

工事現場の施工状況

施工状況
(6月末)

→

施工状況
(7月末)

→

(赤色) 軽量盛土 今回施工範囲

左記図 今回施工範囲

監理技術者のコメント

令和3年10月下旬より(左記図)の軽量盛土基礎の掘削を開始し、当月に弊社が施工する(今回施工)範囲が完成いたします。更に1日でも工期短縮ができるよう作業従事者全員で日々頑張っておりますが毎日酷暑が続きますので、熱中症予防に心がけ安全第一で無理のない施工で進めて参ります。今後ご理解とご協力を宜しくお願いいたします。



監理技術者 米田 剛

OhYAMA (株) 大山建設

現場事務所
 電話
 FAX

大津市上田上桐生町地先
 077-549-1700
 077-549-1705

大津信楽線付替工事ニュース


令和4年8月



バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新3号橋・新8号橋間道路改良工事
工期：令和3年6月17日～令和4年10月31日（今後工期延期の予定）

8月

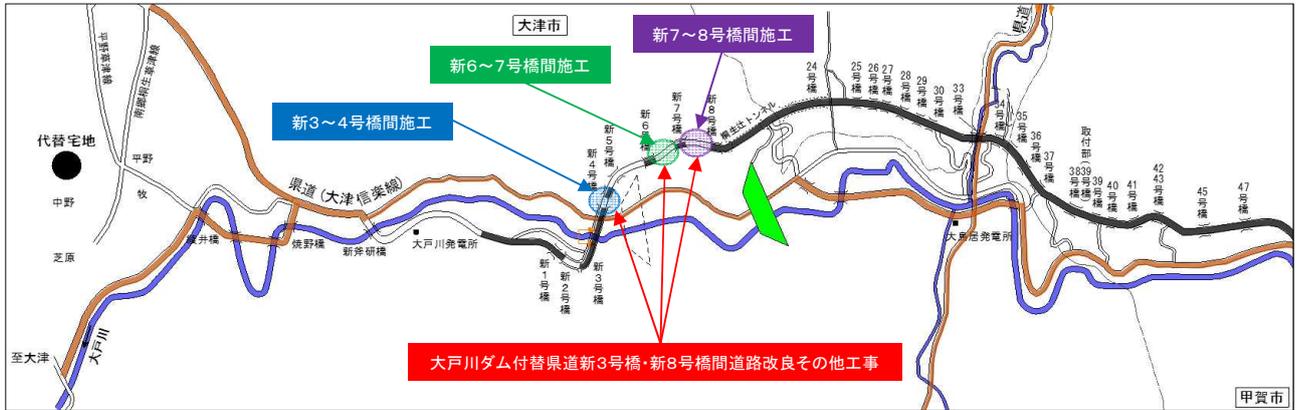

新6～7号橋間施工箇所

令和4年7月



新6号橋

令和4年8月



新6号橋

※排水構造物施工

作業内容：10号補強土壁



新7号橋



新7号橋

※法面整形完了

新7～8号橋間施工箇所

令和4年7月



新7号橋



新7号橋

※基礎コンクリート完了

現場代理人：寺内 敬嗣

新6号橋～新7号橋に於いては排水構造物をメインに施工中です。新7号橋～新8号橋は11号補強土壁 基礎コンクリートが完了しました。8月より軽量盛土施工予定です。材料の搬入も増えますが、引き続き無事故にて取り組みます。



株式会社 アクト

現場事務所
電話

大津市上田上桐生町地先
077-549-0010

大津信楽線付替工事ニュース

令和4年8月



バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道大津信楽線桐生辻トンネル他電気設備工事
工期：令和3年8月11日～令和4年11月30日（今後工期延期の予定）

8月



桐生辻トンネル起点側(灯具点灯状態)

桐生辻トンネル(大津方面)から撮影



桐生辻トンネル終点側(灯具点灯状態)

桐生辻トンネル(信楽方面)から撮影

【現在の作業】 照明柱の建柱工事を行っています。



照明柱建柱状況



自動点滅器取付状況



ナット締付状況




照明灯具取付状況

現在、岩盤掘削箇所の照明柱の建柱工事を行っています。

設置箇所が岩が多いので、アースオーガやバックホウによる掘削ができない場所は岩盤掘削機の変更し、接地工事の接地抵抗値も規定値以下にならない為、接地低減材を使用したり、施工方法を工夫しております。来月以降は橋梁配管施工場所の準備、CCTVの調査を行ってまいります。

先月に引続き熱中症対策、体調管理に気をつけ、安全第一に引続き作業を行って参ります。今後ご理解、ご協力のほどよろしくお願い致します。



現場代理人
下矢 智一

大津信楽線付替工事ニュース


令和4年8月



バックナンバーは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道桐生辻トンネル舗装他工事
工期：令和4年2月19日～令和4年9月30日（今後工期延期の予定）

8月

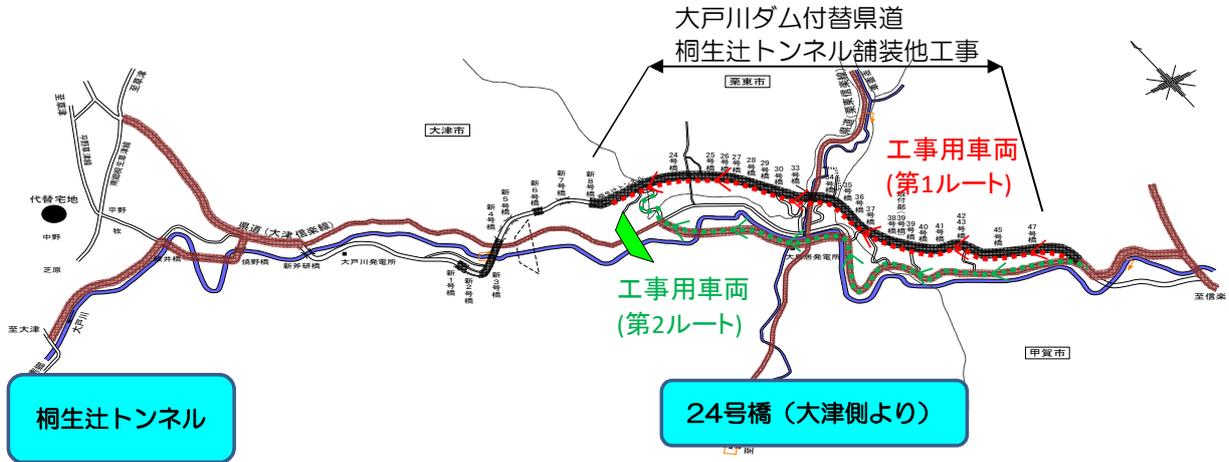

トンネル工
(はく落・漏水対策)



防護柵工 (嵩上げ)



橋梁補修工
(ひび割れ補修)

現場代理人コメント

暑い日が続きますが熱中症に注意して
早期開通を目指し頑張っております。
ご理解ご協力の程、宜しくお願い
いたします。

【現在の作業】

橋梁補修工・トンネル工（はく落・漏水対策）
を行っております。

【今後の予定】

トンネル内(コンクリート舗装)を行います。

現場代理人
香水 達弥



DYNAMIC SHOKEN
株式会社 昭建

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上桐生町地先
077-549-1728
077-549-1728

大津信楽線付替工事ニュース


令和4年8月



バックナンバーは
QRコードを隠込み
大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道大津信楽線下流区間他舗装その他工事
工期：令和4年2月22日～令和4年10月21日（今後工期延期の予定）

8月

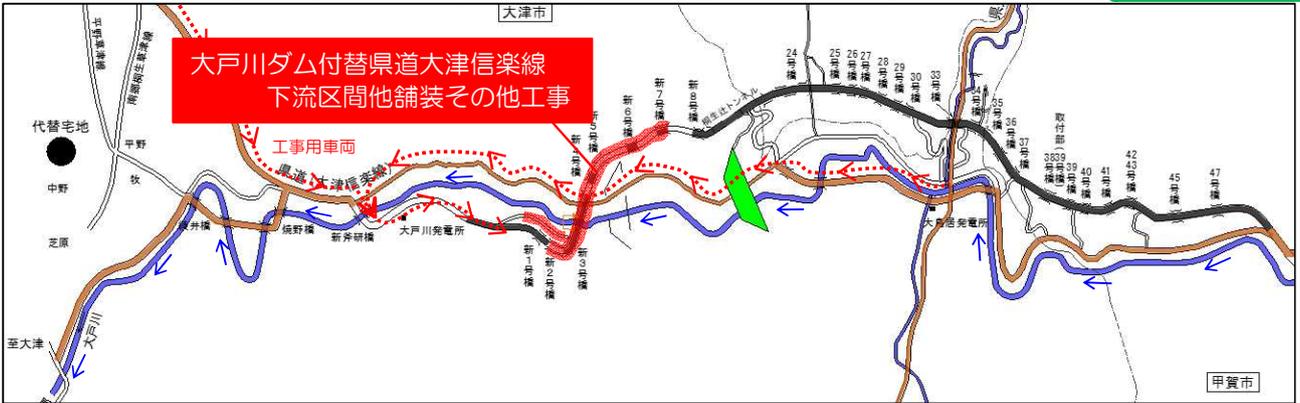

- 現在の作業
市道(左岸線)----- 排水構造物工、道路土工
付替県道-----踏掛版工
- 今後の作業予定
・市道(左岸線)----- 排水構造物工、道路土工、
防護柵工
・付替県道-----仮設工(工事用通路整備)、
排水構造物工、伸縮装置工
- 市道(左岸線) 進捗状況

7月状況



8月状況



■ 監理技術者のコメント
市道(左岸線)は、「車両通行止め」によりご迷惑をお掛けしております。引き続きガードレールの設置、路盤工を行ってまいります。何卒ご理解、ご協力の程宜しくお願い致します。

監理技術者
岸 純一郎



未来につなぐ確かな道づくり
戸田道路株式会社

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上牧町斧研
050-5371-1865
050-5371-1866
