

大津信楽線付替工事ニュース

平成30年9月18日



「ツカガハ」はQRコードを読み込み大戸川が△工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新5号橋下部その他工事

工期：平成29年7月4日～平成30年9月28日

(付替県道 新5号橋の橋台を2基施工します。道路掘削部の法面を補強します。)



現場位置図

【工事の進捗】 A1橋台、A2橋台の躯体工事が完成しました。
【今後の予定】 9月下旬にかけて法面補強を行います。



工事の進捗状況：A1橋台、A2橋台ともに作業足場を撤去し埋戻しを行いました。

☆法面植生の流れ

①切土法面補強が完成
アンカー工、鉄筋挿入工が完了した法面です。



9号切土工



②植生工（植生基材吹付）
法面保護、景観、自然保護のために植物の種と肥料を法面に吹付します。



③完成予定（イメージ図）
吹き付けが終了した法面です。吹き付けの種子は在来種のヨモギ、メドハギ、ヤマハギです。植物を生育させて法面の安定化を促進します。



大津信楽線付替工事ニュース

平成30年9月18日



バックナンバーは
QRコードを眺込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津信楽線新6号橋上部工工事

工期：平成30年1月26日～平成31年1月31日
(付替県道新6号橋の橋梁を施工します。)



大津信楽線新6号橋完成予想図
(橋梁の立体映像を合成)

製作順序



【現在の進捗】
・仮組立検査が完了。

【今後の予定】
・工場で塗装を行い現場へ出荷します。

KH 株式会社 駒井ハルテック

【現場事務所】 滋賀県大津市上田上桐生地先(桐生辻バス停裏)

【電話】 077-549-2633
【FAX】 077-549-2635

次回から現場施工の
状況をお届けします！





バックナンバーはQRコードを読み込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事箇所位置図



工事名: 大津信楽線新7号橋下部工工事 (大戸川右岸側の橋梁の橋台と橋脚を2基施工します)
工期: 平成29年7月20日～平成30年8月30日

工事完成までの流れ



着工前



作業機械等を運ぶため大型モノレールを設置しました。



大型モノレールにて作業機械を施工箇所まで荷揚げします。



道路を支える、直径6mの井筒式の基礎を掘削します。



基礎部分が完成した状態です。



鉄筋を組立、コンクリートを打設し、基礎を仕上げます。



基礎部分が、掘り上がった状態です。



基礎部分は、岩盤層に達するため油圧ブレイカーや発破作業にて掘り進めます。



完成した基礎の上に橋脚を作るため、足場・鉄筋・型枠を組み立てます。



鉄筋を、繋ぎ合わせ(圧接作業)ます。



コンクリートを打設します。



橋脚の完成です。



ご挨拶

A2橋台・P1橋脚の躯体が完成し、新7号橋下部工工事の「工事ニュース」は、これが最後となります。
 工事期間中は、工事への御理解・御協力を、いただき誠にありがとうございました。



(P1橋脚)



(A2橋台)

大津信楽線付替工事ニュース

平成30年9月18日



パッカパーは
QRコードを讀込
み大戸川ダム工
事事務所HPへ

工事名：大津信楽線左岸部道路改良その他工事

工期：平成30年3月29日～平成31年2月28日

(大戸川左岸側にプレキャスト製品のアーチカルバートを設置、道路下(擁壁部分)の地盤改良を行います。)

工事箇所位置図



現場位置図



工事進捗と今後の予定

○工事進捗状況

梅谷を渡るための仮橋を設置する工事が始まりました。右写真は70tクローラークレーンを使用して仮橋の杭を建て込むために地盤を削孔しています。

仮橋は9月末に完成する予定です。

○今後の予定

仮橋の完成後、梅谷を渡って木の伐採・抜根・集積を始めていきます。山が非常に切り立っているため、転落・転倒事故が無いように注意を払って工事を進めていきます。



西村建設株式会社
NISHIMURA CONSTRUCTION CO., LTD.

【現場事務所】滋賀県大津市上田上桐生町地先
【電話】 077-549-0075
【FAX】 077-549-0075




大津信楽線付替工事ニュース

平成30年9月18日



パナソニックは
QRコードを読み
込み大戸川がΔ工
事事務所HPへ


工事名：大津信楽線工事用進入路設置その他工事
工期：平成30年3月29日～平成31年2月28日

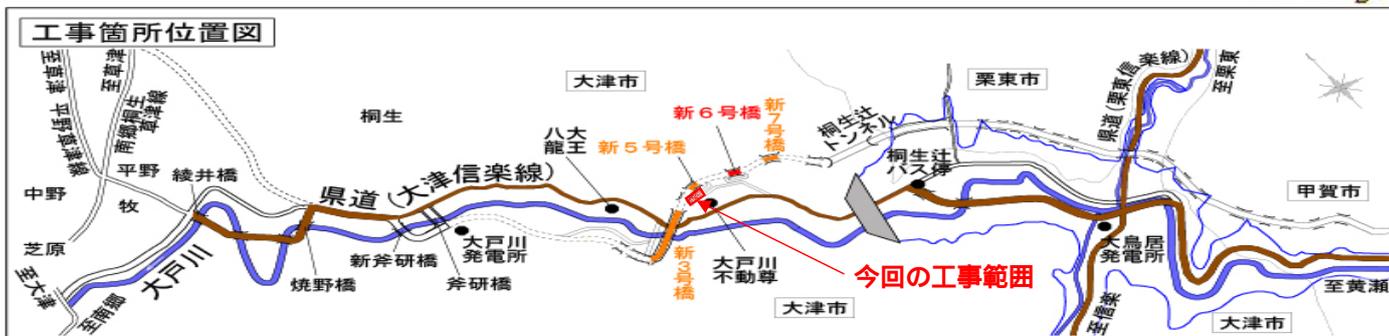

今回の工事について

新4号橋工事の施工の為、既設仮栈橋を延長します。

10月初旬より、仮栈橋施工の障害になる立木の伐採を行います。

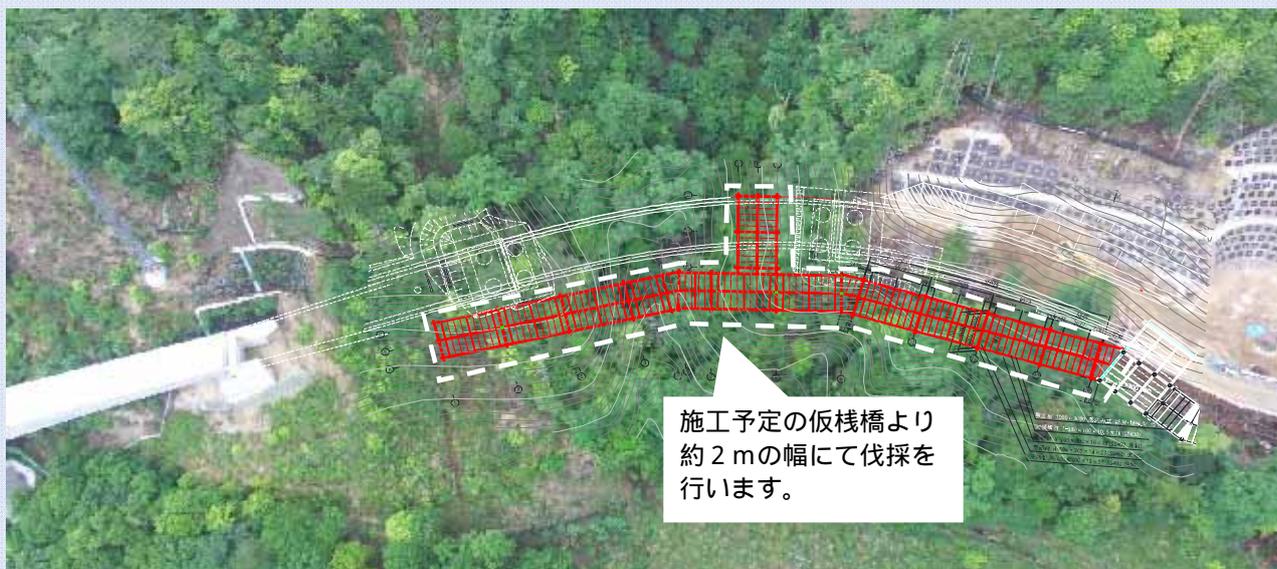

伐採した立木は、資源の有効活用のために
再資源化施設に搬出し、工場にて破砕して燃料材やパルプの
原料として再利用されます。

 **西村建設株式会社**
NISHIMURA CONSTRUCTION CO., LTD.

現場代理人：若林 毅
現場事務所：大津市上田上桐生町地先
事務所TEL：077-549-0202

