

大津信楽線付替工事ニュース


令和4年10月



バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新3号橋・新8号橋間道路改良工事
工期：令和3年6月17日～令和5年2月17日

10月

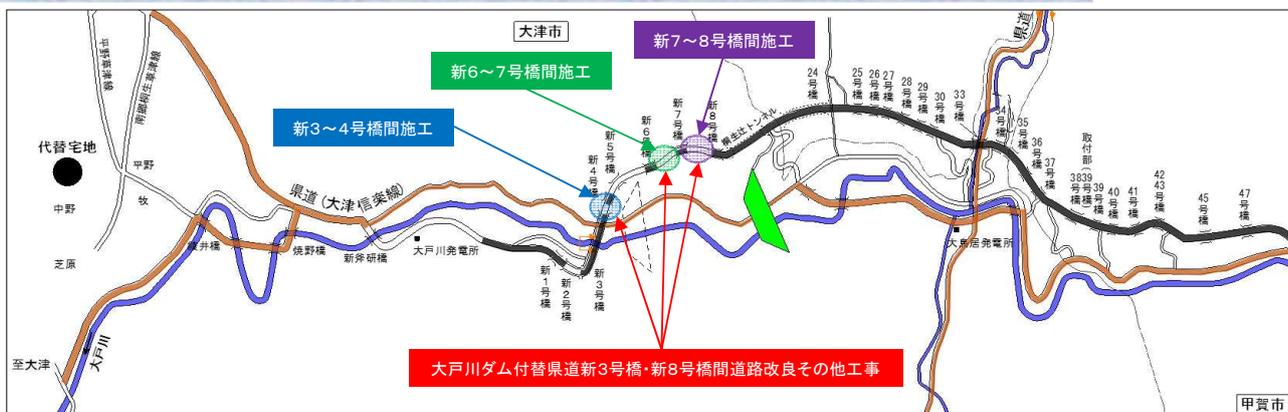

新6～7号橋間施工箇所

令和4年9月



令和4年10月



新7～8号橋間施工箇所

令和4年9月



※軽量盛土28段の内9段施工完了

令和4年10月



※軽量盛土28段の内15段施工完了



現場代理人：寺内 敬嗣

新6号橋～新7号橋は側溝を一部設置しました。引き続き12号切土補強土工を施工予定です。
新7号橋～新8号橋は11号補強土壁は15段目の施工が完了しました。ドローンによる軽量盛土運搬もおこない施工日数短縮、他社工事引渡を間に合うよう取り組みます。



株式会社 アクト

現場事務所
電話

大津市上田上桐生町地先
077-549-0010

大津信楽線付替工事ニュース

令和4年10月



バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道大津信楽線桐生辻トンネル他電気設備工事
工期：令和3年8月11日～令和4年11月30日（今後工期延期の予定）

10月



信楽方面から撮影




信楽方面から撮影(近写)

【現在の作業】 ハンドホールの設置作業を行っています。



今月はトンネルより上流側のハンドホール設置作業を行っております。来月からは、トンネルより下流側の基礎設置を行います。
寒暖差が激しいので体調管理に気をつけ、安全第一で作業を行って参ります。今後ご理解、ご協力のほどよろしくお願い致します。



現場代理人
下矢 智一

大津信楽線付替工事ニュース


令和4年10月



バックナンバーは
QRコードを読み
込み大津川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津川ダム付替県道桐生辻トンネル舗装他工事
工期：令和4年2月19日～令和5年3月31日

10月

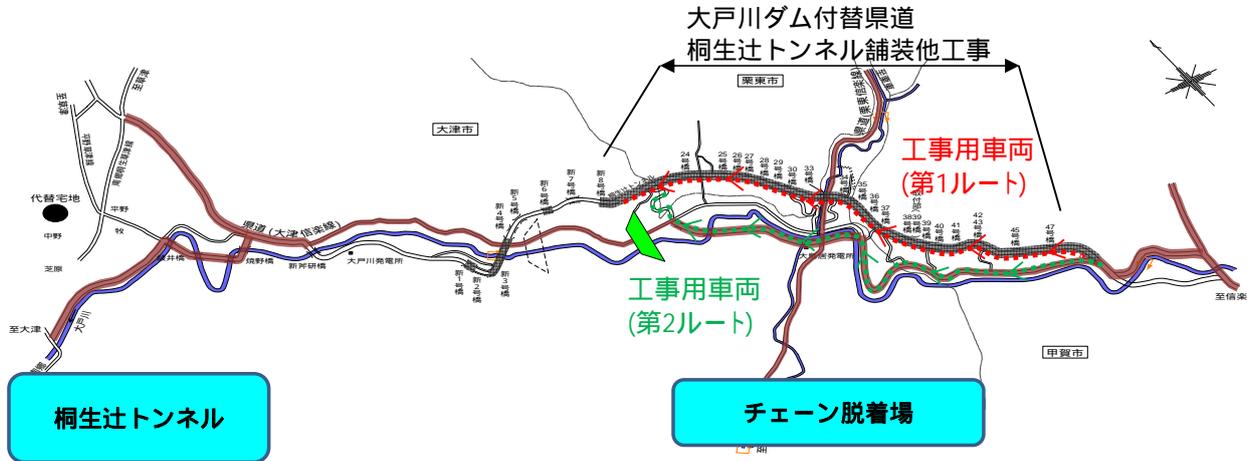

新2号橋 下部法面



新7号～新8号橋



現場代理人コメント

【現在の作業】

トンネル内流末水路工・チェーン脱着場舗装
法面補修工を施工しております。

【今後の予定】

トンネル上流側の法面補修工等及び
トンネル下流側(新7号～新8号橋間)の
道路を造ります。

トンネル下流側も追加工事施工いた
します。引き続き早期開通を目指し
頑張っております。
ご理解ご協力の程、宜しくお願い
いたします。

現場代理人
香水 達弥



現場事務所
電話
FAX

大津市上田上桐生町地先
077-549-1728
077-549-1728

大津信楽線付替工事ニュース


令和4年10月



バックナンバーはQRコードを隠込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道大津信楽線下流区間他舗装その他工事
 工期：令和4年2月22日～令和5年3月31日

10月

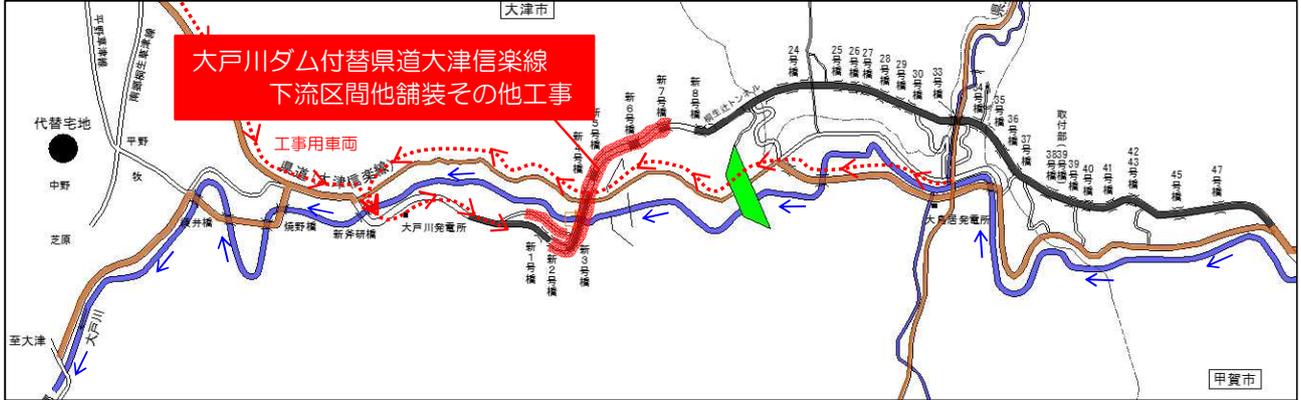

- 現在の作業
 - 市道(左岸線)-----舗装工(上層路盤)
 - 付替県道-----橋面防水工
- 今後の作業予定
 - ・市道(左岸線)----- 舗装工(表層)→路側防護柵工
 - ・付替県道----- 橋面防水工→橋面レバリング→(土工部)路盤工

■ 付替県道 現在の施工状況



新2号橋、新3号橋、新4号橋、新5号橋
 橋面防水を施工中です。

■ 市道(左岸線) 現在の施工状況



下層路盤が完了し、上層路盤、アスファルト舗装を行います。舗装完了後、ガードレールのビームを設置します。



■ 監理技術者のコメント

市道(左岸線)は、アスファルト舗装(表層)、ガードレールを設置し残工事は残りますが、通行が可能な状態となります。付替県道部は、これから本格的に舗装工を開始します。搬入車両も多くなりますので、安全には十分注意して工事を進めてまいります。今後ともご理解、ご協力の程宜しくお願い致します。

監理技術者
 岸 純一郎



未来につなぐ確かな道づくり
戸田道路株式会社

現場事務所 大津市上田上牧町斧研
 電話 050-5371-1865
 FAX 050-5371-1866
